



Bács-Kiskun vármegyei Integrált Területi Program (2014-2020) záró értékelési jelentése

2025. április



Tartalomjegyzék

1.	Bevezetés	4
2.	Jogszabályi és szakpolitikai háttér	6
2.1.	Önkormányzati és területfejlesztési jogszabályok	6
2.2.	Az uniós fejlesztési programok végrehajtásának szabályozása	6
2.3.	A területfejlesztési források tervezésének, felhasználásának és ellenőrzésének szabályozási kerete.....	7
2.4.	Az Önkormányzat által elfogadott területfejlesztési dokumentumok	11
2.5.	A vármegyei ITP lényegi elemei	12
3.	A forrásfelhasználás hatékonysága (2014–2020).....	28
4.	A támogatott projektek megvalósulása	34
5.	Indikátorok teljesítése	40
6.	Társadalmi, környezeti és gazdasági hatások értékelése	44
6.1.	Gazdasági hatások.....	45
6.2.	Társadalmi hatások.....	45
6.3.	Környezeti hatások	46
7.	Összehasonlítás más vármegyékkel – kontextus	47
7.1.	ITP módszertan.....	47
7.2.	Többlétforrás bevonás.....	48
7.3.	Abszorpció.....	49
7.4.	Prioritások közötti eltérés és hasonlóság	50
7.5.	Egy főre jutó támogatás	51
8.	Javaslatok a jövőre nézve.....	54
1.	számú melléklet	56

Ábrajegyzék

1. ábra:	Területfejlesztési dokumentumok kapcsolatai	12
2. ábra:	Bács-Kiskun 2020 és a vármegyei ITP célok kapcsolatrendszere.....	18
3. ábra:	A Homokhátság területe	23
4. ábra:	A szabad vállalkozói zónák területe	24
5. ábra:	Az ITP stratégiai szemléletű megközelítése	27
6. ábra:	Benyújtott, támogatott és megvalósított projektek száma	29
7. ábra:	TOP tervezett források és tényleges forrásfelhasználás	30
8. ábra:	A kötelezettségvállalással bíró támogatások összege az indikatív forráskeret arányában (forrás: Az Integrált Területi Programok eredményeinek értékelése 2014-2020 Záró értékelési jelentés)	49
9. ábra:	Kifizetések összegének aránya a kötelezettségvállalással bíró támogatási összeghez képest (forrás: Az Integrált Területi Programok eredményeinek értékelése 2014-2020 Záró értékelési jelentés)	50
10. ábra:	A pénzügyi teljesítéssel bíró projektek összesített támogatásának aránya a szerződött támogatásokhoz képest TOP prioritásonként (forrás: Az Integrált Területi Programok eredményeinek értékelése 2014-2020 Záró értékelési jelentés)	51
11. ábra:	Teljesített támogatás aránya a kötelezettségvállalással bíró támogatások összegéhez képest TOP prioritásonként (forrás: Az Integrált Területi Programok eredményeinek értékelése 2014-2020 Záró értékelési jelentés)	51
12. ábra:	Az egy lakosra jutó TOP vármegyei kötelezettségvállalás (szerződött támogatás) értéke.....	52
13. ábra:	Az egy lakosra jutó teljesített TOP vármegyei támogatások értéke	52
14. ábra:	Pénzügyileg teljesített szerződött támogatás a kötelezettségvállalás arányában	53

Táblázatok jegyzéke

1. táblázat: Főbb területfejlesztési dokumentumokat és azok közgyűlési határozatszámait.....	12
2. táblázat: Az Irányító Hatóság által elvárt TKKR kritériumok	13
3. táblázat: Saját hatáskörben meghatározott TKKR kritériumok.....	17
4. táblázat: A vármegyei ITP 7.0 szerinti forrásallokáció	22
5. táblázat: A vármegye indikátorvállalásai	26
6. táblázat: TOP tervezett források és ténylegesen elszámolt támogatások	31
7. táblázat: TOP eredmények felhívásonként	33
8. táblázat: Szabad vállalkozási zóna TOP forrásfelhasználása	36
9. táblázat: TOP keretében megvalósított saját projektek.....	38
10. táblázat: Tervezett és teljesített indikátorok.....	42

1. Bevezetés

A **Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata**¹ (a továbbiakban Önkormányzat) kulcsszerepet tölt be a területfejlesztési folyamatok alakításában, amelynek egyik legfontosabb eszköze 2014-2020 között a **Bács-Kiskun vármegyei Integrált Területi Program (a továbbiakban vármegyei ITP)** volt. Az Önkormányzat felelt a területi tervezésért, a támogatási források területi szintű koordinálásáért, valamint az érintett szereplők – önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek – közötti együttműködés előmozdításáért. Az ITP tervezése és végrehajtása során az Önkormányzat nem csupán az operatív lebonyolításért felelt, hanem aktív szerepet játszott az egyes projektek stratégiai illeszkedésének biztosításában, a forrásfelhasználás nyomon követésében és az eredmények értékelésében.

A **2014–2020-as európai uniós programozási időszak** meghatározó jelentőségű volt a vármegye² fejlesztésében, hiszen a **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban TOP)** révén Bács-Kiskun számára **63,23 milliárd forint** forrás állt rendelkezésre. A kevésbé fejlett régiókban, így a vármegyében is, a decentralizált területfejlesztési támogatások a gazdaságélénkítés és a helyi közösségi szolgáltatások fejlesztésének kulcsfontosságú eszközei voltak. A program célja az volt, hogy a rendelkezésre álló források a térség gazdasági és társadalmi kihívásaira hatékony választ adjanak, különös tekintettel az települési infrastruktúra fejlesztésére, a munkahelyteremtésre, az energetikai korszerűsítésekre, az egészségügyi és szociális ellátásra, valamint a közlekedési és turisztikai beruházásokra.

A **TOP futamideje 7+3 év volt**, 2014. január 1. és 2023. december 31 között. A vármegyei ITP nem tartalmazta a megyei jogú város (Kecskemét) fejlesztéseit, így jelen dokumentum megállapításai a vármegyeszékhelyre nem térnek ki.

Az értékelés során a következő **adatforrásokra** alapoztunk:

- az irányító hatság adatszolgáltatása,
- www.palyazat.gov.hu nyilvános adatai,
- saját nyilvántartások,
- Az Integrált Területi Programok eredményeinek értékelése 2014-2020 - Záró értékelési jelentés,
- A helyi életminőség javulása terén elért eredmények értékelése - II. fázis;
- Az EU Kohéziós Politikáját szolgáló EU Alapok társfinanszírozásával megvalósuló fejlesztéspolitikai programok értékelése 6. rész - Infrastruktúra-fejlesztések értékelése - Helyi utak értékelése Zárójelentés.

Az értékelés célja, hogy áttekintést adjon a vármegyei ITP végrehajtásának eredményeiről három fő szempont mentén:

1. **A forrásfelhasználás hatékonysága** – Mennyiben sikerült a rendelkezésre álló TOP-forrásokat teljes körűen lehívni és hatékonyan felhasználni?
2. **Az indikátorok teljesülése** – A program keretében megvalósult projektek milyen mértékben járultak hozzá az előzetesen kitűzött célok eléréséhez?

¹ A továbbiakban Önkormányzat kifejezést használunk, akár Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatról, akár a névváltozást követő Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatáról van szó.

² A dokumentumban Bács-Kiskunra a vármegye kifejezést használjuk azokra az esetekre is, amikor még megye közigazgatási néven létezett.

3. **A fejlesztések környezeti, társadalmi és gazdasági hatása** – Hogyan változtatták meg a fejlesztések a helyi gazdasági környezetet, a foglalkoztatást, a közszolgáltatások minőségét és az életminőséget a vármegye településein?

Az elemzés részletesen bemutatja, hogy a vármegye milyen eredményeket ért el a 2014–2020-as fejlesztési időszakban, milyen kihívások merültek fel a végrehajtás során, és milyen tanulságokat lehet levonni a jövőbeni fejlesztések számára.

A monitoring és értékelési rendszer lebonyolítását az **Önkormányzat** végzi, együttműködve az Irányító Hatósággal és más érintett szereplőkkel. Felelőse a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatalon belül kijelölt Stratégiai és Fejlesztési Iroda.

2. Jogszabályi és szakpolitikai háttér

A **vármegyei ITP** végrehajtását több fontos jogszabály és szakpolitikai dokumentum határozta meg, amelyek a területfejlesztés és az uniós források felhasználásának jogi és intézményi kereteit rögzítették.

2.1. Önkormányzati és területfejlesztési jogszabályok

- **2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban Mötv.)**

Az Mötv. rögzíti, hogy a vármegyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.

- **2023. évi CII. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről**

Ez a törvény határozta meg a magyarországi területfejlesztés céljait, intézményrendszerét és eszközeit, valamint szabályozta a vármegyei önkormányzatok szerepét a területi programok végrehajtásában, monitorozásában és koordinációjában.

- **1/2014. (I. 3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptióról (OFTK)**

Az OFTK az ország hosszú távú fejlesztési stratégiája, amely iránymutatást adott a 2014–2020-as uniós fejlesztési időszakban megvalósuló területi beavatkozásokra, így a TOP-ra és az ITP-re is.

2.2. Az uniós fejlesztési programok végrehajtásának szabályozása

- **1121/2013. (III. 11.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott ex-ante kondicionalitások teljesítésével összefüggő feladatokról**

A határozat biztosította, hogy Magyarország teljesíti az EU által előírt előfeltételeket (ex-ante kondicionalitásokat) a 2014–2020-as fejlesztési ciklusban, így hozzáférhetett az uniós támogatásokhoz. Meghatározta az előfeltételeket, amelyeket Magyarországnak teljesítenie kellett. Kijelölte a minisztériumok és intézmények feladatait a feltételek teljesítésében. Biztosította az uniós fejlesztési források lehívásának lehetőségét.

- **1143/2013. (III. 21.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására vonatkozó programok indikatív prioritásairól**

A Korm. határozat a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására vonatkozó programok indikatív prioritásait határozta meg. Ez a határozat kijelölte azokat a fő fejlesztési területeket és célokat, amelyek mentén Magyarország az uniós forrásokat fel kívánta használni ebben az időszakban. A határozat rögzítette azokat a stratégiai területeket, amelyek fejlesztésére az uniós forrásokat koncentrálni kell. Ezek a prioritások összhangban voltak az Európai Unió 2020-as stratégiájával és Magyarország nemzeti fejlesztési céljaival. Az indikatív prioritások alapján kerültek kidolgozásra az egyes operatív programok, mint például a TOP, amelyek részletesen tartalmazták a konkrét intézkedéseket és projekteket. A határozat iránymutatást adott a források elosztására vonatkozóan, biztosítva, hogy a rendelkezésre álló uniós támogatások a legfontosabb fejlesztési területekre kerüljenek.

- **1545/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat az európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának módjáról**

Korm. határozat az európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának módjáról rendelkezett. A határozat célja az volt, hogy meghatározza azokat az intézményi struktúrákat és mechanizmusokat, amelyek biztosítják az Európai Unió által finanszírozott programok hatékony és szabályszerű végrehajtását Magyarországon. A határozat rögzítette azokat a kormányzati szerveket és ügynökségeket, amelyek felelősek az uniós programok tervezéséért, végrehajtásáért és ellenőrzéséért. Kijelölte az egyes intézmények feladatait az uniós források felhasználásának minden szakaszában, a pályázatok kiírásától kezdve a projektek megvalósításán át egészen az ellenőrzésig és értékelésig. Előírta az intézmények közötti együttműködés és információcsere mechanizmusait annak érdekében, hogy az uniós programok végrehajtása összehangolt és hatékony legyen.

- **1814/2013. (XI. 14.) Korm. határozat a 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának szervezeti kereteiről és az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó egyes feladat és hatáskörökről, és az e-közigazgatás fejlesztésének jövőbeni irányairól**

A Korm. határozat célja a 2014–2020-as európai uniós programok hatékony lebonyolítását támogató intézményrendszer szervezeti kereteinek kialakítása, az uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó feladat- és hatáskörök meghatározása, valamint az e-közigazgatás fejlesztésének jövőbeni irányainak kijelölése volt. A határozat értelmében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) keretein belül működő irányító hatóságok 2014. január 1-jétől az illetékes minisztériumokhoz kerültek át, egységes szervezeti struktúrában. A Miniszterelnökség keretein belül központi koordinációs egység jött létre az irányító hatóságok munkájának összehangolására és egységességének biztosítására. A határozat hangsúlyozta az e-közigazgatás és az e-közzolgáltatások fejlesztésének szétválasztását, különös tekintettel az Európai Bizottság elvárásaira.

- **2018/2013. (XII. 29.) Korm. határozat a gazdaságfejlesztési célokat szolgáló operatív programok esetében az integrált területi beruházás eszköz alkalmazásának módjáról, valamint az eszköz használatához szükséges feltételekről**

Ez a határozat szabályozta az Integrált Területi Beruházás (ITI) alkalmazását és az uniós források decentralizált felhasználását. A megyei ITP ennek megfelelően alakult ki, és biztosította, hogy a fejlesztési forrásokat helyi szinten hatékonyan használják fel.

- **1085/2014. (II. 28.) Korm. határozat a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatokkal kapcsolatos egyes koncepcionális kérdésekről**

A közreműködő szervezetek feladatait és felelősségi körét határozta meg az uniós támogatások lebonyolítása során.

- **272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről**

Ez a rendelet tartalmazza az uniós források felhasználásának általános szabályait Magyarországon, így a TOP keretében végrehajtott fejlesztésekre is vonatkozott.

2.3. A területfejlesztési források tervezésének, felhasználásának és ellenőrzésének szabályozási kerete

- **218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól**

Ez a rendelet szabályozza a területfejlesztési programok tartalmi követelményeit és a területi tervek kidolgozásának módszertanát.

- **1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról**

Szabályozta a 2014–2020-as uniós fejlesztési időszakra vonatkozó források felhasználásának intézményi kereteit.

- **1115/2013. (III. 8.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről**

Meghatározta a 2014–2020 közötti uniós támogatások területi koordinációs elveit, és feladatokat adott a vármegyei önkormányzatoknak a fejlesztési programok végrehajtásában.

- **1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti időszakban a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról, valamint a 2014–2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III. 8.) Korm. határozat módosításáról**

Ez a kormányhatározat a 2014–2020 közötti időszakban a TOP tervezési kereteit rögzítette, valamint módosította a korábbi 1115/2013. (III. 8.) Korm. határozatot a források megoszlásával és a területi koordinációval kapcsolatban. A határozat rögzítette, hogy a vármegyei önkormányzatok és a megyei jogú városok önkormányzatai kiemelt szereplők lesznek a TOP tervezési folyamatában. Kijelölte a prioritásokat, amelyek mentén a fejlesztési forrásokat elosztották. Az operatív programhoz tartozó vármegyék önkormányzatai saját területükre vonatkozó fejlesztési terveket készíthettek, amelyeket az ITP részeként valósítottak meg. Meghatározta, hogy a TOP-on belüli források egy részét decentralizált módon, a vármegyei szinten tervezett programokra kell allokálni. A határozat rögzítette, hogy a TOP forrásainak mekkora hányada kerül a vármegyei önkormányzatokhoz és a megyei jogú városokhoz. A határozat biztosította, hogy a fejlesztési forrásokat összehangolt módon, a vármegyei önkormányzatok és a megyei jogú városok közös stratégiai tervezése mentén használják fel.

- **1058/2014. (II. 11.) Korm. határozat a "Társadalmi és gazdasági felzárkózás által vezérelt térségi integrált program" megtervezésével kapcsolatos feladatokról**

A határozat célja, hogy olyan térségi szintű integrált fejlesztési programokat alakítson ki, amelyek elősegítik a *társadalmi és gazdasági felzárkózást* a hátrányos helyzetű térségekben. rögzítette. A TOP egyik alapidokumentuma volt, amely a megyei Integrált Területi Programok (ITP-k) keretein belül segítette a helyi fejlesztési források célzott felhasználását.

- **1298/2014. (V. 5.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról**

A jogszabály szabályozta a vármegyei önkormányzatok és a megyei jogú városok szerepét a TOP tervezésében és végrehajtásában, meghatározta a forrásmegosztás szabályait, valamint biztosította a területileg integrált fejlesztéspolitikai megközelítés érvényesülését. Ez a határozat volt az egyik legfontosabb jogszabályi alapja annak, hogy a vármegyék – így Bács-Kiskun is – önállóan készíthették el az Integrált Területi Programokat, és ezzel a saját fejlesztési prioritásaik mentén tudtak forrásokat mozgósítani.

- **1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról**

2014-2020 között a megyék integrált területi programjainak megvalósítására szolgáló forrást a TOP biztosította. A kevésbé fejlett régiókban elhelyezkedő 18 megyében megvalósuló megyei decentralizált fejlesztések tervezésére rendelkezésre álló területi szintű indikatív forrásallokációt a kormányhatározat tartalmazza, mely szerint Bács-Kiskun megyében 63,23 milliárd Ft állt rendelkezésre.

- **1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról**

A kormányhatározat a TOP keretében megvalósuló integrált területi programokat hagyta jóvá. Ez a határozat rögzítette a megyei és megyei jogú városi önkormányzatok által kidolgozott programokat, meghatározva azok megnevezését, a végrehajtó területi szereplőket, a hétéves forráskeretet, valamint az intézkedésekhez kapcsolódó tematikus célkitűzések szerinti forrásallokációt. A határozat célja az volt, hogy a 2014–2020 közötti programozási időszakban biztosítsa a TOP forrásainak hatékony és területileg kiegyensúlyozott felhasználását, támogatva a helyi fejlesztési elképzelések megvalósítását.

- **1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról**

A kormányhatározat a TOP keretében megvalósuló integrált területi programokat hagyja jóvá. A dokumentum rögzíti, hogy a Kormány elfogadja mind a 18 megye, valamint a 23 megyei jogú város által összeállított fejlesztési programokat, amelyek részletes célrendszert és forrásallokációt tartalmaznak a 2014–2020 közötti időszak uniós forrásainak felhasználására. A határozat lehetőséget teremt arra is, hogy bizonyos esetekben a megyei forrásokból finanszírozott fejlesztések megvalósuljanak a megyei jogú városok közigazgatási területén belül is, amennyiben a város ehhez hozzájárul.

A jogszabály emellett módosítja egy korábbi, 2014-es kormányhatározat szövegét, pontosítva a megyei jogú városokkal való együttműködés szabályait, és ezzel párhuzamosan visszavonja a 2015-ben kiadott, az integrált területi programok jóváhagyásáról szóló korábbi határozatot.

A döntés célja, hogy biztosítsa a TOP források hatékony és területileg kiegyensúlyozott felhasználását, és támogassa a helyi fejlesztési elképzelések megvalósulását a megyei és városi szereplők együttműködésében.

- **1747/2016. (XII. 13.) Korm. határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1. számú módosítását fogadta el a Kormány, és javasolta annak az Európai Bizottsághoz történő benyújtását.

- **1536/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról**

A TOP 2. számú módosítását fogadta el a Kormány, amely szakmai tartalomváltozást jelentett, és javasolta annak az Európai Bizottsághoz történő benyújtását.

- **15/2018. (II. 13.) Korm. rendelet a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról**

Szabályozta a szabad vállalkozási zónák létrehozását és az azokhoz kapcsolódó fejlesztési ösztönzőket, amelyeket több vármegyei fejlesztési projekt is érintett.

- **1127/2018. (III. 19.) Korm. határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról**

A TOP 3. számú módosítását fogadta el a Kormány, amely az operatív programon belüli forrásátcsoportosításra irányult, és javasolta annak az Európai Bizottsághoz történő benyújtását.

- **1267/2018. (VI. 11.) Korm. határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról**

A TOP 4. számú módosítását fogadta el a Kormány, amely az operatív programon indikátorváltozásaira irányult, és javasolta annak az Európai Bizottsághoz történő benyújtását.

- **1401/2019. (VII. 5.) Korm. határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról**

A kormányhatározat a 1612/2016-os határozat módosításával biztosította a TOP keretében megvalósuló integrált területi programok aktuális fejlesztési irányainak és forrásainak megfelelő elosztását, figyelembe véve a 2014–2020 közötti programozási időszak célkitűzéseit és a felmerült új igényeket.

- **1453/2019. (VII. 26.) Korm. határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról**

A TOP 5. számú módosítását fogadta el a Kormány, és javasolta annak az Európai Bizottsághoz történő benyújtását.

- **1144/2020. (IV. 8.) Korm. határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról**

A kormányhatározat a 1612/2016-os határozat módosításával biztosította a TOP keretében megvalósuló integrált területi programok aktuális fejlesztési irányainak és forrásainak megfelelő elosztását, figyelembe véve a 2014–2020 közötti programozási időszak célkitűzéseit és a felmerült új igényeket.

- **„Útmutató a megyék integrált területi programjainak kidolgozásához és megvalósításához (több verzió is létezett)**

Az "Útmutató a megyék integrált területi programjainak kidolgozásához és megvalósításához" egy módszertani segédlet, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium (később a Pénzügyminisztérium) adott ki a 2014–2020-as európai uniós programozási időszakokban. Az útmutató célja, hogy iránymutatást nyújtson a vármegyei önkormányzatok számára az ITP-k elkészítéséhez és végrehajtásához, biztosítva ezzel a TO) forrásainak hatékony és összehangolt felhasználását.

Az útmutató több verzióban jelent meg, igazodva a programozási időszakok és a jogszabályi környezet változásaihoz. Például a 2015. január 30-án kiadott 2.0 verziót követte a 2016 januárjában megjelent 2.1 verzió, amely további pontosításokat és kiegészítéseket tartalmazott. Az útmutató alkalmazása segítette a vármegyei önkormányzatok munkáját, hogy képesek legyenek összehangoltan és hatékonyan tervezni és végrehajtani a területfejlesztési programjaikat, biztosítva ezzel a rendelkezésre álló uniós források optimális felhasználását és a helyi fejlesztési igények kielégítését.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Bács-Kiskun vár megyei ITP végrehajtása egy többszintű jogszabályi keretrendszerbe illeszkedett. A magyar önkormányzati és területfejlesztési törvények rögzítették a vármegyei önkormányzat szerepét a fejlesztések koordinálásában, míg az uniós és kormányzati szabályozások biztosították a TOP-források hatékony és átlátható felhasználását. Az ITP végrehajtásának kereteit az európai uniós jogszabályok és az azoknak megfelelő hazai

kormányhatározatok együttesen határozták meg, így garantálva a források célszerű elosztását és felhasználását. Az Európai Bizottság 2014 végén hivatalosan is jóváhagyta a TOP-ot, így az megkezdhetette a 2014–2020-as időszakban a források lehívását. A TOP-ot a kormány többször módosította és ezeket az Európai Bizottság újból jóváhagyta. A végső elfogadott verziót a TOP 4. számú változatában rögzítették.

2.4. Az Önkormányzat által elfogadott területfejlesztési dokumentumok

A vármegyék, így Bács-Kiskun vármegye területfejlesztési tervezési folyamata is az alábbi lépésekből és feladatokból állt:

1. Vármegyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése (2013-ban elkészült)
2. Vármegyei területfejlesztési koncepció elkészítése (2013-ban elkészült)
3. Vármegyei területfejlesztési program elkészítése (2014-ben elkészült)
4. Vármegyei területfejlesztési program stratégiai környezeti vizsgálata (2014-ben elkészült)
5. Vármegyei területfejlesztési program Natura 2000 vizsgálata (2014-ben elkészült)
6. 2014-2020 időszak forrásfelhasználását segítő integrált területi program elkészítése a vármegyék – 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozatban meghatározott – TOP forráskeretére (2015. május 11-ig elkészült, felülvizsgálatuk folyamatos volt).


Az 1. számú táblázat az Önkormányzat által elfogadott vármegyei ITP verziókat, valamint az azok megalapozását szolgáló főbb területfejlesztési dokumentumokat és azok közgyűlési határozatszámaikat tartalmazza.

Elfogadott dokumentum	Közgyűlési határozatszám
Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciója – I. Helyzetelemzési fázis	60/2013. (XI.29.)
Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciója – II. Javaslattevő fázis	60/2013. (XI.29.)
Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Programja	54/2014. (IX.26.)
Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Programjának stratégiai környezeti vizsgálata	56/2014. (IX.26.)
Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Programjának Natura 2000 vizsgálata	55/2014. (IX.26.)
Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye 2020 Integrált Területi Programja 1.0	57/2014. (IX.26.)
Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye 2020 Integrált Területi Programjának egyeztetési változata	17/2015. (III.27.)
Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye 2020 Integrált Területi Program végső változata (verzió 1.0)	25/2015. (IV.30.)
Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye 2020 Integrált Területi Program 1. számú módosítása (verzió 2.0)	47/2015. (IX.25.)

Elfogadott dokumentum	Közyűlési határozatszám
Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye 2020 Integrált Területi Program 2. számú módosítása (verzió 3.0)	55/2016. (IX.30.)
Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye 2020 Integrált Területi Program 3. számú módosítása (verzió 4.0)	70/2016. (XI.25.)
Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye 2020 Integrált Területi Program 4. számú módosítása (verzió 5.0)	42/2018. (IV.27.)
Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye 2020 Integrált Területi Program 5. számú módosítása (verzió 6.0)	95/2018. (XI.30.)
Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye 2020 Integrált Területi Program 6. számú módosítása (verzió 7.0)	5/2020. (II.28.)

1. táblázat: Főbb területfejlesztési dokumentumokat és azok közgyűlési határozatszámai

Az 1. számú ábra szemlélteti a főbb, vármegyei szintű területfejlesztési tervezési kötelezettségeket a 2014-2020 időszakra vonatkozóan.

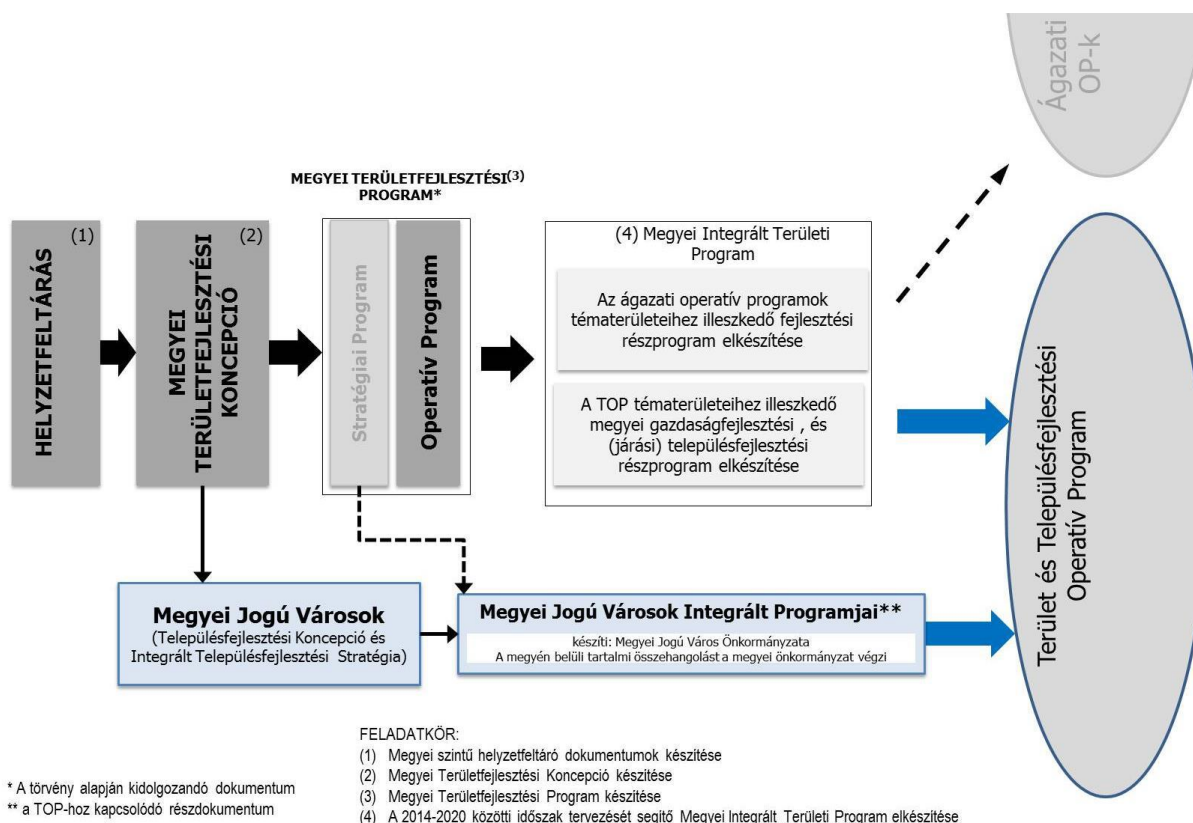

1. ábra: Területfejlesztési dokumentumok kapcsolatai

2.5. A vármegyei ITP lényegi elemei

A **vármegyei ITP** a 2014–2020 közötti európai uniós költségvetési időszakra készült, a TOP keretében rendelkezésre álló források hatékony és célzott felhasználását megalapozó stratégiai dokumentumnak. Az integrált területi programok célja az volt, hogy a vármegyék által korábban kidolgozott területfejlesztési koncepciók és programok mentén – a helyi szükségletek és fejlesztési

elképzelések figyelembevételével – meghatározza a TOP forráskeretek felhasználásának szerkezetét, prioritásait, elvárt eredményeit és ütemezését.

Az integrált területi program tehát összeköti a vármegyei szintű stratégiai gondolkodást a konkrét fejlesztési beavatkozásokkal, és biztosítja, hogy a forrásfelhasználás illeszkedjen a térségi igényekhez. Az Önkormányzat számára a vármegyei ITP kiemelt jelentőséggel bír, mivel ez alapján valósíthatta meg fejlesztési céljait a TOP első öt prioritási tengelye mentén, együttműködésben a regionális fejlesztési programok irányító hatóságával (a továbbiakban IH).

A vármegyei ITP felépítésére részletes útmutatást az „Útmutató a megyék integrált területi programjának kidolgozásához és megvalósításához” című dokumentum adott.

A vármegyei ITP tartalmazza a **Területi Kiválasztási Kritérium Rendszert** (a továbbiakban TKKR) is, amely a projektkiválasztás alapjául szolgáló módszertani keretet adta meg. Ezek egyrészt az IH által rögzített kötelező kritériumok, másrészt az Önkormányzat által választott elvárások voltak a 2. számú táblázat szerint.

Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat
Illeszkedés a TOP céljaihoz	A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét céljához/céljaihoz való szoros illeszkedés és a kapcsolódó indikátorokhoz való hozzájárulás.
Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság	A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. Szükséges a szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és kihasználtsági terv.
Megalapozottság	A kiválasztás kritériuma, hogy a fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége, megvalósíthatósága milyen mértékben megítélhető a rendelkezésre álló információk, és a benyújtásra került dokumentumok alapján. A szempont ennek megfelelően garanciát is jelent pl. a vállalt indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre vonatkozóan.
Kockázatok	A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a működtetés milyen kockázatokat hordoz.
Projekt komplexitása	A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához.
Hatás	A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve hogy milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a hatását.
Integrált megközelítés	Az ágazati OP-k projektjeihez, illetve a TOP más intézkedéseinek projektjeihez való kapcsolódás, a tervezett fejlesztések egymáshoz való illeszkedése, szinergikus hatása.
Fenntarthatóság	Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló produktum társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi fenntarthatósága, az erőforrás-hatékonyság, az alacsony károsanyag-kibocsátás és környezetterhelés, a környezettudatosság (pl. a fejlesztésekben az energiahatékonysági szempontok érvényesítése, megújuló energiaforrások, a kedvezőbb környezeti hatásokkal járó megoldások előnyben részesítése). A tervezett fejlesztés az ÜHG kibocsátást a lehető legkisebb mértékben növelje, lehetőleg csökkentse. A fejlesztés pénzügyileg megalapozott, a projekt megvalósításához és működtetéséhez szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak, többlet fenntartási támogatást nem igényelnek.
Esélyegyenlőség	A kiválasztási kritérium a fejlesztés azon aspektusát vizsgálja, hogy az semmilyen módon ne legyen kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem.
Költséghatékonyság	A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett.
Eredményesség	A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a releváns indikátorteljesítéshez.

2. táblázat: Az Irányító Hatóság által elvárt TKKR kritériumok

Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat	Szöveges magyarázat
Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz	A kiválasztás kritériuma, a megye területfejlesztési programjához és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulás.	<u>Alaphelyzet:</u> A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 54/2014 (IX. 26.) Kgy. határozatával elfogadta Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Programját, mely dokumentum széleskörű, területi és tematikus módon egyaránt szerveződő partnerségen, illetve a megye Területfejlesztési Konceptióján alapulva foglalja össze a megye fejlesztési elképzeléseit. Az ITP illeszkedése a megyei programhoz biztosítja az ágazati, a TOP-os és egyéb forrásokból megvalósuló fejlesztések összhangját. <u>Illeszkedő megyei program célok:</u> A megye társadalmi-gazdasági súlyának növelése a Kárpát-medencében és az európai térben inkluzív növekedés révén (átfogó cél) Az emberek és a környezet harmonikus együttélésének megteremtése (átfogó cél) Területi felzárkózás, a megye belső kohéziójának erősítése (átfogó cél) Egészséges és megújuló társadalom (átfogó cél) Gazdasági versenyképesség erősítése, innovatív gazdaság a KKV-szektor megerősítésével (Tem1) Élhető és életképes vidék (Tem2) A megye belső kohézióját és makrotársadalmi integrációját szolgáló intézményi és infrastrukturális fejlesztések (Tem3) A táji jellemzőkre koncentráló integrált fejlesztések a Homokhátságon, kiemelt figyelemmel a klímaváltozásra (Ter1) Kecskemét fejlesztési körzet dinamikus növekedését elősegítő offenzív fejlesztési stratégia megvalósítása (Ter2) Városterületi funkcionális és infrastrukturális kapcsolatok fejlesztése (Ter3) A Duna-mente természeti és logisztikai potenciáljának kiaknázását szolgáló integrált fejlesztések (Ter4) A határ-menti térségek határon átnyúló szervezeti és térkapcsolataira alapozó kohézió erősítő fejlesztések (Ter5)


Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat	Szöveges magyarázat
Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítéshez	A kritérium bevezetése az adott földrajzi területen belüli bármilyen egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.	<u>Alaphelyzet:</u> Bács-Kiskun megye gazdaságilag különböző fejlettségű kisebb területi egységekből áll, és a társadalmi mutatók – a megyén belüli helyzettől függően – is meglehetősen eltérőek. A megyeszékhely gazdasági és társadalmi mutatói (az országos városi rangsorban) korábban is viszonylag jók voltak, az elmúlt évek nagy volumenű beruházásainak és fejlesztéseinek köszönhetően pedig Kecskemét hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő városává vált, és ez a fejlődés valamelyes a Kecskeméti járás többi településére is továbbterjedt. Ezzel szemben a megye többi 10 járása a 290/2014 Korm.rendelet értelmében „kedvezményezettnek” számít, közülük is a Bácsalmási és Jánoshalmi járások „komplex programmal fejlesztendőnek”, míg a Kiskunmajsai és Kunszentmiklósi járások „fejlesztendőnek” minősülnek. <u>Illeszkedő megyei program célok:</u> Területi felzárkózás, a megye belső kohéziójának erősítése (átfogó cél) A megye belső kohézióját és makrotárségi integrációját szolgáló intézményi és infrastrukturális fejlesztések (Tem3)
Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez	A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja.	<u>Alaphelyzet:</u> Az ezredfordulót követő időszakban a foglalkoztatási rátát illetően az országos szinten jellemző fokozatosan javuló trendtől elszakadva a megye lassú visszaesést mutat. A válság következtében megjelenő foglalkoztatás-csökkenés e fejlettebb területekhez képest kissé időben késve és kevésbé drasztikusan jelenik meg, de így is súlyos munka-erőpiaci krízist eredményezve, majd az adatok 2010-től emelkednek ismét, szinte egy év alatt elérve a válság előtti szintet, de még mindig az országos átlag alatt maradva. Foglalkoztatási szempontból a legrosszabb helyzetben a hátrányos helyzetű, a közép- és nagyobb városoktól, illetve a közlekedési folyosóktól távol lévő térségek alacsony iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalói vannak. <u>Illeszkedő megyei program célok:</u> A megye társadalmi-gazdasági súlyának növelése a Kárpát-medencében és az európai térben inkluzív növekedés révén (átfogó cél) Egészséges és megújuló társadalom (átfogó cél) Gazdasági versenyképesség erősítése, innovatív gazdaság a KKV-szektor megerősítésével (Tem1) Élhető és életképes vidék (Tem2)
Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség erősítéséhez	A kritérium bevezetésével szemponttá válik a beavatkozások hozzájárulása az ellenálló képesség növekedéséhez.	<u>Alaphelyzet:</u> A szárazodás, az aszály, a szélsőséges időjárási jelenségek gyakoriságának megnövekedése (viharok, rövid idő alatt hulló nagy mennyiségű csapadék, jégesők), a térség hidrológiai egyensúlyának megbomlása, valamint a változások előre nem látható következményei jelentős terheket jelentenek az itt élő társadalmi közösségek számára, ráadásul – a prognózisok szerint – a jövőben ez a fajta kiszámíthatatlanság csak fokozódni fog.

Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat	Szöveges magyarázat
		A napsütéses órák magas számából, a rendelkezésre álló termálvíz- és biomassza-mennyiségből adódóan a megye jelentős potenciállal bír a megújuló energiatermelés terén. Ezen potenciál fokozottabb kihasználása eszköze lehet a fajlagos széndioxid-kibocsátás csökkentésének és ezáltal a klímaváltozás elleni küzdelemnek. <u>Illeszkedő megyei program célok:</u> Az emberek és a környezet harmonikus együttélésének megteremtése (átfogó cél) Gazdasági versenyképesség erősítése, innovatív gazdaság a KKV-szektor megerősítésével (Tem1) Élhető és életképes vidék (Tem2) A táji jellemzőkre koncentráló integrált fejlesztések a Homokhátságon, kiemelt figyelemmel a klímaváltozásra (Ter1)
Egyéb: Hozzájárulás integrált fejlesztési programok megvalósításához	Több szakmai és/vagy földrajzi terület fejlesztési rendszerébe illeszkedő kezdeményezések.	<u>Alaphelyzet:</u> Az integrált szemléletű tervezés és megvalósítás egyértelműen növeli a forrásfelhasználás hatékonyságát, hozzájárul a szinergiák kiaknázásához, csökkenti a párhuzamosságokat és a beruházások káros egymásrahatásait, továbbá teljes mértékben kihasználja a széleskörű partnerség által nyújtott előnyöket. Ennek megfelelően a Terület- és Településfejlesztési Program is lehetőséget kínál, sőt bizonyos területeken el is várja az integrált megközelítést. Az integráltság a TOP keretein belül értelmezve jelentheti az ERFA- és ESZA-források együttes felhasználását, ez jellemző például a városrehabilitációs projektekre, vagy a foglalkoztatási paktum azon támogatásaira, melyek konkrét, 1.1 intézkedés keretében megvalósult gazdaságfejlesztési projektet egészítenek ki. További szempont, hogy ne a pontszerű, elszigetelt fejlesztések legyenek túlsúlyban, hanem több települést érintő, összehangolt projektekben, hálózatokban gondolkodjunk. Jellemzően ilyen terület a turizmus és a közlekedés. A szükséges települések közötti egyeztetések szinterei lehetnek a tervezés során hatékonyan működő járási területfejlesztési munkacsoportok a települési polgármesterek részvételével. Fontos, hogy az integráltság ne csak a TOP-on belül legyen értelmezhető. A kritérium lefektetésének célja az is, hogy előnyt élvezhessenek azok a fejlesztési elképzelések, melyek egy nagyobb, több ágazatot vagy területet érintő program TOP-ból finanszírozható, fontos elemét képezik, ez az eset állhat fenn például egy önkormányzati iparterületi vagy ipari parki fejlesztésnél, ahol a betelepülők GINOP-ból juthatnak telephely-fejlesztési vagy K+F+I támogatáshoz. <u>Illeszkedő megyei program célok:</u> A megye társadalmi-gazdasági súlyának növelése a Kárpát-medencében és az európai térben inkluzív növekedés révén (átfogó cél) Az emberek és a környezet harmonikus együttélésének megteremtése (átfogó cél) Területi felzárkózás, a megye belső kohéziójának erősítése (átfogó cél)

Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat	Szöveges magyarázat
		Egészséges és megújuló társadalom (átfogó cél) Gazdasági versenyképesség erősítése, innovatív gazdaság a KKV-szektor megerősítésével (Tem1) Élhető és életképes vidék (Tem2) A megye belső kohézióját és makrotársadalmi integrációját szolgáló intézményi és infrastrukturális fejlesztések (Tem3) A táji jellemzőkre koncentráló integrált fejlesztések a Homokhátságon, kiemelt figyelemmel a klímaváltozásra (Ter1) Kecskemét fejlesztési körzet dinamikus növekedését elősegítő offenzív fejlesztési stratégia megvalósítása (Ter2) Városi funkcionális és infrastrukturális kapcsolatok fejlesztése (Ter3) A Duna-menti természeti és logisztikai potenciáljának kiaknázását szolgáló integrált fejlesztések (Ter4) A határ-menti térségek határon átnyúló szervezeti és térkapcsolataira alapozó kohézió erősítő fejlesztések (Ter5)

3. táblázat: Saját hatáskörben meghatározott TKKR kritériumok

A vármegyei ITP fontos eleme a **célkitűzések és azok integráltságának bemutatása** volt. A dokumentum egyidejűleg kapcsolódott a vármegyei területfejlesztési programhoz és a TOP 1–5. prioritási tengelyeihez (6-7. prioritás nem volt része), ezzel biztosítva, hogy a forrásfelhasználás egyszerre szolgálja a helyi igényeket és az országos szintű operatív célokat. A célok közötti kapcsolatot az ITP szövegesen és vizuálisan is bemutatta.

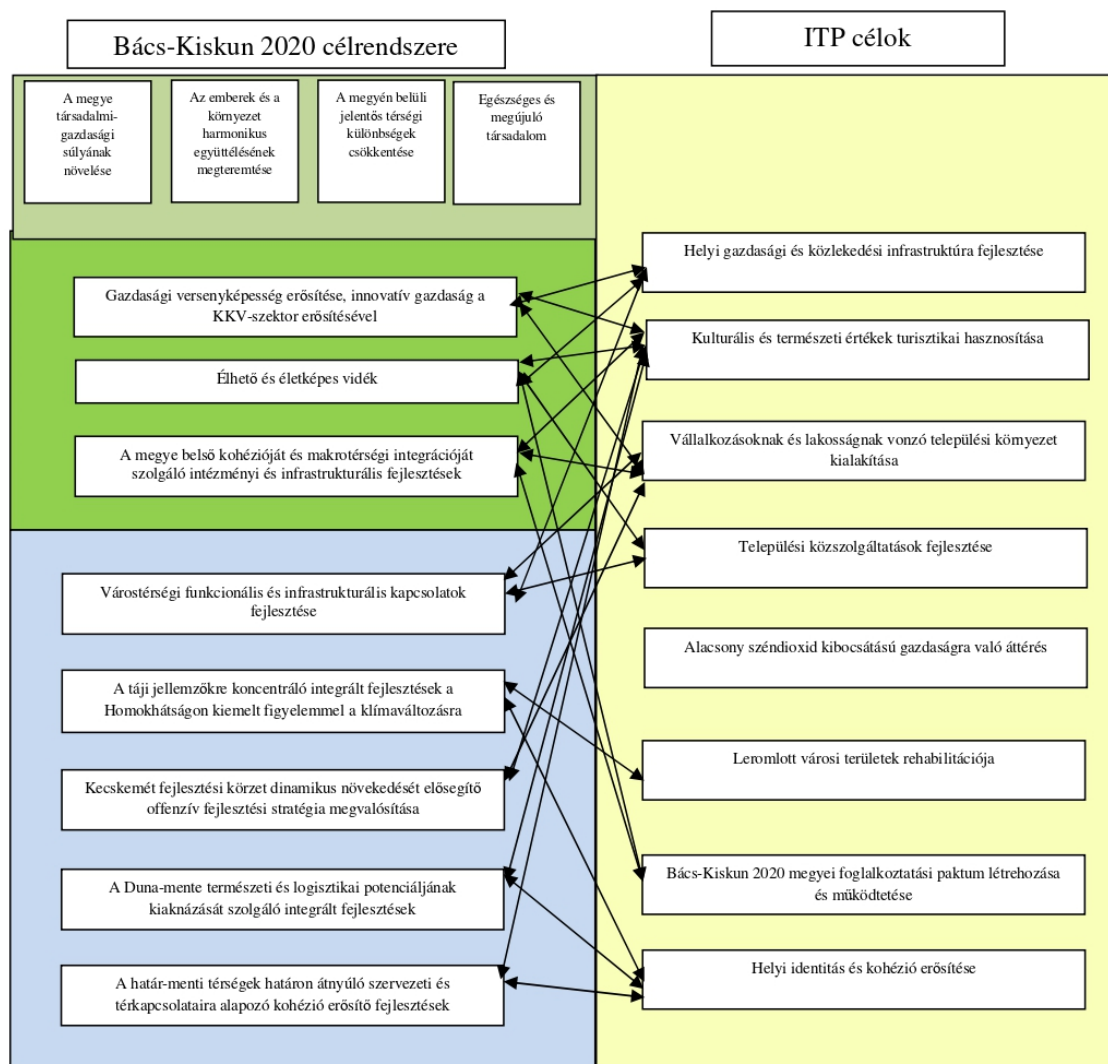

2. ábra: Bács-Kiskun 2020 és a vármegyei ITP célok kapcsolatrendszere

Az első cél a helyi gazdasági és közlekedési infrastruktúra fejlesztése volt, amelynek keretében a lokális üzleti környezet fejlesztése mellett a munkahelyek elérhetőségének javítására is nagy hangsúlyt fektettek. Ezen intézkedések támogatták a vállalkozások munkahelyteremtő képességét, valamint elősegítették a munkavállalók mobilitását, ezzel növelve a foglalkoztatást.

A második célkitűzés a kulturális és természeti értékek turisztikai hasznosítására irányult, amely a gazdaság diverzifikációját célozta meg. Ennek eredményeként új vállalkozások jöttek létre, és a turistaforgalom növekedésével a foglalkoztatás bővült.

A harmadik cél a vállalkozások és a lakosság számára vonzó települési környezet kialakítása volt, amely erősítette a városközpontok gazdasági funkcióját, bővítette a kereskedelmi és szolgáltatói kapacitásokat, valamint biztosította az élhető városi környezetet, ami kedvezett a munkavállalási feltételeknek.

A negyedik cél a települési közszolgáltatások fejlesztése volt, különös tekintettel az egészségügyi és szociális ellátórendszerre. A fejlesztések révén az aktív lakosság igényeit jobban kielégítették, és elősegítették a munkaerőpiacra való visszatérést.

Az ötödik cél az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés volt, amely csökkentette az üvegházhatású gázok kibocsátását, ezzel mérsékelve az éghajlatváltozás negatív hatásait és biztosítva a fenntartható gazdasági működést a térségben.

A hatodik cél a leromlott városi területek rehabilitációjára irányult, amely az életkörülmények javításával nemcsak a városkép fejlődéséhez járult hozzá, hanem a foglalkoztatási lehetőségek bővítéséhez is, különösen a hátrányos helyzetű lakosok integrálásával.

A hetedik cél Bács-Kiskun 2020 megyei foglalkoztatási paktum létrehozása és működtetése volt, amely a területi alapon végrehajtott fejlesztések humán erőforrás oldali támogatását biztosította, ezáltal integrálva a gazdasági és foglalkoztatási célokat.

Végül, a nyolcadik cél a helyi identitás és kohézió erősítése volt, amely a társadalmi összefogás növelésével biztosította, hogy a fejlesztések minden társadalmi réteget elérjenek, és a helyi közösségek aktívan vegyenek részt a projektekben.

E célkitűzések összességében hozzájárultak a decentralizált gazdaságfejlesztéshez, a foglalkoztatás növeléséhez és a térségi társadalmi kohézió erősítéséhez, így szervesen kapcsolódtak a TOP átfogó stratégiai céljaihoz.

A vármegyei ITP tartalmazta a külső és belső területi kapcsolatrendszerét is vizsgálata, amely azt elemezte, hogyan kapcsolódhat a vármegye fejlesztéspolitikája a szomszédos vármegyékhez, a megyei jogú városhoz, az országos fejlesztési dokumentumokhoz, illetve nemzeti programokhoz. Az elemzés során figyelembe vették az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióban meghatározott tematikus célokat, mint például a versenyképes, innovatív gazdaság, a gyógyító Magyarország és az életképes vidék kialakítása.

A vármegyei ITP a céljai közötti kapcsolódásokat is vizsgálta, különösen a gazdaságfejlesztési célok és az azokat támogató infrastrukturális, turisztikai, környezeti és közszolgáltatási fejlesztések összefüggéseit. A vizsgálat rávilágított arra, hogy a vármegyei ITP céljai között szoros összefüggések vannak, mivel a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházások erősítik a turizmus fejlődését és a települések vonzerejét is. Az egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése elősegíti a munkaerő mobilitását és a foglalkoztatás növelését, míg a környezetvédelmi intézkedések a fenntarthatóságot biztosítják. A foglalkoztatási paktumok és a helyi identitás erősítése pedig a társadalmi kohéziót növelik, amely szintén alapvető a gazdasági fejlődés szempontjából. A vármegyei ITP célrendszerének összehangolása így biztosította, hogy a fejlesztési projektek integrált módon valósuljanak meg, hozzájárulva a térségi különbségek csökkentéséhez és a fenntartható fejlődéshez.

A harmadik kulcselem a vármegyei ITP-ben a **forrásallokáció bemutatása** volt. A vármegyei ITP forrásallokációját a területfejlesztési tervezés során létrehozott járási és tematikus munkacsoportok segítségével végzett igényfelmérésre alapoztuk. Ezen igényfelmérések és a TOP-ban tervezett intézkedések figyelembevételével terveztük a támogatási kereteket. Ez két szinten történt: egyrészt a vármegyei TOP-keret tematikus (prioritás tengelyenkénti) megoszlását, másrészt az intézkedésenkénti részletezést tartalmazta.

A vármegyei ITP nem egyedi projekteket, hanem intézkedéseket és azokhoz rendelt forrásfelhasználási módokat rögzített. E módok lehettek például kiemelt földrajzi célterületek,

vármegyei önkormányzati fejlesztések, vagy speciális kedvezményezett csoportok támogatása. Az Önkormányzat határozhatta meg, hogy egy-egy intézkedés forráskeretén belül milyen arányban kívánja támogatni ezeket a célcsoportokat. A dokumentum tartalmazta a **forrásfelhasználás ütemezését** is, amely elősegítette a fejlesztések időbeni tervezhetőségét és az előrehaladás nyomon követését.

A forrásallokáció az igényekhez igazodva többször, illetve a TOP félidei értékelése miatt is módosult. A TOP 2018. évi éves végrehajtási jelentése alapján országos szinten a részcélokat a TOP 1. prioritás teljesítette, míg a TOP 2., 3., 4., és 5. prioritások nem teljesítették. Meglátásunk szerint ennek oka többek között a felhívások késői meghirdetésében, a támogatási szerződések késői megkötésében és az építőipart érintő általános anyagár- és munkadíj-emelkedésből, valamint a tervezők, közbeszerzési tanácsadók és kivitelezők – részben a nagy számosságú EU-társfinanszírozott beruházások egy időben történő megvalósításából adódó - fokozott leterheltségében keresendő.

A 4. számú táblázat a vármegyei ITP utolsó verziója szerinti forrásallokációt mutatja be.

TOP prioritások	1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére				2. Vállalkozásbarát, népeségmegtartó településfejlesztés	3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken		4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése			5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés			
TOP prioritások intézkedései	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	2.1. Gazdaságélénkítő és népeségmegtartó településfejlesztés	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ESZA	ESZA	ESZA	
1401/2019. (VII.5.) Korm. határozattal módosított 1612/2016. (XI.8.) Korm. határozattal rögzített intézkedéseink énti megyei forrásmegosztás (Mrd Ft)	9,018	5,666	4,047	5,988	11,699	4,894	10,954	2,253	1,429	1,375	4,050	0,449	1,405	63,227
6%-os EK tartalék átcsoportosítását követően módosuló megyei forráskeret, intézkedéseink ént (Mrd Ft)	9,670	6,318	4,699	6,342	10,997	4,600	10,297	2,118	1,343	1,293	3,807	0,422	1,321	63,227


TOP prioritások	1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére				2. Vállalkozásbarát, népességmentő településfejlesztés	3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken		4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése			5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés			
TOP prioritások intézkedései	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmentő településfejlesztés	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	
"-15-ös végű" körben meghirdetett források (Mrd Ft)	2,028	3,026	4,699	3,304	9,394	1,394	4,607	0,978	0,935	1,293	1,638	0,422	0,000	33,717
"-16-os végű" körben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	7,642	3,292	0,000	1,931	1,603	3,206	5,690	1,140	0,408	0,000	2,170	0,000	1,321	28,402
"-17-es végű" körben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Paktum forrásból bölcsokei felhívás (1.4.1-19) keretében meghirdetett forrás (Mrd Ft)	0,000	0,000	0,000	1,108	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,108
Összesen	9,670 Ft	6,318 Ft	4,699 Ft	6,342 Ft	10,997 Ft	4,600 Ft	10,297 Ft	2,118 Ft	1,343 Ft	1,293 Ft	3,807 Ft	0,422 Ft	1,321 Ft	63,227

4. táblázat: A vármegyei ITP 7.0 szerinti forrásallokáció

A vármegye a rendelkezésére álló támogatási keretet a következő öt forrás felhasználási mód (a továbbiakban ffm) segítségével juttatta el a kedvezményezettekhez:

- **a vármegye kiemelt fejlesztési célterületének kerete:** a vármegye területfejlesztési programjában az egyes ágazati fejlesztések esetében kijelölt kiemelten fontos fejlesztési célterületeket. Az Önkormányzat alkalmazta az ffm-et.
- **a vármegye kiemelt fejlesztési céljaira fordított keret:** a vármegye területfejlesztési programjában ugyan nem jelölt ki az egyes ágazati fejlesztések esetében kiemelten fontos fejlesztési témákat, de a vármegyei ITP-ben az Önkormányzat alkalmazta ezt az ffm-et.
- **kiemelt kedvezményezett csoportra vonatkozó keret:** az adott intézkedés/konstrukció esetében támogatásra jogosult helyi szereplők közül a vármegye előnyben részesíthetett bizonyos helyi szereplői csoportokat egy bizonyos keretösszeg erejéig. Az Önkormányzat alkalmazta az ffm-et.
- **vármegyei önkormányzat saját projektjei:** ebbe a felhasználási módba kerültek besorolásra azok az Önkormányzat által megvalósítani tervezett fejlesztések, amelyek már a vármegyei ITP tervezés/felülvizsgálat szakaszában pontosan láthatóak voltak. Ide tartoznak az önkormányzat, hivatala és saját tulajdonában álló szervezeti által kezdeményezett fejlesztések. Az Önkormányzat alkalmazta az ffm-et.
- **egyéb, vármegyei szereplők által felhasználható keret:** Minden más, az adott intézkedés/konstrukció esetében támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető keretösszeg. Az Önkormányzat alkalmazta az ffm-et.


Bács-Kiskun vármegye esetében **két kiemelt fejlesztési célterület** került kiválasztásra, melyek a vármegye területfejlesztési programjában is megtalálhatók. Az egyik a Homokhátság, a másik a 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti szabad vállalkozói zónába tartozó települések.

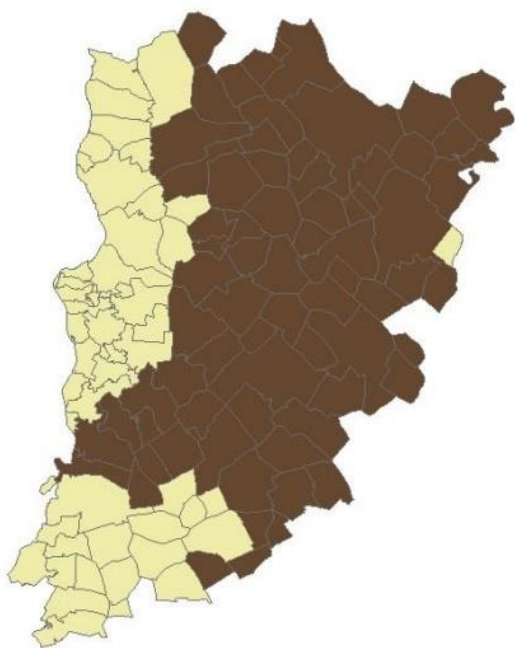

3. ábra: A Homokhátság területe

Homokhátság Bács-Kiskun megyei települései:

Felsőlajos, Lajosmizse, Kunadacs, Kunbaracs, Ladánybene, Kerekegyháza, Szentkirály, Nyárlőrinc, Lakitelek, Fülöpháza, Ballószög, Helvécia, Izsák, Ágasegyháza, Orgovány, Jakabszállás, Fülöpjakab, Kunszállás, Csengőd, Tabdi, Páhi, Kaskantyú, Bócsa, Bugacpusztaháza, Bugac, Kiskőrös, Kecel, Soltvadkert, Pirtó, Tázlár, Szank, Móricgát, Jászszentlászló, Imrehegy, Kéleshalom, Kiskunhalas, Kunfehértó, Harkakötöny, Kiskunmajsa, Kömpöc, Csólyospálos, Kisszállás, Balotaszállás, Zsana, Kelebia, Szabadszállás, Fülöpszállás, Tiszakécske, Városföld, Tiszaalpár, Kiskunfélegyháza, Petőfiszállás, Pálmonostora, Császártöltés, Hajós, Nemesnádudvar, Érsekhalma, Sükösd, Érsekcsanád, Csávoly, Rém, Borota, Jánoshalma, Mélykút, Tompa, Bácsszőlős, Csikéria, Kunbaja, Madaras, Kunpeszér.

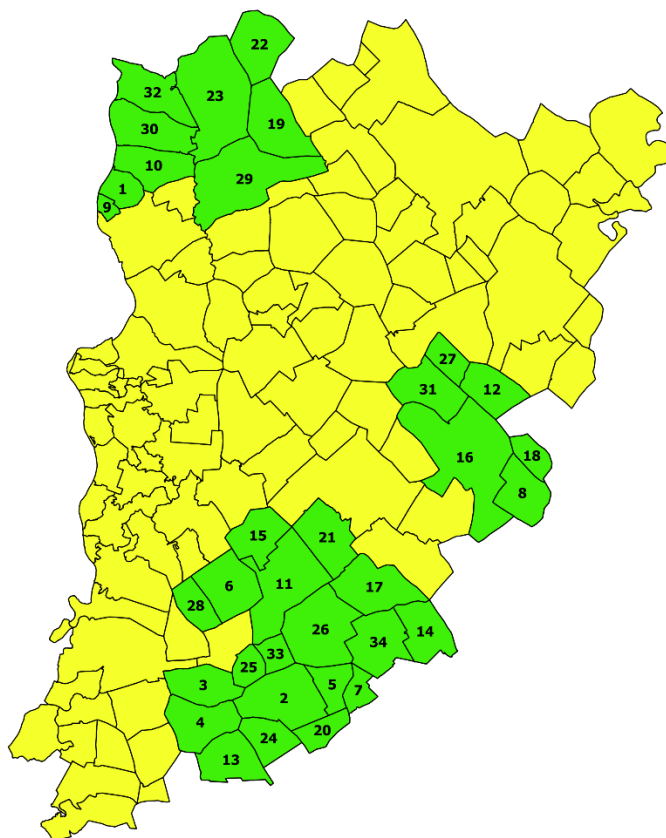

Település	Sorszám
Apostag	1
Bácsalmás	2
Bácsbokod	3
Bácsborsód	4
Bácsszőlős	5
Borota	6
Csikéria	7
Csölyospáros	8
Dunaegyháza	9
Dunavecse	10
Jánoshalma	11
Jászsztélszóló	12
Katymár	13
Kelebia	14
Kéleshalom	15
Kiskunmajsa	16
Kisszállás	17
Kömpöc	18
Kunadacs	19
Kunbaja	20
Kunfehértó	21
Kunpeszér	22
Kunszentmiklós	23
Madaras	24
Mátételke	25
Mélykút	26
Móricgát	27
Rém	28
Szabadszállás	29
Szalkszentmárton	30
Szank	31
Tass	32
Tataháza	33
Tómpa	34

4. ábra: A szabad vállalkozói zónák területe

A két földrajzi célterületre összesen közel 4,755 milliárd Ft támogatási keretet tervezett a vármegye az általánosan, minden településről pályázható támogatásokon felül, és amelyet a két földrajzi területen belül nem kívánt tovább megosztani. A földrajzi célterületeken az elsődleges cél a gazdaságfejlesztés kiemelt segítése, így a javasolt külön keretek a gazdaságfejlesztéssel összefüggő intézkedéseknél jelentek meg. A vármegyei ITP 4 milliárd Ft ERFA (1.1. intézkedés 1 Mrd Ft, 1.2. intézkedés 1,5 Mrd Ft, 1.3. intézkedés 1,5 Mrd Ft), valamint 0,755 milliárd Ft ESZA típusú támogatást (5.1. foglalkoztatási együttműködés) irányzott elő erre a célra.

Az Önkormányzat - illetve szervezetei - négy intézkedés keretében saját projektet kívántak megvalósítani, amelyek a vármegye gazdasági, turisztikai és közösségi fejlesztési céljait szolgálják.

- Az első intézkedés (1.1) keretében az Önkormányzat befektetés-ösztönzési tevékenységeit támogató projektet terveztünk. Ennek célja a települési igényeknek megfelelő üzleti környezet kialakítása volt, különösen az ipari területek és ipari infrastruktúra fejlesztése. 293 millió forintot irányoztunk elő az intézkedésre.
- A második intézkedés (1.2) a társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztést támogatta, amelyre 730 millió forintot különítettünk el. Az Önkormányzat célja a vármegye turisztikai versenyképességének növelése volt, tematikus turisztikai élményutak és attrakciók kialakításával
- A harmadik intézkedés (3.2) keretében az önkormányzat 70 millió forint támogatással települési Fenntartható Energia- és Klímaakcióterveket (SECAP) dolgozott ki. A cél a

tudatosabb energiafelhasználás elősegítése és a 2021-2027-es uniós ciklus energetikai forrásaira való felkészülés volt.

- A negyedik intézkedés (5.3) a helyi identitás és lokálpatriotizmus erősítésére irányult. Az Önkormányzat célja a vármegyei identitástudat és a helyi kötődés növelése volt, mivel ezek a tényezők hozzájárulhatnak a lakosság helyben tartásához. 534 millió Ft került a célra elkülönítésre.

Bács-Kiskun vármegyében **kiemelt fejlesztési célokra** vonatkozó keret az 1.4 intézkedés esetében került elkülönítésre: 1,462 milliárd Ft új bölcsődei férőhelyek létrehozására.

Kiemelt kedvezményezettként kizárólag az Önkormányzat jelent meg a TOP-5.1.1 felhívás kapcsán, mint konzorciumvezető szervezet, mely során kötelező konzorciumi együttműködést kellett a vármegyei kormányhivatallal megvalósítani. A Kiemelt kedvezményezett kör részére dedikált forrás 3,807 milliárd Ft.

Fontos része volt a vármegyei ITP-nek az **indikátorvállalások rendszere**, amely számszerűsítette az elérni kívánt eredményeket. Az indikátorvállalásokat Bács-Kiskun vármegyében a járási területfejlesztési munkacsoportokkal együttműködve határoztuk meg, az igényfelmérésekre alapozva. A felméréseket a területfejlesztési programozás során készítettük el, majd a TOP EU általi elfogadása után frissítettük, mivel időközben változtak a támogatható területek. A potenciális pályázói kört a járásközpontok városfejlesztési stratégiái és a demográfiai előrejelzések (pl. óvodai, bölcsődei kapacitások) alapján azonosítottuk. Az indikátorvállalásoknál figyelembe vettük a korábbi pályázati tapasztalatokat is, mint például az energetikai beruházások, utak és kerékpárutak költségeit, illetve az iparterületek telephelynagyságait.


A TOP keretében az eredményességi indikátorokat a vármegyei forrásokhoz arányosan állapítottuk meg. Jelentős kockázatot láttunk az „Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése” indikátor teljesíthetőségében, a kitűzött 9.039,49 tonna CO₂-egyenérték elérésére csak 80%-os esélyt láttunk.

A vármegyei indikátorvállalásokat az 5. számú táblázat tartalmazza, amelyek lehetővé teszik a célok teljesülésének objektív értékelését.

TOP prioritás	Kimeneti indikátor neve	Mértékegysége	TOP Célértéke (2018)	Forrásarányos célérték (2018)	Vállalt célérték (2018)	TOP Célértéke (2023)	Forrásarányos célérték (2023)	Vállalt célérték (2023)
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	ha	275	21,69	22	1 410	111,32	111,32
	A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	km	68	5,39	6	349	27,64	27,64
	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	2.500	198	198	12.561	1.090	1.090
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m ²	279.000	22.086,29	22.500	1.311.300	103.806,20	103.806,20
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	km	240	15,61	19	665	43,24	43,24
	Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	tonna CO ₂ egyenérték	13106	927	927	103 741	9 039,49	9039,49
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: Házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	185	20	29	897	91,00	91
	Helyreállított lakóegységek városi területeken	lakóegység	232	14	20	1.125	73,19	73
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma	fő	7.736	525	525	37.522	2.544,00	2.544,00
	Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	fő	26.600	2.105	2.105	129.010	11.922	11.922

5. táblázat: A vármegye indikátorvállalásai

A **vármegyei ITP monitoring és értékelési rendszere** biztosította, hogy a forrásfelhasználás, valamint a célkitűzések megvalósulása rendszeres nyomon követés és visszacsatolás mellett történjen. Az indikátorok mérése, az előrehaladási jelentések és az értékelések alapján lehetőség nyílt az esetleges módosításokra, korrekciókra is. A vármegyei ITP tehát nem csak egy tervezési feladatot, hanem annak megvalósítását, nyomonkövetését és ezek visszacsatolásával a tervek módosítását is jelenti.

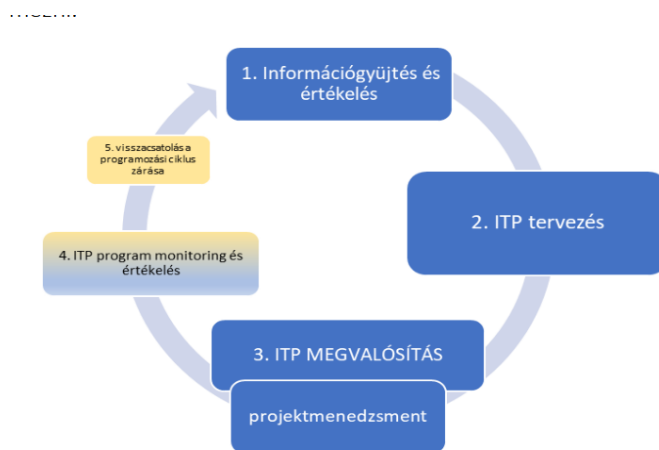

5. ábra: Az ITP stratégiai szemléletű megközelítése

Végül, de nem utolsósorban, a vármegyei ITP hangsúlyos figyelmet fordított a **partnerségi folyamatokra**. A dokumentum kidolgozása során alapelv volt a helyi társadalom, gazdasági szereplők, civil szervezetek és egyéb érintettek bevonása. A partnerség nemcsak a tervezés, hanem a végrehajtás és a nyomon követés során is fontos szerepet kapott, biztosítva ezzel a társadalmi elfogadottságot, valamint a források célszerű és eredményes felhasználását.

Összefoglalva, a vármegyei ITP egy rugalmas (többször módosuló), de világosan strukturált, integrált fejlesztési dokumentum volt, amely a vármegye számára lehetőséget adott arra, hogy helyi szinten, stratégiai gondolkodás mentén tervezze meg és valósítsa meg a TOP keretében elérhető fejlesztéseiket.

3. A forrásfelhasználás hatékonysága (2014–2020)


Bács-Kiskun vármegye a 2014–2020-as EU fejlesztési ciklusban a TOP keretében **63,23 milliárd Ft** területi fejlesztési kerettel gazdálkodhatott a vármegyei ITP-ben. A 2014-2020-as programozási időszak fejlesztéseinek megvalósulása során számos olyan tényező merült fel, ami indokolta a forráskeretek megemelését, és ennek eredményeként a programozási időszak végén azt látjuk, hogy a kötelezettségvállalással bíró fejlesztések támogatási összege jóval meghaladja az eredeti indikatív forráskeretet.

A tényleges **forrásfelhasználás meghaladta a rendelkezésre álló lehetőséget:**

- A kisgyermekes szülők munkába állásának elősegítése érdekében az 1.4 intézkedésbe TOP-on kívüli többletforrás került bevonásra: a Családvédelmi Akcióterv keretében **további 4,5695 milliárd Ft**-ból került sor új bölcsődei férőhelyek kialakítására.
- A vidéki kistelepülések alapvető infrastruktúrájának fejlesztése, ezáltal népességmegtartó képességük erősítése érdekében a 2.1 intézkedésbe TOP-on kívüli többletforrás kerül bevonásra: a Magyar Falu Program további **1 milliárd Ft**-tal támogatja az 5.000 fő alatti lakosságszámú települések csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztését.
- A TOP zárásához közeledve lehetőség volt a visszahulló és addig fel nem használt források igénylésére más vármegyék keretéből, amely további finanszírozásra adott módot, elsősorban az 5. prioritáson.

A végrehajtás rendkívül eredményes volt: a vármegye a rendelkezésre álló keretet teljes mértékben lekötötte és felhasználta. Összesen **638 támogatási kérelmet nyújtottak be, melyek közül 552 db részesült támogatásban. Mintegy 86 milliárd forint értékben** valósult meg, 116 településen (Bács-Kiskun vármegye összes települése, kivéve Kecskemét, Dunafalva, Katymár) – vagyis csaknem minden településen – valamilyen fejlesztés. Ez jelentős előrelépés a 2007–2013-as időszakhoz képest, amikor a vármegye településeinek 70%-a kimaradt az EU-fejlesztésekből.

A benyújtott támogatási kérelmek körülbelül 87 %-a részesült támogatói döntésben, ami a teljes forrásigényt tekintve az összes kérelem **89 %-át jelentette**. A támogatott projektek 99 %-a (547 db) meg is valósult, a forrásfelhasználás, azaz a kifizetési kérelemben elfogadott támogatás összege meghaladta a 86 milliárd Ft-ot.

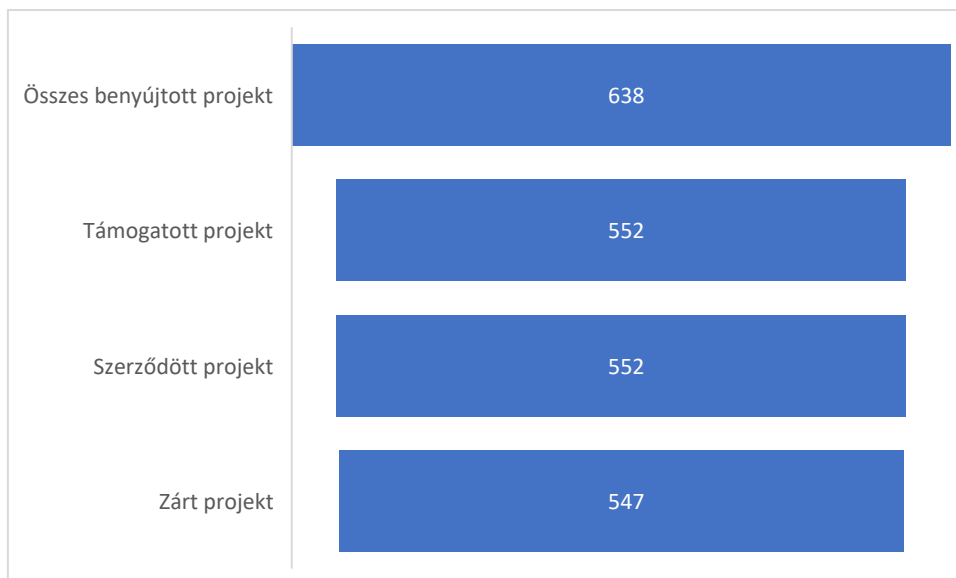

6. ábra: Benyújtott, támogatott és megvalósított projektek száma

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Ez a prioritás kiemelt szerepet kapott, hiszen a helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése, a turizmus fenntarthatóságának erősítése, a gazdaságfejlesztést segítő közlekedésfejlesztés és a foglalkoztatást támogató intézmények bővítése mind alapvető feltételei a térségi fejlődésnek. Az eredetileg tervezett 9,670 milliárd forint helyett 13,825 milliárd forintot fordítottak a helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztésére, ami azt mutatja, hogy a gazdaságélénkítő beruházások szükségessége és volumene nőtt. A fenntartható turizmusfejlesztés költsége is nőtt (6,318-ról 6,738 milliárd forintra), jelezve a turisztikai attrakciók bővülését és az infrastrukturális fejlesztések komplexebbé válását. A gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást támogató közlekedésfejlesztési projektek szintén több forrást igényeltek, a tervezett 4,699 milliárd helyett 4,943 milliárd forintot. A foglalkoztatást és életminőséget javító intézményekre fordított összeg több mint duplájára nőtt (6,342-ről 12,482 milliárd forintra), ami a családbarát és munkavállalást segítő infrastruktúra iránti igény növekedését tükrözi.

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés

A gazdaságélénkítő és népességmegtartó fejlesztések prioritása szintén növekvő forrásfelhasználást mutatott. A tervezett 10,997 milliárd forint helyett végül 17,854 milliárd forintot használtak fel. Ez arra utal, hogy a népességmegtartó fejlesztések, mint például a közösségi és gazdasági infrastruktúra erősítése, nagyobb teret kaptak a program során.

3. Alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés

Az energiahatékonyság növelése és a fenntartható közlekedés fejlesztése kulcsfontosságú a klímavédelmi célok eléréséhez. Az önkormányzati energiahatékonysági projektekre fordított források növekedtek (10,297 milliárd helyett 11,235 milliárd forint), ami az energiahatékony megoldások iránti fokozott igényt tükrözi. A fenntartható közlekedésfejlesztés szintén magasabb összeget igényelt (4,600 milliárd helyett 6,222 milliárd forint), jelezve a közlekedési infrastruktúra korszerűsítésének fontosságát.

4. Helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és társadalmi együttműködés erősítése


Az egészségügyi és szociális alapellátás fejlesztésére is nagyobb hangsúlyt helyeztek. Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése enyhén növekedett (2,118 milliárd helyett 2,163 milliárd forint), míg a szociális alapszolgáltatások bővítése jelentősen nőtt (1,343 milliárd helyett 1,744 milliárd forint). A

leromlott városi területek rehabilitációjára fordított források több mint duplájára nőttek (1,293 milliárd helyett 2,530 milliárd forint), ami arra utal, hogy az ilyen területek megújítása kiemelten fontos lett a program során.

5. Emberi erőforrás fejlesztések és társadalmi együttműködés

A foglalkoztatás növelését célzó programok is magasabb költségvetést igényeltek (3,807 milliárd helyett 4,027 milliárd forint), ami a munkaerőpiaci helyzet javítására irányuló erőfeszítéseket tükrözi. A társadalmi együttműködés erősítésére szánt források jelentősen emelkedtek (0,422 milliárd helyett 0,936 milliárd forint), ami a közösségi kohézió növelésének fontosságát mutatja. A helyi közösségi programokra is több forrást fordítottak (1,321 milliárd helyett 2,618 milliárd forint), ami a helyi közösségek erősítésére irányuló törekvések növekedését jelzi.

A TOP intézkedéscénti tervezett és tény forrásfelhasználását a következő diagram és 6. számú táblázat összegzi.

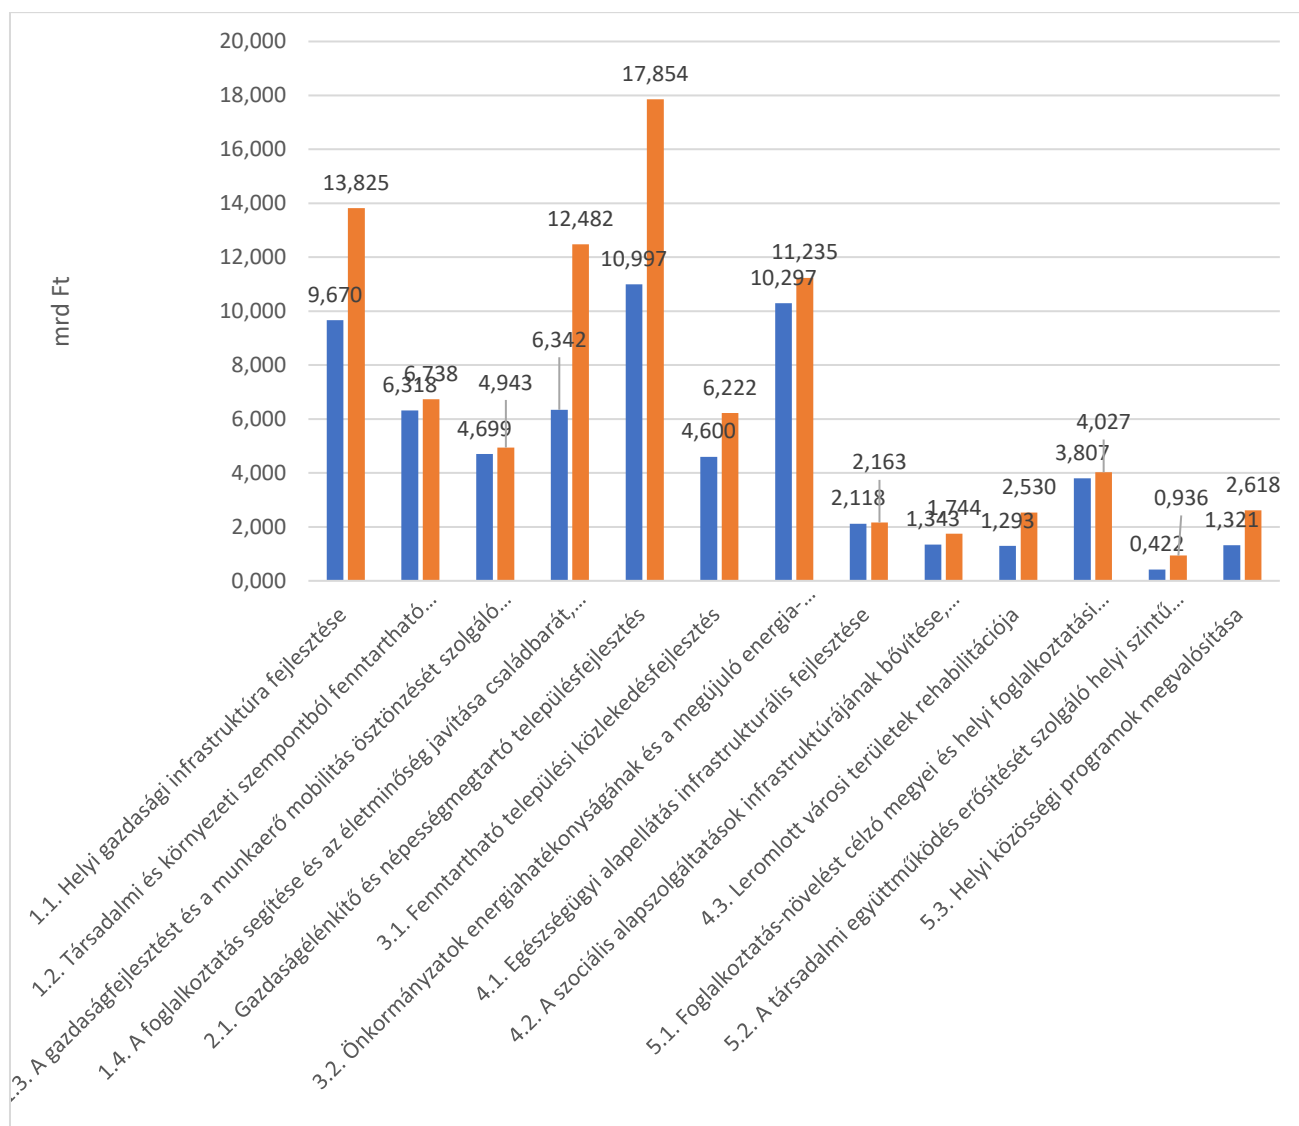

7. ábra: TOP tervezett források és tényleges forrásfelhasználás

prioritás	1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére				2. Vállalkozásbarát, népesség megtartó településfejlesztés	3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken		4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése			5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés			összesen
intézkedés	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	2.1. Gazdaságélénkítő és népesség megtartó településfejlesztés	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése	4.1. Egészségügyi alapellátás és infrastrukturális fejlesztések	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	
Alap	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ESZA	ESZA	ESZA	
TERV	9,670	6,318	4,699	6,342	10,997	4,600	10,297	2,118	1,343	1,293	3,80	0,422	1,321	63,27
TÉNY	13,825	6,738	4,943	12,482	17,854	6,222	11,235	2,163	1,744	2,530	4,027	0.936	2,618	86,381

6. táblázat: TOP tervezett források és ténylegesen elszámolt támogatások

Felhívás kódja	Felhívás címe	Összes benyújtott projekt		Támogatott projekt		Szerződött projekt		Zárt projekt		Elfogadott elszámolás	ITP keret
		db	Ft	db	Ft	db	Ft	db	Ft	Ft	Ft
TOP-1.1.1-15	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	8	2 577 976 930,00 Ft	8	2 577 976 930	8	2 577 976 930	8	2 577 976 930	2 577 880 448	
TOP-1.1.1-16	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	33	8 390 524 525,00 Ft	32	8 228 524 861	32	8 228 524 861	30	7 601 433 871	8 210 944 765	
TOP-1.1.2-16	Inkubátorházak fejlesztése	7	1 285 967 466,00 Ft	7	1 285 967 466	7	1 285 967 466	7	1 285 967 466	1 285 865 849	
TOP-1.1.3-15	Helyi gazdaságfejlesztés	-	0,00 Ft	-	-	-	-	-	-	-	
TOP-1.1.3-16	Helyi gazdaságfejlesztés	9	1 749 287 070,00 Ft	9	1 749 287 070	9	1 749 287 070	9	1 749 287 070	1 749 024 672	
TOP-1.1		57	14 003 755 991,00 Ft	56	13 841 756 327	56	13 841 756 327	54	13 214 665 337	13 823 715 734	9 670 000 000
TOP-1.2.1-15	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	13	4 231 778 563,00 Ft	9	3 647 624 363	9	3 647 624 363	9	3 647 624 363	3 644 519 871	
TOP-1.2.1-16	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	25	4 572 185 325,00 Ft	19	3 094 040 219	19	3 094 040 219	19	3 094 040 219	3 093 087 918	
TOP-1.2		38	8 803 963 888,00 Ft	28	6 741 664 582	28	6 741 664 582	28	6 741 664 582	6 737 607 789	6 318 000 000
TOP-1.3.1-15	Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	4	5 764 722 600,00 Ft	2	5 046 597 600	2	5 046 597 600	2	5 046 597 600	4 943 368 420	
TOP-1.3.1-16	Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	-	0,00 Ft	-	-	-	-	-	-	-	
TOP-1.3		4	5 764 722 600,00 Ft	2	5 046 597 600	2	5 046 597 600	2	5 046 597 600	4 943 368 420	4 699 000 000
TOP-1.4.1-15	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	33	4 893 137 913,00 Ft	24	3 829 546 035	24	3 829 546 035	24	3 829 546 035	3 828 778 667	
TOP-1.4.1-16	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	25	2 388 448 962,00 Ft	19	1 813 669 312	19	1 813 669 312	19	1 813 669 312	1 813 483 705	
TOP-1.4.1-19	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	49	7 221 457 181,00 Ft	46	6 841 200 851	46	6 841 200 851	46	6 841 200 851	6 839 571 972	
TOP-1.4		107	14 503 044 056,00 Ft	89	12 484 416 198	89	12 484 416 198	89	12 484 416 198	12 481 834 344	6 342 000 000
TOP-1.5.1-20	A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése	1	269 998 001,00 Ft	1	269 998 001	1	269 998 001	1	269 998 001	269 951 974	
TOP-1.5		1	269 998 001,00 Ft	1	269 998 001	1	269 998 001	1	269 998 001	269 951 974	0
TOP-2.1.1-15	Barnamezős területek rehabilitációja	-	0,00 Ft	-	-	-	-	-	-	-	
TOP-2.1.1-16	Barnamezős területek rehabilitációja	1	499 999 000,00 Ft	1	499 999 000	1	499 999 000	1	499 999 000	499 832 683	
TOP-2.1.2-15	Zöld város kialakítása	6	5 496 693 485,00 Ft	6	5 496 693 485	6	5 496 693 485	6	5 496 693 485	5 496 654 796	
TOP-2.1.2-16	Zöld város kialakítása	3	784 323 617,00 Ft	3	784 323 617	3	784 323 617	3	784 323 617	784 244 752	
TOP-2.1.3-15	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	34	4 090 655 312,00 Ft	31	3 804 847 589	31	3 804 847 589	31	3 804 847 589	3 790 433 627	
TOP-2.1.3-16	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	64	7 927 396 189,00 Ft	56	7 443 404 875	56	7 443 404 875	55	7 345 606 011	7 283 028 930	
TOP-2.1		108	18 799 067 603,00 Ft	97	18 029 268 566	97	18 029 268 566	96	17 931 469 702	17 854 194 788	10 997 000 000
TOP-3.1.1-15	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	11	2 144 339 718,00 Ft	11	2 144 339 718	11	2 144 339 718	11	2 144 339 718	2 136 591 963	
TOP-3.1.1-16	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	29	4 292 905 689,00 Ft	28	4 092 905 689	28	4 092 905 689	28	4 092 905 689	4 084 982 417	

Felhívás kódja	Felhívás címe	Összes benyújtott projekt		Támogatott projekt		Szerződött projekt		Zárt projekt		Elfogadott elszámolás	ITP keret
		db	Ft	db	Ft	db	Ft	db	Ft	Ft	Ft
TOP-3.1		40	6 437 245 407,00 Ft	39	6 237 245 407	39	6 237 245 407	39	6 237 245 407	6 221 574 380	4 600 000 000
TOP-3.2.1-15	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	46	4 250 402 350,00 Ft	43	4 035 828 539	43	4 035 828 539	43	4 035 828 539	4 008 141 693	
TOP-3.2.1-16	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	103	8 764 845 688,00 Ft	85	7 239 476 529	85	7 239 476 529	85	7 239 476 529	7 227 238 766	
TOP-3.2.2-15	Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	3	506 908 958,00 Ft	-	-	-	-	-	-	-	
TOP-3.2		152	13 522 156 996,00 Ft	128	11 275 305 068	128	11 275 305 068	128	11 275 305 068	11 235 380 459	10 297 000 000
TOP-4.1.1-15	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	22	1 023 132 035,00 Ft	21	998 132 035	21	998 132 035	21	998 132 035	997 565 517	
TOP-4.1.1-16	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	25	1 505 457 769,00 Ft	20	1 165 657 769	20	1 165 657 769	20	1 165 657 769	1 165 377 444	
TOP-4.1		47	2 528 589 804,00 Ft	41	2 163 789 804	41	2 163 789 804	41	2 163 789 804	2 162 942 961	2 118 000 000
TOP-4.2.1-15	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	19	1 500 094 123,00 Ft	12	915 701 217	12	915 701 217	12	915 701 217	913 198 229	
TOP-4.2.1-16	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	9	925 969 264,00 Ft	7	830 969 264	7	830 969 264	7	830 969 264	830 907 178	
TOP-4.2		28	2 426 063 387,00 Ft	19	1 746 670 481	19	1 746 670 481	19	1 746 670 481	1 744 105 407	1 343 000 000
TOP-4.3.1-15	Leromlott városi területek rehabilitációja	12	3 771 251 896,00 Ft	9	2 531 251 896	9	2 531 251 896	9	2 531 251 896	2 529 764 722	
TOP-4.3.1-16	Leromlott városi területek rehabilitációja	-	0,00 Ft	-	-	-	-	-	-	-	
TOP-4.3		12	3 771 251 896,00 Ft	9	2 531 251 896	9	2 531 251 896	9	2 531 251 896	2 529 764 722	1 293 000 000
TOP-5.1.1-15	Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	1	1 637 080 050,00 Ft	1	1 637 080 050	1	1 637 080 050	1	1 637 080 050	1 634 081 845	
TOP-5.1.1-16	Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	-	0,00 Ft	-	-	-	-	-	-	-	
TOP-5.1.2-15	Helyi foglalkoztatási együttműködések	-	0,00 Ft	-	-	-	-	-	-	-	
TOP-5.1.2-16	Helyi foglalkoztatási együttműködések	7	2 656 855 005,00 Ft	6	2 412 225 005	6	2 412 225 005	6	2 412 225 005	2 393 278 242	
TOP-5.1		8	4 293 935 055,00 Ft	7	4 049 305 055	7	4 049 305 055	7	4 049 305 055	4 027 360 087	3 807 000 000
TOP-5.2.1-15	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	11	943 416 343,00 Ft	11	943 416 343	11	943 416 343	9	718 416 594	935 980 843	
TOP-5.2.1-16	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	-	0,00 Ft	-	-	-	-	-	-	-	
TOP-5.2		11	943 416 343,00 Ft	11	943 416 343	11	943 416 343	9	718 416 594	935 980 843	422 000 000
TOP-5.3.1-16	A helyi identitás és kohézió erősítése	21	870 674 828,00 Ft	21	872 346 629	21	872 346 629	21	872 346 629	854 133 498	
TOP-5.3.2-17	Megyei identitás erősítése	4	1 784 638 771,00 Ft	4	1 784 638 771	4	1 784 638 771	4	1 784 638 771	1 763 790 868	
TOP-5.3		25	2 655 313 599,00 Ft	25	2 656 985 400	25	2 656 985 400	25	2 656 985 400	2 617 924 366	1 321 000 000
6-7. prioritások nélkül		638	98 722 524 626	552	88 017 670 728	552	88 017 670 728	547	87 067 781 125	87 585 706 274	63 227 000 000

7. táblázat: TOP eredmények felhívásonként

4. A támogatott projektek megvalósulása

A támogatott projektek teljes listáját (6-7. prioritások nélkül) az 1. számú melléklet tartalmazza.

A projektek **55 %-a városi és 45 %-a községi települések** között oszlott meg, ami kedvező a területi kiegyenlítés szempontjából. Összességében elmondható, hogy a vármegye a rendelkezésre álló forrásokat hatékonyan és teljes körűen használta fel.

A települések **járások szerinti bontásában** az alábbi forrásfelhasználás történt a TOP keretében:

1. Kecskeméti járás (Kecskemét nélkül): 13,70 milliárd Ft

A járásban található települések jelentős forrásokat használtak fel, amely a vármegyei központ szerepéből és a régiós jelentőségéből adódik. Ipari és gazdasági fejlesztések, városi központok erősítése dominált.

2. Bajai járás: 12,03 milliárd Ft

Baja városa, mint térségi központ, kiemelt támogatási összeget kapott, emellett a környező települések is részesültek a forrásokból. Városi és közösségi fejlesztések, kisebb települések felzárkóztatása, szociális infrastruktúra javítása valósult meg a TOP keretében.

3. Kiskőrösi járás: 11,39 milliárd Ft

A gazdasági és turisztikai fejlesztések, valamint a helyi közösségi szolgáltatások erősítése jelentős részt képviseltek.

4. Kalocsai járás: 9,31 milliárd Ft

Kalocsa városa és a járás települései is jelentős fejlesztéseken estek át, különösen az infrastruktúra és közösségi szolgáltatások terén.

5. Kiskunhalasi járás: 7,54 milliárd Ft

A gazdasági élénkítő és közlekedési fejlesztések hangsúlyosak voltak a járásban.

6. Kiskunfélegyházi járás: 7,39 milliárd Ft

A közlekedési fejlesztések és a városi központok rehabilitációja dominált.

7. Tiszaújvárosi járás: 5,15 milliárd Ft

Kiemelt szerepet kapott a közösségi szolgáltatások és az infrastruktúra fejlesztése.

8. Bácsalmási járás: 4,78 milliárd Ft

A gazdaságélénkítés és az alacsony népességű települések fejlesztése voltak előtérben.

9. Kunszentmiklósi járás: 4,26 milliárd Ft

A foglalkoztatás növelése és a közösségi infrastruktúra fejlesztése kiemelt volt.

10. Kiskunmajsai járás: 3,73 milliárd Ft

A szociális szolgáltatások és az energetikai beruházások kaptak kiemelt figyelmet.

11. Jánoshalmi járás: 3,60 milliárd Ft

A járásban a településfejlesztés és a társadalmi együttműködés erősítése jelentős volt.

A **komplex programmal fejlesztendő járások** Bács-Kiskun vármegyében két járást érintenek: a Bácsalmási és a Jánoshalmi járást. A támogatási források elosztása mindkét járásban a térségi központok fejlesztésére és a kisebb települések felzárkóztatására irányult, azonban a forrásfelhasználás jelentős különbségeket mutatott.

A Bácsalmási járás a komplex programmal fejlesztendő járások közül a legnagyobb támogatási összeget, összesen 4,78 milliárd forintot kapott. A legtöbb forrás Bácsalmás városába került, amely 2,54 milliárd forintot használhatott fel. A fejlesztések itt elsősorban a térségi központi szerep erősítésére, a gazdasági élénkítésre és az alapvető infrastruktúra modernizálására összpontosultak. A járásban Bácsbokod kapta a második legnagyobb támogatást, 832 millió forintot, amelyet közösségi infrastruktúra és szociális szolgáltatások fejlesztésére fordítottak. Madaras településen 467 millió forintot használtak fel, főként a vidékfejlesztési programok és közösségi szolgáltatások javítására.

A kisebb települések közül Kunbaja 359 millió forintot kapott, amelyet helyi gazdaságélénkítésre és infrastrukturális beruházásokra fordítottak. Tataháza 256 millió forintos támogatást nyert el, amelyből szociális és közösségi fejlesztéseket valósítottak meg. Csikéria, Mátételke, Bácsborsód és Bácsszőlős kisebb összegű támogatásokban részesültek, jellemzően 45-109 millió forint között, amelyek kisebb közösségi projektekre és alpinfrastruktúra-fejlesztésekre irányultak. Katymár esetében nem volt nyilvántartott forrásfelhasználás.

A Jánoshalmi járásban a komplex program keretében összesen 3,60 milliárd forintot használtak fel. A legnagyobb támogatást Jánoshalma városa kapta, összesen 2,11 milliárd forintot. A fejlesztések itt a gazdaságélénkítésre, a városközpont rehabilitációjára és a közlekedési infrastruktúra korszerűsítésére összpontosultak. Mélykút városába 1,36 milliárd forint érkezett, amelyet a szociális infrastruktúra javítására és a helyi gazdaság erősítésére fordítottak.

A kisebb települések közül Borota 58 millió forintot kapott alpinfrastruktúra és közösségi tér fejlesztésére, míg Kéleshalom 38 millió forintot vidékfejlesztési beruházásokra. Rém település 30 millió forint támogatást nyert el, amelyet helyi közösségi szolgáltatások javítására használtak fel.

A **szabad vállalkozási zónák** fejlesztései Bács-Kiskun vármegyében több településen valósultak meg, amelyek fő célja a gazdasági élénkítés, a munkahelyteremtés és az alpinfrastruktúra fejlesztése volt. A támogatások jelentős része a térségi központokba áramlott, ahol a fejlesztési szükségletek és a gazdasági potenciál magasabb volt. Emellett kisebb települések is részesültek a támogatásokból, elsősorban a helyi közösségi és gazdasági infrastruktúra javítására.

A legnagyobb támogatást Bácsalmás városa kapta, összesen 2,54 milliárd forintot. A fejlesztések a város központi szerepének erősítésére, a gazdasági környezet javítására és az alpinfrastruktúra modernizálására irányultak. Hasonlóan jelentős forrást nyert el Jánoshalma, ahol 2,11 milliárd forintból valósítottak meg gazdasági élénkítést, közlekedési infrastruktúra fejlesztést és közösségi szolgáltatások bővítését. Kiskunmajsa városában szintén nagy volumenű fejlesztések történtek, összesen 2,08 milliárd forintból, amelyet elsősorban közlekedési és gazdasági infrastruktúra fejlesztésére fordítottak, valamint közösségi terek modernizálására.

Mélykút városában 1,36 milliárd forintból valósították meg a szociális infrastruktúra fejlesztését és a helyi gazdaság erősítését. Kunszentmiklós városa 1,22 milliárd forint támogatást kapott, amelyet városi infrastruktúra fejlesztésére és gazdasági környezet javítására fordítottak.

A közepes támogatási kategóriába tartozó települések között található Bácsbokod, amely 832 millió forintot nyert el közösségi infrastruktúra és szociális fejlesztések megvalósítására. Szabadszállás 789 millió forintból gazdaságfejlesztési projekteket és közösségi terek modernizálását valósította meg. Dunavecse 784 millió forintos támogatása főként közlekedési és közösségi infrastruktúra fejlesztésére irányult, míg Tompa 781 millió forintból gazdasági és közösségi infrastruktúrát fejlesztett.

A kisebb települések is részesültek a szabad vállalkozási zónák támogatásaiból. Akasztó 474 millió forintból helyi gazdasági infrastruktúrát fejlesztett, míg Madaras 467 millió forintot fordított vidékfejlesztési programokra és közösségi szolgáltatásokra. Kisszállás 466 millió forint támogatást nyert településfejlesztésre és alpinfrastruktúra modernizálására. Jászszenlázsló 439 millió forintot kapott vidékfejlesztési és közösségi projektekre, Csólyospálos pedig 307 millió forintot alpinfrastruktúra és közösségi fejlesztésekre.

A támogatások kisebb összegekben, de további településekre is eljutottak. Apostag 405 millió forintot kapott településfejlesztésre, Kunbaja 359 millió forintot helyi gazdaságélénkítésre, Kunfehértó 310 millió forintot vidékfejlesztésre és közösségi szolgáltatásokra. Kéleshalom és Rém települések 38 és 30 millió forintos támogatása főként kisebb közösségi projektek megvalósítását segítette elő.

Érdemes megemlíteni, hogy Katymár esetében, bár szabad vállalkozási zónának minősül, nem volt nyilvántartott fejlesztési forrás felhasználás.

A szabad vállalkozási zóna települések felhasznált TOP forrásait a 8. számú táblázat teljességében tartalmazza.

A szabad vállalkozási zónák keretében a legtöbb támogatást a térségi központi szereppel rendelkező városok kapták, amelyeknél a gazdasági infrastruktúra fejlesztése és a közösségi szolgáltatások bővítése állt a középpontban. A kisebb települések esetében az alapinfrastruktúra javítása és a helyi közösségi projektek megvalósítása volt a fő cél. A támogatások mértéke jelentősen különbözik a városok és a kisebb községek között, jól tükrözve a települések gazdasági potenciálját és fejlesztési szükségleteit.

Település	felhasznált forrás (Ft)	Település	felhasznált forrás (Ft)
Rém	30 200 530	Kisszállás	466 995 626
Kéleshalom	38 106 681	Madaras	467 048 120
Bácsszőlős	45 956 424	Akasztó	473 970 249
Borota	58 310 689	Szalkszentmárton	496 629 342
Bácsborsód	76 612 830	Szank	693 345 062
Tass	79 061 007	Kelebia	708 072 236
Mátételke	91 297 486	Tompa	781 396 965
Csikéria	109 020 892	Dunavecse	784 532 431
Kunpeszér	111 984 677	Szabadszállás	789 936 053
Kömpöc	155 049 100	Bácsbokod	832 861 530
Dunaegyháza	172 859 425	Kunszentmiklós	1 225 787 179
Kunadacs	201 221 152	Mélykút	1 362 853 424
Tataháza	256 157 358	Kiskunmajsa	2 081 406 301
Csólóspálos	307 429 484	Jánoshalma	2 111 628 974
Kunfehértó	310 735 585	Bácsalmás	2 544 192 758
Kunbaja	359 585 702	Katymár	-
Apostag	405 472 056		
Jászszentlászló	439 684 643		

8. táblázat: Szabad vállalkozási zóna TOP forrásfelhasználása

A vármegye kiemelt fejlesztési célterületén felhasznált fejlesztési forrás: A két földrajzi célterületre (komplex programmal fejlesztendő járások és szabad vállalkozási zóna település) a mindenki által pályázható kereten felül további 4,755 milliárd Ft támogatási keretet dedikált a vármegyei ITP, és amelyet a két földrajzi területen belül tovább nem osztottunk meg. A földrajzi célterületeken az elsődleges cél a gazdaságfejlesztés kiemelt segítése volt, így a javasolt külön keret a gazdaságfejlesztéssel összefüggő intézkedéseknél jelent meg. 4 milliárd Ft ERFA (1.1. intézkedés 1 Mrd

Ft, 1.2. intézkedés 1,5 Mrd Ft, 1.3. intézkedés 1,5 Mrd Ft), valamint 0,755 milliárd Ft ESZA típusú támogatás (5.1. foglalkoztatási együttműködés) hasznosult erre a célra, ezen a két földrajzi célterületen.

A TOP keretében az Önkormányzat **saját projekteket** is megvalósíthatott **vármegyei önkormányzat saját projektjei ffm-ben**, melyeket a 9. számú táblázat mutat be. A tervezett 1,557 milliárd forint csaknem dupláját használhatta fel az Önkormányzat projektjei megvalósítására, melynek oka az volt, hogy

- az elsősorban az 5. prioritáson más vármegyék megmaradó forrásaihoz hozzáfért az operatív program zárásának végén.
- új forrásként jelent meg A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése című felhívás.

Felhívás	Fő megvalósítási helyszín város	TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZÁMA	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	Elszámolás (Ft)
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Baja	TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041	BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	68 066 884
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	Ballószög	TOP-1.1.1-16-BK2-2020-00001	BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumban	470 684 263
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Kecskemét	TOP-1.2.1-16-BK2-2019-00004	BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA konzorciumban	102 150 632
A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése	Kecskemét	TOP-1.5.1-20-2020-00018	BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA konzorciumban	269 951 974
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Kecskemét	TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00044	BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	39 998 243
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Kecskemét	TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001	BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA konzorciumban	69 999 937
Megyei identitás erősítése	Kecskemét	TOP-5.3.2-17-BK1-2018-00001	BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	338 219 161
Megyei identitás erősítése	Kecskemét	TOP-5.3.2-17-BK1-2019-00002	BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	344 000 000
Megyei identitás erősítése	Kecskemét	TOP-5.3.2-17-BK1-2020-00003	BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA konzorciumban	415 990 217

Felhívás	Fő megvalósítási helyszín város	TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZÁMA	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	Elszámolás (Ft)
Megyei identitás erősítése	Kecskemét	TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004	BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA konzorciumban	665 581 490
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Kelebia	TOP-1.2.1-16-BK2-2017-00001	BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA konzorciumban	199 954 821
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Nemesnádudvar	TOP-1.2.1-16-BK2-2019-00005	BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA konzorciumban	80 892 599
Összesen				3 065 490 221

9. táblázat: TOP keretében megvalósított saját projektek

A vármegye kiemelt fejlesztési céljaira fordított keret: A vármegyei ITP-ben „A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” intézkedésre 1,462 milliárd Ft kerül átcsoportosításra, kiemelt fejlesztési cél megvalósítására. Összhangban a TOP módosításával, a többletforrást új bölcsődei férőhelyek kialakítására fordítottuk a teljes összeget.

Kiemelt kedvezményezett csoportra vonatkozó keretet kizárólag a TOP-5.1.1. felhívásra határozott meg a vármegyei ITP. Ennek a felhívásnak az Önkormányzat volt a kiemelt kedvezményezettje a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatallal konzorciumban. Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések felhívás keretében 1,638 milliárd Ft-ot használtak fel a kedvezményezettek, pont a tervezet keret erejéig.

Amennyiben intézkedésenként vizsgáljuk a támogatási igényeket, a következő megállapítások tehetők.

1. Benyújtott projektek száma és támogatási igények

- A legtöbb benyújtott projekt az **önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése** (TOP-3.2.1) felhívásra érkezett, összesen **149 projekt**, amely jelentős igénybevételt mutat az energetikai fejlesztések iránt.
- Az **óvodai és bölcsődei fejlesztések** (TOP-1.4.1) felhívásaira **107 támogatási kérelem** érkezett.
- A második legtöbb projekt a **települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések** (TOP-2.1.3) felhívásra érkezett, összesen **98 projekt**. Ez is arra utal, hogy az infrastruktúra és környezetvédelem fejlesztése kiemelt prioritás volt.
- **Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztés** (TOP-4.1.1) felhívásra érkezett **47 kérelem** érkezett be.
- A **fenntartható települési közlekedésfejlesztés** (TOP-3.1.1) felhívás szintén sok projektet vonzott, **40 benyújtott pályázattal**.

2. Támogatott projektek száma és összeg

- Az energetikai korszerűsítési projektek (TOP-3.2.1-16) közül **85 projekt** kapott támogatást, amely a benyújtott pályázatok mintegy 83%-a, összesen **7,2 milliárd Ft** értékben.
- A környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztéseknél (TOP-2.1.3-16) **56 projekt** részesült támogatásban, összesen **7,4 milliárd Ft** értékben.

- A fenntartható közlekedésfejlesztési projektek közül **28 projekt** kapott támogatást, **4,1 milliárd Ft** összeggel.

3. Támogatási intenzitás és sikeresség

- A **helyi gazdaságfejlesztési projektek** (TOP-1.1.3-16) esetében mind a **9 benyújtott projekt támogatásban részesült**, ami azt jelzi, hogy ebben a kategóriában viszonylag könnyebb volt sikeresen pályázni.
- Az **ipari parkok fejlesztése** (TOP-1.1.1-15 és TOP-1.1.1-16) esetében az igényelt és elnyert támogatások között alig volt különbség, ami azt mutatja, hogy az ipari fejlesztések különösen preferáltak voltak.

4. Legnagyobb támogatási igény és túligény

- Az **ipari parkok fejlesztése (TOP-1.1.1-16)** felhívás esetében volt a legnagyobb támogatási igény, összesen **8,39 milliárd Ft**, amelyből **8,23 milliárd Ft** lett támogatott.
- A **települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések (TOP-2.1.3-16)** felhívás esetében szintén magas volt az igény, **7,9 milliárd Ft**, amelyből **7,4 milliárd Ft** lett támogatott.

5. Zárt és lezárt projektek

- A legtöbb lezárt projekt az **önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése** (TOP-3.2.1-16) felhívás esetében volt, ahol **85 projektből mind a 85 lezárt**.
- A **fenntartható települési közlekedésfejlesztés** (TOP-3.1.1-16) projektjei közül is **28 zárt projekt** van, ami a támogatottak teljes számával megegyezik, tehát ezek a projektek hatékonyan megvalósultak.

Az adatokból jól látható, hogy a fejlesztési források elosztása a társadalmi, gazdasági és demográfiai kihívások alapján történt. A támogatások növekedése a fejlesztendő járások és a szociálisan hátrányos helyzetű települések irányába mutatja a kiegyenlítési törekvéseket. A nagyvárosok térségi központi szerepe továbbra is domináns, de a kis- és aprófalvak helyzetének javítása alapvető fontosságú a vármegye kiegyensúlyozott fejlődése érdekében.

5. Indikátorok teljesítése

A vármegyei ITP keretében támogatott projektek döntő többsége megvalósult a periódus végéig. A projektek a gazdaságfejlesztéstől az infrastruktúrán át a humán fejlesztésekig széles kört lefedtek. A vármegyei ITP-ben meghatározott **kimeneti indikátorok** túlnyomórészt teljesültek vagy teljesülésközeleli állapotba jutottak 2020-ra (a projektek pénzügyi zárásával 2022–2023-ban). A vármegye által vállalt indikátorcélok a TOP forrásarányos célértékeihez igazodtak.

indikátor	indikátor azonosító	terv adat	mennyiségi egység	tény adat	eltérés
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	CO01	0	Darab	0,00	0,00
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	CO02	0	Darab	0,00	0,00
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	CO04	0	Darab	0,00	0,00
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	CO09	0	fő/év	0,00	0,00
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	CO09	0	látogatás/ év	0,00	0,00
Közutak: az újonnan épített közutak teljes hossza	CO13	0	Kilométer	0,00	0
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza	CO14	27,64	Kilométer	0,00	-27,64
A rehabilitált talaj összterjedése	CO22	0	ha	0,00	0,00
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	CO30	0	kW	0,00	0,00
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	CO32	0	kWh/év	0,00	0,00
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	CO34	0	tonna	0,00	0,00
Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése (t/év)		0	t/év	0,00	0,00
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése		9039,49	CO ₂ egyenérték (t)	0,00	-9 039,49
Egészségügy: jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	CO36	0	Fő	423 106,00	423 106,00
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)	CO37	0	Fő	628 358,00	628 358,00
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	CO38	103806, 20	m ²	680 682,44	576 876,24
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)	CO39	0	m ²	52 426,10	52 426,10
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)	CO40	73,00	lakóegység	230,00	157,00

indikátor	indikátor azonosító	terv adat	mennyiségi egység	tény adat	eltérés
A jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek száma az akcióterületen		0	Fő	12 322,00	12 322,00
A jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek száma az akcióterületen (nő)		0	Fő	5 290,00	5 290,00
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma		0	Darab	92,00	92,00
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe		111,32	ha	1 428,43	1 317,11
A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma		0,00	Fő	4 544,00	4 544,00
A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma (nő)		0	Fő	5 828,00	5 828,00
A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma		0	Fő	3 078,00	3 078,00
A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma (nő)		2544,00	Fő	8 004,00	5 460,00
A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma		0,00	Fő	4 186,00	4 186,00
A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma (nő)		0	Fő	61 502,00	61 502,00
A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma		0	Fő	30 360,00	30 360,00
A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma (nő)		0	Fő	0,00	0,00
A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partnerek vagy nem önkormányzati szervezetek által a HFS keretében tervezett és végrehajtott programok száma		0	Darab	0,00	0,00
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)		0	GJ/év	1 512,49	1 512,49
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)		0	PJ/év	518 365,02	518 365,02
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza		0	m	198 673,68	198 673,68
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)		0	GJ/év	0,05	0,05
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)		91,00	PJ/év	360,00	269,00
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos,		1090,00	Darab	3 278,00	2 188,00

indikátor	indikátor azonosító	terv adat	mennyiségi egység	tény adat	eltérés
fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma					
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma		0,00	Darab	6 548,00	6 548,00
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma		11922	Darab	1 689 700,00	1 677 778,40
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma		0	Fő	806 740,00	806 740,00
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (nő)		43,24	Fő	180,63	137,39
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza		0,00	Kilométer	60,00	60,00
Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma		0	Darab	22,00	22,00
Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma		0	Darab	36,00	36,00
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma		0	Darab	518 148,00	518 148,00
Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési stratégiával érintett települések lakosság száma		0	Fő	262 022,03	262 022,03
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága		0	m2	20 494,00	20 494,00
Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma		0	Fő	11 286,00	11 286,00
Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma		0	Fő	4 152,00	4 152,00
Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma (nő)		0	Fő	334,00	334,00
Újonnan épített vagy felújított rendelő, tanácsadók száma		0	Darab	1 794,00	1 794,00
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma		0	Darab	320,00	320,00
Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma		0	Darab	0	0

10. táblázat: Tervezett és teljesített indikátorok

Jelentős pozitív eltérések a tervekhez képest:

- **Egészségügy: jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság (CO36):** A tervben nem szerepelt konkrét célérték, mégis **423 106 fő** részesült jobb egészségügyi ellátásban.
- **Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37):** A ténylegesen elért eredmény **628 358 fő**, amely szintén tervérték nélküli, de jelentős eredményt mutat.
- **Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38):** Az eredmény **680 682 m²**, amely jóval meghaladja a 103 806 m²-es tervértéket.
- **Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39):** A tervérték nélküli mutató esetében **52 426 m²** került felújításra vagy építésre.

- **Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40):** A tervben **73 lakóegység** szerepelt, míg a valóságban **230 lakóegység** valósult meg, ami **157 lakóegységgel több** a tervezettnél.
- **Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma:** **6 548 férőhely** jött létre, ami megfelel a tervnek.
- **Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma:** A terv nélkül **1 794 rendelő vagy tanácsadó** épült vagy újult meg.
- **Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza:** **60 km** új kerékpárút jött létre, amely teljesen megfelel a célkitűzésnek.
- **A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év):** A tervben nem szerepelt, de ténylegesen **1 512,49 GJ/év** energiát állítottak elő megújuló forrásból.
- **Bel- és csapadékvédelmi létesítmények hossza:** **198 673,68 m**, amely jelentős eredmény a terv nélküli mutatók között.
- **Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év):** A terv **91 PJ/év** volt, de a tényleges teljesítés **360 PJ/év**, ami **269 PJ/év** túlteljesítést jelent.
- **Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok száma:** A tervben **1 090** szolgálat szerepelt, de a valóságban **3 278** szolgálat valósult meg, ami jelentős pozitív eltérést mutat.
- **A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a nők száma** **5 828 fő**, ami meghaladja a tervezett **2 544 főt**.
- **A helyi társadalmi akciókban résztvevők száma** **806 740 fő**, ami rendkívül magas a terv nélküli mutatók között.
- **Szociális városrehabilitációval elért lakosság száma:** **11 286 fő**, ami jelentős eredmény.
- **Szociális városrehabilitációval elért hátrányos helyzetű lakosság száma:** **4 152 fő**, amely szintén magas eredmény.

Jelentős negatív eltérések a tervekhez képest:

- **Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO34):** A tervben **9 039,49 CO2 egyenérték (t)** szerepelt, de a tényleges eredmény **0**, ami jelentős elmaradást mutat.
- **Fenntartható közlekedési infrastruktúra (CO13):** A tervben **27,64 km** új közút szerepelt, de a tényleges érték **0 km**, ami súlyos elmaradást jelez.

Az adatokból kiderül, hogy számos mutató esetében a tényleges teljesítmény jelentősen meghaladta a tervértékeket, különösen az egészségügyi ellátás és a foglalkoztatási paktumok terén. Ugyanakkor a közlekedési infrastruktúra és az üvegházhatású gázok csökkentése területén elmaradás figyelhető meg, feltehetően adatszolgáltatás hiány miatt. A kerékpárút fejlesztés, a zöldfelületek kialakítása és a társadalmi akciókban való részvétel terén szintén pozitív eredmények születtek. Összességében az indikátorok alapján a társadalmi és egészségügyi fejlesztések sikeresnek bizonyultak, míg az energetikai és közlekedési projektek eredményei nem minden esetben feleltek meg az előzetes várakozásoknak.

6. Társadalmi, környezeti és gazdasági hatások értékelése

A Bács-Kiskun vármegyei gazdasági, társadalmi és környezeti hatások mérését egyrészt az operatív program indikátorrendszere, másrészt külső statisztikák és elemzések biztosítják. A támogatott projektek esetében már a tervezéskor meghatároztuk az elérni kívánt eredmény- és output indikátorokat, amelyek nyomon követése a projektzárásig tartott (lásd 7. táblázat). Az indikátorok között nemcsak fizikai outputok szerepeltek, hanem **eredményindikátorok is**, melyek a fejlesztések **társadalmi-gazdasági hatásait** igyekeztek megragadni. Az Önkormányzat és az IH rendszeres monitoring adatokkal követték a megvalósulást. 2018-ban – az OP félidőben – mérőföldkő értékelés történt az indikátorokról, majd a ciklus végén záró értékeléseket készítettek (mint például: **Helyi életminőség értékelés II. fázis_ Záró értékelési jelentés**).

A **Helyi életminőség értékelés II. fázis_ Záró értékelési jelentés** célja a TOP keretében megvalósult fejlesztések hatásának vizsgálata volt, különösen a lakosság életminőségének javítására irányuló projektek esetében. A fejlesztéspolitikai célok középpontjában a helyi környezet minőségének növelése és a közszolgáltatások fejlesztése állt, kiemelten kezelve a 2. és 6. prioritásokhoz kapcsolódó beruházásokat.

Az értékelés során megállapították, hogy a projektek jelentős mértékben hozzájárultak a települési környezet javításához, különösen a zöldterületi fejlesztések révén. A közparkok, közkertek, játszóterek és rekreációs terek kialakítása, valamint felújítása pozitívan hatott a lakókörnyezet élhetőségére. A beruházások elősegítették a közösségi élet fellendülését, és számos esetben új találkozási pontokat teremtettek a helyi lakosság számára. Az infrastruktúra-fejlesztések növelték a települések vonzerejét, és hosszú távon hozzájárultak a lakosság megtartásához.

A projektek sikeressége ugyanakkor vegyes képet mutatott. A fejlesztések hatása nem egyenletesen érvényesült, mivel az infrastruktúra-fejlesztések gyakran csak bizonyos társadalmi csoportokat értek el, például gyermekeket, időseket vagy sportolni vágyókat. A kisebb településeken, ahol a közösségi terek száma korlátozott, a beruházások pozitív hatása kifejezettebb volt, míg a nagyobb városokban a projektek hatása szórtabb. A település mérete és a lakosság összetétele szintén befolyásolta az eredményességet.

Az életminőség szubjektív megítélése sokszor eltérő volt az egyes településeken, ami részben a beruházások típusára, részben pedig a közösségi igények különbözőségére vezethető vissza. A közösségi részvétel fontossága kiemelt szerepet kapott: azokban a projektekben, ahol a lakosság bevonása nagyobb volt, tartósabb eredményeket értek el. A fenntarthatóság biztosítása komoly kihívást jelentett, különösen a zöldfelületek karbantartása terén.

A jelentés ajánlásai között szerepel a közösségi részvétel erősítése és a lakosság rendszeres tájékoztatása a projektek céljairól, valamint az eredmények monitorozása. Fontos továbbá az önkormányzatok kapacitásainak fejlesztése a projektmenedzsment területén, különös tekintettel a fenntartási feladatokra. A fejlesztések hosszú távú sikerének alapja a helyi közösségek aktív szerepvállalása és az önkormányzati struktúra alkalmazkodóképessége a változó helyi igényekhez.

Emellett a **T-MER** adatait és a területi statisztikáit is felhasználtuk a tágabb hatások értékeléséhez (pl. foglalkoztatási ráta, GDP, népességváltozás); a Bács-Kiskun vármegyei monitoring értékelések 2023. és 2024. évekre elkészültek. A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2024. évi területfejlesztési és monitoring beszámolója, valamint a vármegyei területrendezési terv érvényesülésének értékelése című

dokumentum, melyet a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés 5/2025. (II.28.) határozatával fogadott el, részletesen tartalmazza a vármegye gazdasági, társadalmi és környezeti változásait, ezért jelen dokumentumban csak azokat a folyamatokat és változásokat, amelyekben a TOP programok hatása felismerhető vagy feltételezhető.

6.1. Gazdasági hatások

Bács-Kiskun vármegye gazdasági mutatói az elmúlt években látványos fejlődést mutattak, amelyben a TOP által finanszírozott projektek jelentős szerepet játszottak.

Bács-Kiskun vármegyében a **bruttó hazai termék** (továbbiakban GDP) folyamatos növekedést mutatott a 2016-2021 közötti időszakban. Az egy lakosra jutó GDP 2 851 ezer Ft-ról 4 399 ezer Ft-ra nőtt, ami másfélszeres emelkedést jelent. A vármegye GDP-je az egy főre vetítve országos rangsorban a 6. helyre jött fel, ami kiemelkedő növekedést tükröz. Ezt részben a magánszektorbeli beruházások (pl. kecskeméti autóipar) generálták, de a TOP által támogatott ipari park fejlesztések, út- és közműfejlesztések is hozzájárultak a befektetői környezet javulásához. A TOP források hozzájárultak a helyi gazdasági környezet javításához, amely ösztönözte a vállalkozások létrejöttét és növekedését.

A gazdasági termelés stabilitását mutatja, hogy a **működő vállalkozások száma** nem csökkent egyik ágazatban sem, különösen a közepes méretű (50-249 fős) vállalkozások esetében, ami a TOP forrásokkal támogatott helyi gazdaságfejlesztési projektek sikerességét igazolja.

Az iparterületek fejlesztése és az infrastruktúra bővítése pozitív hatást gyakorolt a foglalkoztatásra és a beruházási kedvre, különösen a helyi gazdasági infrastruktúra és az ipari parkok kialakítása révén.

A **vármegye munkanélküliségi rátája** 2016–2019 között meredeken csökkent, 2019 közepére 2,5%-ra esett vissza (szemben az országos 3,3%-kal). Ez azt mutatja, hogy a javuló gazdasági környezetben – amihez a TOP projektek is hozzájárultak – nőtt a foglalkoztatás. Ugyan 2020 elején a pandémia némileg rontotta a munkaerőpiaci mutatókat, a TOP-ból finanszírozott foglalkoztatási programok épp ezekre a helyzetekre kínáltak megoldást, átmenetileg enyhítve a munkanélküliséget. A helyi gazdaságfejlesztési projektek (vállalkozói telephelyek, turizmus, energetika) hosszabb távon is növelik a vármegye versenyképességét, a trendek már pozitívak a 2014–2020-as beavatkozások nyomán.

6.2. Társadalmi hatások

A TOP támogatásai jelentős hatást gyakoroltak Bács-Kiskun vármegye társadalmi folyamataira az elmúlt években.

A **népességfogyás** üteme 2010-es években a Dél-Alföld régióban Bács-Kiskunban volt a legmérsékeltebb. 2011 és 2019 között kb. 16 ezer fővel csökkent a vármegye lakossága (520 ezerről 504 ezerre), ám arányaiban ez kisebb visszaesés, mint a szomszédos vármegyéknél. Ebben szerepet játszhatott, hogy a vármegye fejlesztései javították az életminőséget számos településen, így némileg fékeztek az elvándorlást.

A társadalmi folyamatok vizsgálatakor a demográfiai mutatók **enyhe előregedést** jeleznek: az állandó népesség csökkenő tendenciát mutatott, míg a 65 év feletti népesség aránya 18,5%-ról 21%-ra nőtt 2016 és 2023 között. A fiatalok helyben tartását célzó fejlesztések, különösen a családbarát intézmények fejlesztése, csak részben tudták ellensúlyozni a népességfogyást.

A TOP fejlesztések célja a népességmegtartó képesség növelése volt, különösen a közszolgáltatások fejlesztésével (pl. egészségügyi és oktatási infrastruktúra). Az előregedő népesség kihívásaira az egészségügyi ellátások bővítése, a szociális alapszolgáltatások fejlesztése és az idősek számára nyújtott közösségi szolgáltatások kínáltak választ.

A foglalkoztatási ráta 15-64 évesek esetében 65,8%-ról 72,85%-ra nőtt. A hosszú távú munkanélküliség (180 napon túli) aránya enyhén csökkent, de továbbra is 50% körüli. A 25 év alatti álláskereső aránya felére csökkent (18,1%-ról 9,7%-ra), míg a 45 év feletti álláskereső aránya nőtt (42,4%-ról 57,6%-ra). A TOP foglalkoztatási paktumokkal támogatta a munkaerőpiacra való visszavezetést. A foglalkoztatási paktumok eredményeként a támogatott programokban részt vevő hátrányos helyzetű lakosok száma növekedett, és az állásban maradás aránya is javult. Az idősek és alacsony végzettségűek számára további programokra lenne szükség a tartós foglalkoztatás eléréséhez.

A TOP keretében megvalósult **oktatási, szociális és egészségügyi fejlesztések** (óvodák, iskolák, egészségházak felújítása, szociális programok) hozzájárultak a helyi közszolgáltatások színvonal-emelkedéséhez. A bölcsődébe íratott gyermekek száma növekedett (13,08-ról 16,23-ra), ami a bölcsődei férőhelyek bővítésére utal. Az óvodai beíratások száma viszont csökkent, ami a demográfiai változásokra vezethető vissza. Az egy orvosra jutó lakosok száma enyhén növekedett, ami az orvoshiányra utal. Az alapszolgáltatások fejlesztése hozzájárult a gyermekellátás javításához és az egészségügyi infrastruktúra modernizálásához. Az egészségügyi fejlesztések révén nőtt a szolgáltatások elérhetősége és minősége, ami az idősek ellátásában különösen fontos.

A pandémia miatt 2020-ban visszaesett a múzeumi látogatók száma, de 2023-ra a látogatottság visszaállt a korábbi szintre. A közösségi és művelődési programok iránti kereslet növekedett 2021 után, ami az igények helyreállítását jelzi. A **társadalmi kohézió** erősödését jelzi, hogy számos közösségi kezdeményezés indult a TOP támogatásával (kulturális rendezvények, helyi klubok, közösségi terek kialakítása), melyek növelték a lakossági aktivitást. A kulturális infrastruktúra fejlesztése és a közösségi terek modernizálása támogatta a társadalmi kohéziót és a közösségi élet újraindulását. Az érintett csoportok társadalmi integrációját célzó projektek segítették a közösségi összefogás erősítését. A civil szervezetek támogatása hozzájárult a közösségi aktivitás fenntartásához.

6.3. Környezeti hatások

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése jelentős eredményeket hozott a közúti közlekedésbiztonság terén, különösen a körforgalmak és kerékpárforgalmi létesítmények kialakításával, amelyek hozzájárultak a baleseti statisztikák javulásához. A gyorsforgalmi út csomópont elérési ideje 2016-ban 29,24 perc volt, amely 2022-re 27,88 percre csökkent, jelezve a közlekedési infrastruktúra javulását. A vármegyeszékhely elérési ideje szintén javult (68,25 percről 66,75 percre). Az útfejlesztési TOP projektek célja a közlekedési elérhetőség javítása és a települések összeköttetésének fejlesztése volt. A gyorsforgalmi úthoz való hozzáférés javítása, valamint a forgalomcsillapító beruházások a közlekedési idő csökkenéséhez vezettek. A közlekedési infrastruktúra bővítése hozzájárult a mobilitás növekedéséhez, ugyanakkor a személygépkocsi-állomány növekedése (A személygépkocsi-állomány folyamatosan bővült, 1000 lakosra vetítve 2016-ban 363,5-ről 2023-ra 473,7-re nőtt, ami 30,3%-os növekedést jelent.) kihívást jelent a forgalomszabályozás és a környezetterhelés szempontjából.

A környezetterhelés csökkentésére irányuló fejlesztések révén a fenntartható városi közlekedés bővült, és az energiahatékonysági beruházások csökkentették az üvegházhatású gázok kibocsátását.

A rendelkezésre álló adatok alapján Bács-Kiskunban a 2014–2020-as fejlesztések kézzelfogható gazdasági növekedést és társadalmi jóléti javulást eredményeztek, bár a mélyebb strukturális kihívások (népességfogyás, egyes periférikus térségek lemaradása) természetesen nem oldódtak meg teljesen. A hatások nyomon követése mindazonáltal folytatódik: a vármegye 2030-ig szóló stratégiája rendszeresen monitorozza a kulcsmutatók alakulását, hogy a fejlesztéspolitika szükség esetén korrigálhasson.

7. Összehasonlítás más vármegyékkel – kontextus

7.1. ITP módszertan

Az ITP eredményeinek értékelését „Az Integrált Területi Programok eredményeinek értékelése 2014-2020 Záró értékelési jelentés” című dokumentum tartalmazza, amely a 2014-2020-as időszakban több szinten és aspektusban vizsgálta a területi programozási eszközök hatékonyságát és eredményességét. Az értékelés célja az volt, hogy bemutassa az ITP-k hatását a területi szereplők által kitűzött fejlesztési célok megvalósítására, valamint ajánlásokat fogalmazzon meg a következő programozási ciklusra vonatkozóan. A dokumentum a következő **főbb megállapításokat és következtetéseket teszi:**

- Az ITP, mint területi programozási eszköz, célja a területi egyenlőtlenségek mérséklése volt, melyet sajátos módszertani eszközeivel támogatott. A 2014-2020 közötti időszakban az ITP végrehajtás során **jelentős tapasztalatok** halmozódtak fel, amelyek alapvetően befolyásolták a 2021-2027-es ITP-k tervezését és végrehajtási stratégiáját.
- Az ITP végrehajtása során gyakori **probléma** volt az ügyintézési folyamatok elhúzódása, melyet a közreműködő szervezetek, a helyi önkormányzatok és az IH közötti koordináció hiányosságai okoztak. A program során a menedzsment kapacitások elégtelenek voltak, különösen a szakértői stáb hiánya és az ügyintézők fluktuációja miatt.
- Az ITP-k megvalósítása során a területi szereplők **nem minden esetben tudták hatékonyan alkalmazni a területi fejlesztési célokhoz szükséges módszertani eszközöket**. A stratégiai ciklusok követése, a monitoring és a visszacsatolás rendszere több esetben hiányos volt, ami gátolta a program hatékony végrehajtását.
- Az értékelés rávilágított arra, hogy a források felhasználása területenként jelentősen eltért. A hátrányos helyzetű és fejlettebb területek közötti különbségek mérséklése érdekében a jövőben **nagyobb figyelmet kell fordítani a komplex programok keretében fejlesztendő járások támogatására**. A 2021-2027-es ITP-k esetében különösen fontos a források arányos elosztása és a hátrányos helyzetű térségek fejlesztésének előtérbe helyezése.
- A jövőben a területi szereplők számára **biztosítani kell az ITP végrehajtásához szükséges erőforrásokat és szakértői támogatást**. Fontos a helyi szereplők felkészítése a projektvégrehajtásra, amelyet képzések és mentori programok révén lehetne erősíteni.
- Az ITP végrehajtásának hatékonyságát növelhetné a tematikusan és területileg **integrált beavatkozások arányának növelése**, valamint a konzorciumi partnerségek szélesebb körű alkalmazása.

Bács-Kiskun vármegye ITP-végrehajtása országos viszonylatban is kimagasló eredményeket mutatott. Mint említettük, **egyedüli vármegyeként sikerült szinte minden települést bevonni a fejlesztésekbe**,

szemben néhány más térséggel, ahol a parányi falvak egy része kimaradt a támogatásokból (pl. Baranyában az <500 fős falvak jelentős hányada továbbra sem jutott EU-s fejlesztéshez). Bács-Kiskun a TOP-keret több mint 100%-át felhasználta, míg voltak vármegyék, ahol nem merült ki teljesen a keret vagy lassabb volt a projektek előrehaladása. Ez azt is jelenti, hogy a Bács-Kiskun vármegyei ITP nem csak a tervezést, hanem a lebonyolítást is támogató „élő” dokumentummá tudott válni, és nem maradt el az ITP valódi stratégiai értelmezése, mint számos vármegyében. Ebből eredően a tervezés és végrehajtás cikluselemek megvalósultak, ugyanúgy, ahogy a folyamatos végrehajtás monitoring, szakaszos értékelés és a visszacsatolás lépései is. Ennek következménye, hogy a pénzügyi keret felhasználását illető hatékonyság (azaz a leszerződött és előlegként kifizetett támogatások valós számlával lefedett felhasználása) szinte nem mutatott különbségeket Bács-Kiskunban a 2014-20-as ciklus legvégén. Úgy gondoljuk ehhez **három feltétel teljesülése segített hozzá:**

- az Önkormányzat jelentős erőforrást rendelt a TOP vármegyében jelentkező feladatainak végrehajtásához;
- rendelkezünk információval a projektekről azáltal, hogy jó többségük előkészítésében és megvalósításában részt vettünk; illetve
- az Önkormányzat ugyan nem fért hozzá a TOP projektek adatbázisához, de külön adatkérés benyújtásával az IH felé tájékoztunk az ITP forráskeretéről.

A vármegyében a sikeres végrehajtás **legfőbb kihívásai** a következők voltak:


- Gyakran rendkívül hosszadalmas ügyintézési folyamatok jellemezték a TOP projektjeinek végrehajtását, aminek az egyes szervezeteknél különféle okokból jelentkező elnyúló ügyintézési idő és a szervezetek közötti kevésbé rugalmas feladat összehangoltság áll a háttérben.
- Az IH részéről az információátadás biztosított volt, de kevésbé nevezhető szisztematikusnak és rendszeresnek a tudásátadás. Kevésbé volt lehetőségünk szervezett keretek között tapasztalataink megosztására.
- A területfejlesztési és az ITP-hez kapcsolódó feladatok túlnyomó többségében finanszírozás nélküliek, azok költségeit túlnyomó többségben projektek menedzsment tételeiből és saját projektekből lehetett finanszírozni.

Az ITP-k országos értékelése rámutatott, hogy bár a program célja a területi egyenlőtlenségek mérséklése volt, a végrehajtás során számos adminisztratív és szervezeti akadály jelentkezett. A forrásfelhasználás területi különbségei továbbra is jelentősek maradtak, ezért a **következő időszakra több javaslatot is megfogalmazott**. Szükséges a komplex programok célzottabb támogatása és az ügyintézési folyamatok hatékonyabbá tétele. Az ITP-k sikeréhez elengedhetetlen a területi szereplők kapacitásának fejlesztése és a koordináció erősítése, a vármegyék szerepkörének kibővítése az ITP forráskeret felhasználásának követését és menedzsmentjét illetően. Ennek érdekében jogkört és forrásokat kell biztosítani a mindenkori ITP vármegyei forráskeret felhasználásának átfogó követésére és korrekciók végrehajtására (program szintű menedzsment). Javasolják a feladatkörök pontosítását a következő területeken: edukáció, adatgyűjtés, elemzés, értékelés, beavatkozási terv és annak végrehajtása. Szükségesnek tartják továbbá az ITP végrehajtás egységes elvek szerinti nyomon követését és értékelését; javasolják bevezetni az ITP forráskeret felhasználásának ütemezett eredményességi vizsgálatát legalább két mérőföldkövel: félidei értékelés és ciklus végi értékelés. Ennek nyomán javasolják, hogy a ciklus záróértékelése ágyazódjon be egy átfogó területi szemléletű támogatás értékelési rendszerbe és egyben terjedjen ki egyéb támogatási forrásokra.

7.2. Többszörös forrás bevonás

Az ITP forráskeret több tényezőnek köszönhetően jelentősen megemelkedett minden vármegye esetében, amit a kötelezettségvállalással bíró támogatások összege mutat. Az eredeti forráskerethez

viszonyított növekmény aránya az egyes vármegyék esetében eltérő volt, ami a lenti árn követhető. Arányában az eredetileg alacsony indikatív forráskerettel rendelkező vármegyék szerződött támogatási összege nőtt a legjelentősebben (140% felett). Az öt érintett vármegye egy kivételével a Dunántúlon található. Ebben a tekintetben Bács-Kiskun a mezőny hátsó felében helyezkedik el, a többletforrás bevonási képessége átlagon alul volt.

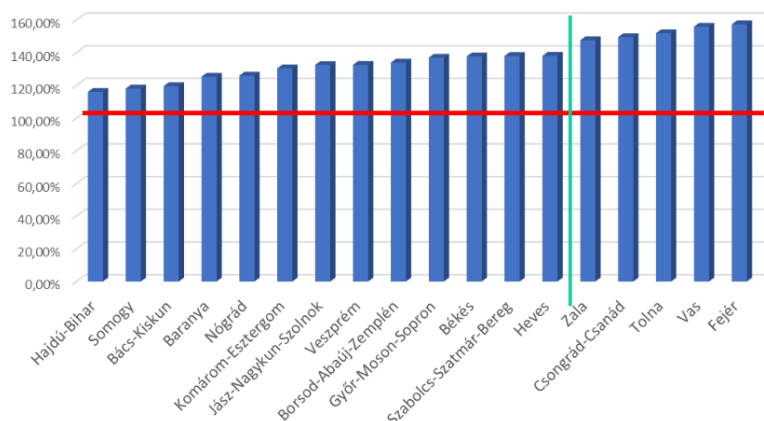

8. ábra: A kötelezettségvállalással bíró támogatások összege az indikatív forráskeret arányában (forrás: Az Integrált Területi Programok eredményeinek értékelése 2014-2020 Záró értékelési jelentés)

7.3. Abszorpció

Amikor a kifizetett támogatásokat viszonyítjuk a kötelezettségvállalással bíró támogatási összegekhez a vármegyék szintjén azt látjuk, hogy e területi szereplők eltérő szinten teljesítettek az adatkérés időpontjáig (2023 április). A vármegyék átlaga 80%-os (azaz a fejlesztések szerződött támogatási összegének 80%-a került pénzügyi teljesítésre). Az egyes vármegyék értékei - Bács-Kiskun 89% és Zala 57% - szélsőértékek között mozognak. Három vármegye teljesített 85% felett, míg a 80%-os átlag alatt kilenc vármegyét találunk.

Ennek megfelelően kijelenthető, hogy a vármegyék ITP forrásabszorpciója, elsősorban a szerződéssel lekötött, azaz kötelezettségvállalással bíró források felhasználásának műszaki és pénzügyi teljesítése eltérő hatékonysággal valósult meg a ciklus záróévére.




9. ábra: Kifizetések összegének aránya a kötelezettségvállalással bíró támogatási összeghez képest (forrás: Az Integrált Területi Programok eredményeinek értékelése 2014-2020 Záró értékelési jelentés)

7.4. Prioritások közötti eltérés és hasonlóság


A területi szereplők **forráskerete** országosan egységes arányban került felosztásra az egyes TOP prioritások és intézkedések között. Az TOP prioritások és intézkedések közötti vármegyei forrásmegoszlást a 1401/2019. (VII.5.) Korm. határozattal módosított 1612/2016. (XI.8.) Korm. határozat rögzítette. Ebben a vonatkozásban egy jelentősebb országos hatású és minden ITP forráskeretet érintő változás történt: az eredményességi tartalék átcsoportosítása. A folyamat OP és a vármegyei ITP-k módosításával járt: míg a TOP 1. prioritás (Gazdaságfejlesztés) első három intézkedésének növekedett a keretösszege, addig a többi prioritás minden intézkedése esetében egységesen csökkent.

Országos szinten aggregálva, majd arányosítva a **kötelezettségvállalással lefedett, illetve teljesített támogatási összegeket** az egyes TOP prioritások szintjén jelentős különbségeket találtunk.

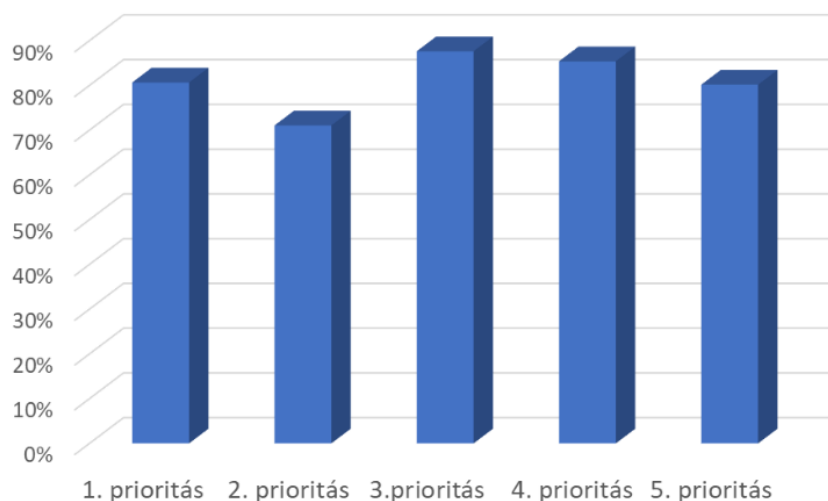

10. ábra: A pénzügyi teljesítéssel bíró projektek összesített támogatásának aránya a szerződött támogatásokhoz képest TOP prioritásonként (forrás: Az Integrált Területi Programok eredményeinek értékelése 2014-2020 Záró értékelési jelentés)


Ha területi szereplők szerint vizsgáljuk az egyes **TOP prioritások teljesülését**, jelentős eltéréseket tapasztalunk a vármegyék között, ami országos szinten némileg kiegyenlítődik. Felfedezhetők jellemző azonosságok is. Az egyes prioritások tematikája tipikus megvalósítással kapcsolatos kihívásokat jelentett a kedvezményezettek számára, így a kifizetések jellemzően nehezebben történnek meg pl. a 2. prioritás esetében szinte minden vármegyében.

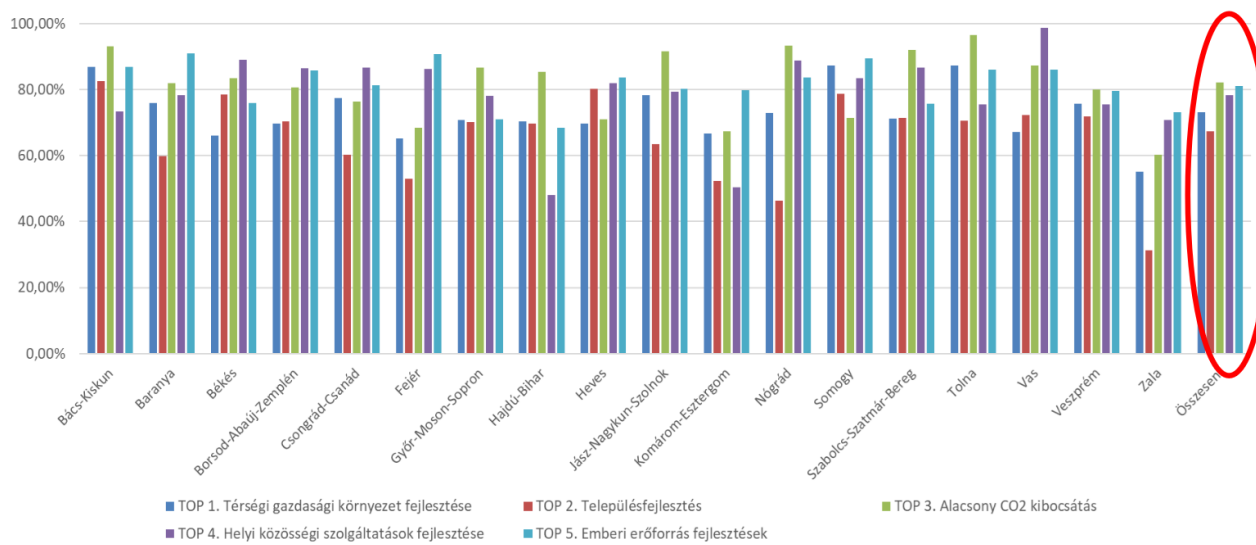

11. ábra: Teljesített támogatás aránya a kötelezettségvállalással bíró támogatások összegéhez képest TOP prioritásonként (forrás: Az Integrált Területi Programok eredményeinek értékelése 2014-2020 Záró értékelési jelentés)


7.5. Egy főre jutó támogatás

Az alábbiakban a szerződött és kifizetett TOP források térbeliségét mutatjuk be területi szereplő típusonként. A 12. számú ábra szerint a vármegyéket önmagukban vizsgálva az egy főre eső szerződött TOP támogatás nagysága Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Nógrád vármegyékben a legjelentősebb. Borsod-Abaúj-Zemplén és Szolnok vármegyék alig maradnak el ettől. A legalacsonyabb fajlagos értékeket Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegyékben tapasztalhatjuk.

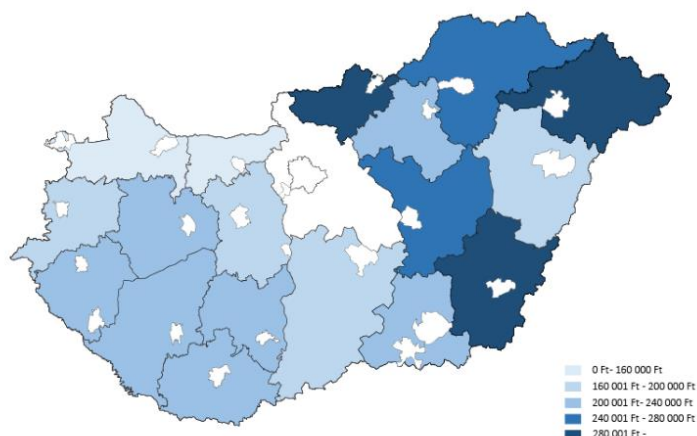


12. ábra: Az egy lakosra jutó TOP vármegyei kötelezettségvállalás (szerződött támogatás) értéke

A vármegyei TOP teljesített támogatások fajlagos értékének vonatkozásában az első három helyen álló vármegye (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Nógrád) megegyező az előzőekben látottakkal. Általában egész Kelet-Magyarországot (Hajdú-Bihar vármegye kivételével) jóval markánsabban jellemzi a magas egy főre eső kifizetési arány mint a Dunántúlt. A legalacsonyabb egy lakosra eső teljesített támogatás jellemzi a fent már említett Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegyéket és Zala vármegyét.

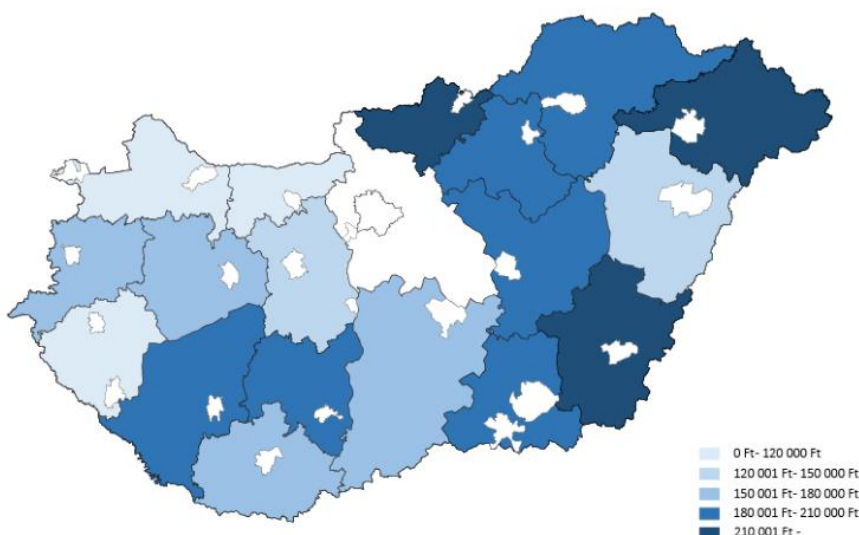

13. ábra: Az egy lakosra jutó teljesített TOP vármegyei támogatások értéke

A szerződött összegekhez viszonyított teljesített támogatási arány a lenti ábrának megfelelően alakult. Kiemelkedik Bács-Kiskun, Somogy és Vas vármegyék teljesítménye, viszont Kelet-Magyarország (Bács-Kiskun kivételével) e tekintetben összességében kevésbé kedvező helyzetű.

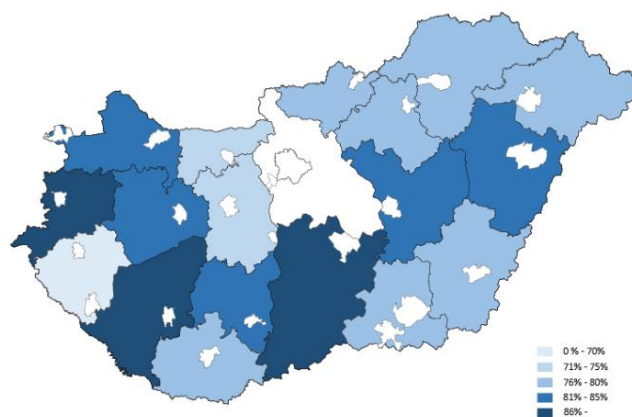

14. ábra: Pénzügyileg teljesített szerződött támogatás a kötelezettségvállalás arányában

8. Javaslatok a jövőre nézve

Elmondható, hogy a Bács-Kiskun vármegyei ITP 2014–2020-as végrehajtása **eredményes és hatékony** volt mind pénzügyi, mind szakmai szempontból. A rendelkezésre álló forrásokat szinte teljes egészében sikerült felhasználni, a tervezett projektek nagy arányban megvalósultak, és az indikátorok többsége teljesült. A fejlesztések mérhető módon járultak hozzá a vármegye gazdasági erősödéséhez és a helyi életkörülmények javításához. Hivatalos jelentések, statisztikák és szakértői értékelések egyaránt igazolják, hogy Bács-Kiskun a TOP-ban nyújtott teljesítménye alapján a legsikeresebb vármegyek közé tartozott az országban, és e tapasztalatokra építve jó eséllyel folytatja a felzárkózást a 2021–2027-es ciklusban is.

A TOP keretében Bács-Kiskun vármegyében megvalósult fejlesztések hozzájárultak a területi különbségek csökkentéséhez, az infrastruktúra bővítéséhez és a gazdasági növekedés elősegítéséhez. Az ITP értékelés alapján azonban a jövőbeni területfejlesztési stratégiákban számos további szempontot szükséges figyelembe venni.

Az egyik kiemelt terület a **hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása**, amelyek esetében továbbra is jelentős kihívás a gazdasági és társadalmi különbségek mérséklése. A fejlesztési források hatékony felhasználása érdekében fontos, hogy a beruházások a helyi igényekhez igazodjanak, biztosítva a munkahelyteremtést, a szolgáltatások elérhetőségét és az életminőség javítását. Az önkormányzatok katalizátor szerepe ebben kulcsfontosságú, hiszen a helyi közösségek igényeinek összefogásával és a különböző források integrálásával biztosítható a valódi előrelépés.

A fejlesztések során hangsúlyt kell helyezni a létrehozott **infrastruktúra fenntartható működtetésére** is. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az újonnan kialakított létesítmények sok esetben kihasználatlanok maradnak, ha nem biztosított a működtetésükhöz szükséges humán- és anyagi erőforrás. Ahhoz, hogy ne üres torzóként álljanak, fontos a működési modellek kidolgozása és a hosszú távú finanszírozás biztosítása. Ennek érdekében szükséges a helyi szereplők bevonása és az önkormányzatok aktív közreműködése.

Fontos, hogy a tervezési és végrehajtási folyamat során a **helyi lakosság és a civil szervezetek is aktívan részt vegyenek**. Ez nemcsak az igények jobb megértését segíti, hanem a helyiek elköteleződését is erősíti. A fejlesztési folyamatok során biztosítani kell a lakossági visszajelzések folyamatos beépítését, ahol a közösségek sajátos problémákkal szembesülnek. Javasolt létrehozni egy "Területfejlesztési Fórum" online platformot, ahol a lakosság közvetlenül oszthatja meg véleményét és javaslatait. A rendszeres közösségi fórumok szervezése is indokolt, ahol az elért eredményeket és a további terveket nyilvánosan bemutathatják.

Az Önkormányzatnak kiemelt szerepe van a **területfejlesztési célok összehangolásában** és a különböző fejlesztési források koordinálásában. A partnerségi alapú megközelítés elősegíti, hogy a különböző szektorok – gazdasági, civil, közszolgáltatói – összehangoltan vegyenek részt a fejlesztési folyamatokban. Ezáltal elkerülhetők a párhuzamos vagy egymással versengő fejlesztések, és biztosítható, hogy a beruházások valóban a helyi közösségek javát szolgálják.

A fejlesztési folyamatok **során rugalmas és adaptív megközelítést** kell alkalmazni, különösen a gazdasági és társadalmi változásokra reagálva. A fenntartható energiatermelés, a digitális technológiák alkalmazása és az okosmegoldások integrálása növelheti a fejlesztések hatékonyságát.

A területfejlesztési projekteknek illeszkedniük kell a **helyi munkaerőpiaci igényekhez**. Az oktatási és képzési programokat úgy kell kialakítani, hogy azok a gazdaság szereplőinek valós munkaerőpiaci

szükségeit támogassák. A hátrányos helyzetű térségekben különösen fontos az alapkompenciák fejlesztése és a munkahelyteremtő kezdeményezések ösztönzése. Az oktatási programoknak és képzéseknek célzottan a helyi igényekre kell reagálniuk, különösen a fiatalok és az alacsony végzettségűek esetében. A képzési programok összeállításánál kiemelt figyelmet kell fordítani az új munkaerőpiaci kihívásokra (pl. digitalizáció, zöld gazdaság).

A fejlesztési projektek **klímarezilienciájának növelése** érdekében érdemes a zöld infrastruktúra és a természetalapú megoldások alkalmazására koncentrálni. Az energiahatékonysági beruházások és a megújuló energiák alkalmazása nemcsak környezetvédelmi szempontból fontos, hanem hozzájárulhat a helyi közösségek energiaszükségletének csökkentéséhez is.

Az önkormányzatoknál és helyi szereplőknél gyakran hiányzik a megfelelő projektmenedzsment tudás és kapacitás. A sikeres projektek érdekében szükséges a **projektmenedzsment szakértelem fejlesztése**. Érdemes képzéseket és workshopokat indítani a projektmenedzsment módszertanokról, vagy egy online tudásmegosztó platformot létrehozni, ahol sikeres fejlesztési projektek dokumentációit és esettanulmányait oszthatják meg.

Továbbá elengedhetetlen a tudatos **monitoring és értékelési rendszer** kialakítása, amely folyamatosan visszajelzést ad a fejlesztések hatékonyságáról. A sikeres projektek mintaként szolgálhatnak más térségek számára, míg a kihívások azonnali korrekciós lépéseket igényelnek. A visszacsatolás biztosítja, hogy a jövőbeli programok tanuljanak az eddigi tapasztalatokból, és valóban a helyi közösségek szükségleteire reagáljanak. A területfejlesztési tervek kidolgozásakor célszerű olyan rugalmas keretrendszert alkalmazni, amely képes gyorsan reagálni a gazdasági és társadalmi változásokra. A válsághelyzetek kezelésére előre kialakított válságkezelési stratégiák beépítése is indokolt. A digitalizáció és az adatvezérelt döntéshozatal hatékonyabbá teheti a területfejlesztést.

A területfejlesztési folyamatok sikerességének alapfeltétele az **érintett szereplők közötti hatékony és folyamatos információcsere** biztosítása. Az IH, a közreműködő szervezet, a területi szereplő és a támogatottak közötti kommunikáció jelenlegi gyakorlata sok esetben széttagolt, ami a fejlesztési projektek megvalósítását és a problémák gyors megoldását is akadályozhatja. A hatékony együttműködés és az eredményes projektvégrehajtás érdekében szükséges az információcsere fejlesztése és az érintettek közötti koordináció erősítése. Javasolt egy digitális információcsere platform létrehozása, amely közös felületet biztosítana az érintettek számára a valós idejű információmegosztásra. A platform lehetőséget biztosítana a projektállapotok nyomon követésére, az aktuális kihívások és problémák megosztására, valamint a közös dokumentumok elérésére. Emellett egy online fórum kialakítása is indokolt, ahol a támogatottak kérdéseket tehetnek fel, megoszthatják tapasztalataikat, és közvetlenül kommunikálhatnak az IH, a közreműködő szervezet, a területi szereplő munkatársaival. Ezzel elősegíthető a jó gyakorlatok terjedése és a közös problémamegoldás. A gördülékeny kommunikáció érdekében érdemes rendszeres online képzéseket és webináriumokat szervezni. A javasolt fejlesztések révén javulhatna a fejlesztési projektek gördülékenysége és hatékonysága, csökkenne a projektek elakadásának kockázata, és biztosítható lenne a közös tudásbázis folyamatos bővítése. Az információcsere javításával növekedne a bizalom és az együttműködési hajlandóság az IH, a közreműködő szervezet, a területi szereplő és a támogatottak között, ami hosszú távon hozzájárulna a területfejlesztési folyamatok sikerességéhez.

1. számú melléklet

Bács-Kiskun vármegyei TOP támogatott projektek listája

Fő megvalósítási helyszín város	TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZÁMA	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG TÁMOGATÁS + ÁFA (TOP finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG (Egyéb hazai finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZÁS (TÁMOGATÁS + ÁFA + FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG)	ELSZÁMOLÁS Elszámolt bizonylat	Pénzügyi előrehaladás	Projekt megvalósítás kezdet	Projekt befejezés határideje
Zsana	TOP-1.1.1-15- BK1-2016-00001	ZSANA ÖNKORMÁNYZATA	Iparterület fejlesztése Zsanán	69 249 425	-	69 249 425	69 241 538	100%	2017.07.01	2018.10.31
Bócsa	TOP-1.1.1-15- BK1-2016-00002	Bócsa Község Önkormányzat	Iparterület kialakítása Bócsán	145 000 000	-	145 000 000	144 979 652	100%	2017.11.01	2021.09.30
Mélykút	TOP-1.1.1-15- BK1-2016-00003	MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Iparterület fejlesztése Mélykúton	284 410 118	-	284 410 118	284 410 116	100%	2016.08.10	2020.03.03
Kisszállás	TOP-1.1.1-15- BK1-2016-00004	Kisszállás Község Önkormányzata	Iparterület fejlesztése Kisszálláson	151 059 083	-	151 059 083	151 059 083	100%	2017.07.01	2022.11.14
Kalocsa	TOP-1.1.1-15- BK1-2016-00005	KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Iparterület fejlesztése Kalocsán	918 400 000	-	918 400 000	918 355 165	100%	2017.10.20	2022.09.30
Jánoshalma	TOP-1.1.1-15- BK1-2016-00006	JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Iparterület fejlesztése Jánoshalmán	269 858 304	-	269 858 304	269 845 697	100%	2017.06.01	2021.10.31
Kiskunhalas	TOP-1.1.1-15- BK1-2016-00007	KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Ipari park fejlesztése Kiskunhalason	300 000 000	-	300 000 000	299 994 997	100%	2017.05.01	2022.09.30
Bácsalmás	TOP-1.1.1-15- BK1-2016-00008	BÁCSALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Iparterület fejlesztése Bácsalmáson	440 000 000	-	440 000 000	439 994 200	100%	2017.06.02	2021.05.31
Érsekcsanád	TOP-1.1.1-16- BK1-2017-00001	ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Iparterület fejlesztése Érsekcsanádon	230 808 957	-	230 808 957	230 769 549	100%	2017.06.20	2021.02.28
Baja	TOP-1.1.1-16- BK1-2017-00002	BAJA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A Bajai Ipari Park infrastrukturális fejlesztése	457 000 000	-	457 000 000	456 957 755	100%	2018.04.03	2022.03.31
Kiskunfélegyháza	TOP-1.1.1-16- BK1-2017-00003	KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kiskunfélegyházi Ipari Park II. ütem fejlesztése	1 400 000 000	-	1 400 000 000	1 400 000 000	100%	2018.08.01	2021.01.29
Szalmás	TOP-1.1.1-16- BK1-2017-00004	Szalmás Község Önkormányzata	Iparterület fejlesztése Szalmáson	45 000 000	-	45 000 000	45 000 000	100%	2018.06.01	2019.06.30
Bácsalmás	TOP-1.1.1-16- BK1-2017-00005	BÁCSALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Üzleti infrastruktúra fejlesztése Bácsalmáson	266 906 429	-	266 906 429	266 805 077	100%	2018.01.01	2021.05.31
Kunszentmiklós	TOP-1.1.1-16- BK1-2017-00006	KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A Kunszentmiklói Ipari Park infrastrukturális fejlesztése	90 000 000	-	90 000 000	90 000 000	100%	2019.09.28	2022.08.31
Tiszakécske	TOP-1.1.1-16- BK1-2017-00007	TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Tiszakécskén	459 600 000	-	459 600 000	459 565 010	100%	2018.01.01	2022.01.31
Helvécia	TOP-1.1.1-16- BK1-2017-00008	HELVÉCIA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Ipari terület elérhetőségének javítása Helvécián	28 725 000	-	28 725 000	28 725 000	100%	2018.09.01	2020.11.29
Szentkirály	TOP-1.1.1-16- BK1-2017-00009	SZENTKIRÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Gazdaságfejlesztés iparterület fejlesztésének eszközével	168 000 000	-	168 000 000	168 000 000	100%	2018.03.01	2021.06.30
Homokmégy	TOP-1.1.1-16- BK1-2017-00010	HOMOKMÉGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Iparterület elérhetőségének fejlesztése Homokmégyen	184 232 879	-	184 232 879	184 191 879	100%	2018.02.01	2021.04.30
Tátlár	TOP-1.1.1-16- BK1-2017-00011	TÁZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kijelölt iparterület megközelíthetőségének javítása	30 000 000	-	30 000 000	30 000 000	100%	2018.03.01	2020.06.29
Kelebia	TOP-1.1.1-16- BK1-2017-00012	Kelebia Község Önkormányzata	Iparterület kialakítása Kelebián	78 000 000	-	78 000 000	77 985 413	100%	2018.01.01	2021.03.31
Tabdi	TOP-1.1.1-16- BK1-2017-00013	Tabdi Községi Önkormányzat	Iparterület kialakítása Tabdin	138 899 864	-	138 899 864	138 899 864	100%	2018.01.01	2021.10.31
Madaras	TOP-1.1.1-16- BK1-2017-00014	Madaras Község Önkormányzata	Iparterület kialakítása Madarason	57 495 000	-	57 495 000	57 494 999	100%	2018.06.01	2021.07.31

Fő megvalósítási helyszín város	TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZÁMA	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG TÁMOGATÁS + ÁFA (TOP finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG (Egyéb hazai finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZÁS (TÁMOGATÁS + ÁFA + FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG)	ELSZÁMOLÁS Elszámolt bizonylat	Pénzügyi előrehaladás	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt befejezés határideje
Tompá	TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00015	Tompá Város Önkormányzata	Helyi gazdaságfejlesztés iparterület kialakításával és infrastrukturális fejlesztéssel Tompán	264 691 000	-	264 691 000	263 902 532	100%	2018.01.01	2021.05.31
Kiskunhalas	TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00016	Kiskunhalas Város Önkormányzata	Új iparterület kialakítása Kiskunhalason	354 226 366	-	354 226 366	354 225 666	100%	2018.03.23	2022.03.31
Soltvadkert	TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00017	Soltvadkert Város Önkormányzata	Iparterület fejlesztése Soltvadkertben	80 000 000	-	80 000 000	79 999 958	100%	2018.01.01	2020.12.31
Kerekegyháza	TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018	Kerekegyháza Város Önkormányzata	Iparterület fejlesztése Kerekegyházán	492 786 728	-	492 786 728	492 783 869	100%	2018.06.15	2021.12.30
Ballószög	TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00019	BALLÓSZÖG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Ipari terület elérhetőségének biztosítása Ballószögön	50 000 000	-	50 000 000	49 999 999	100%	2018.01.01	2021.09.29
Sükdöd	TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00020	Sükdöd Nagyközség Önkormányzata	Ipari terület fejlesztése Sükdödon	260 000 000	-	260 000 000	259 883 556	100%	2018.09.04	2021.08.31
Mélykút	TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00022	MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Iparterület fejlesztése Mélykúton II	140 911 558	-	140 911 558	140 911 558	100%	2021.07.07	2023.09.30
Érsekcsanád	TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00023	ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Iparterület fejlesztése Érsekcsanádon II.	373 700 000	-	373 700 000	373 689 014	100%	2021.01.01	2023.08.31
Bácsalmás	TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00024	Bácsalmás Város Önkormányzata	Üzemcsarnok létesítése a bácsalmási iparterületen	481 520 926	-	481 520 926	481 480 676	100%	2021.01.01	2023.04.30
Szank	TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00025	Szank Községi Önkormányzat	Iparterület fejlesztése Szankon	50 000 000	-	50 000 000	49 984 701	100%	2019.11.27	2023.03.31
Orgovány	TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00026	ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Meglévő iparterület elérhetőségének fejlesztése Orgoványon	152 806 391	3 600 336	156 406 727	152 786 255	98%	2020.04.01	2023.09.15
Solt	TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00028	SOLT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Ipari terület kialakítása Solton	435 847 972	-	435 847 972	435 847 972	100%	2021.01.26	2023.11.15
Kiskőrös	TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00029	KISKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Ipari terület fejlesztése Kiskőrösön	109 000 000	-	109 000 000	108 999 619	100%	2021.01.01	2023.06.30
Ballószög	TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00030	BALLÓSZÖG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Ipari terület kialakítása Ballószögön	318 000 000	-	318 000 000	316 307 421	99%	2020.09.01	2023.11.30
Soltvadkert	TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00031	SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Iparterület fejlesztése Soltvadkertben II. ütem	161 184 057	-	161 184 057	161 090 030	100%	2020.04.16	2023.10.30
Tompá	TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00032	TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Helyi gazdaságfejlesztés iparterület kialakításával és infrastrukturális fejlesztéssel Tompán II.	210 000 000	-	210 000 000	210 000 000	100%	2021.01.01	2023.11.30
Bócsa	TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00033	BÓCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Ipari terület fejlesztése Bócsán	184 897 135	-	184 897 135	178 158 507	96%	2020.07.01	2023.12.13
Ballószög	TOP-1.1.1-16-BK2-2020-00001	BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	BKMFÜ NKft. iparterület fejlesztése Ballószögön	470 684 263	-	470 684 263	466 498 886	99%	2020.10.01	2023.11.30
Mélykút	TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00001	MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Inkubátorház létesítése Mélykúton	172 470 000	-	172 470 000	172 470 000	100%	2018.01.01	2021.06.08
Mátételke	TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00002	MÁTÉTELKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Mátételki zöldség- és gyümölcsgazdálkodó létesítése	40 000 000	-	40 000 000	40 000 000	100%	2018.03.01	2021.05.31
Fülöpjakab	TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00003	Fülöpjakabi Községgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság	Inkubátorház létesítése Fülöpjakabon	503 438 099	-	503 438 099	503 434 990	100%	2019.03.01	2022.10.10
Tompá	TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00004	TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Inkubátorház létrehozása Tompán	56 312 748	-	56 312 748	56 312 748	100%	2018.04.05	2021.09.30
Jánoshalma	TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005	JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban	249 883 999	-	249 883 999	249 869 850	100%	2017.10.01	2021.12.10

Fő megvalósítási helyszín város	TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZÁMA	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG TÁMOGATÁS + ÁFA (TOP finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG (Egyéb hazai finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZÁS (TÁMOGATÁS + ÁFA + FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG)	ELSZÁMOLÁS Elszámolt bizonylat	Pénzügyi előrehaladás	Projekt megvalósítás kezdet	Projekt befejezés határideje
Kalocsa	TOP-1.1.2-16- BK1-2017-00006	KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Inkubátorház kialakítása Kalocsán	223 862 620	-	223 862 620	223 843 123	100%	2018.02.01	2022.09.30
Kisszállás	TOP-1.1.2-16- BK1-2017-00007	KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Inkubátorház kialakítása Kisszálláson	40 000 000	-	40 000 000	39 935 138	100%	2017.10.01	2022.09.15
Baja	TOP-1.1.3-16- BK1-2017-00001	BAJA MARKETING Bajai Kommunikációs és Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság	A Jelky konyha megújítása a helyi gazdaságfejlesztés érdekében Baján	80 000 000	-	80 000 000	80 000 000	100%	2019.01.01	2021.01.28
Ladánybene	TOP-1.1.3-16- BK1-2017-00003	LADÁNYBENE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Helyi gazdaságfejlesztés, piac kialakítása Ladánybenén	50 000 000	-	50 000 000	50 000 000	100%	2018.03.01	2020.11.29
Szank	TOP-1.1.3-16- BK1-2017-00004	SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Agrár-logisztikai központ létrehozása Szank	250 000 000	-	250 000 000	249 986 800	100%	2018.03.01	2021.08.31
Helvécia	TOP-1.1.3-16- BK1-2017-00005	Helvécia Nagyközség Önkormányzata	Piac fejlesztése Helvéciaán - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében.	57 495 000	-	57 495 000	57 495 000	100%	2018.01.01	2021.09.15
Kunbaja	TOP-1.1.3-16- BK1-2017-00006	KUNBAJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Zöldség-gyümölcs feldolgozó üzem agrár-logisztikai fejlesztésének támogatása Kunbaján	80 000 000	-	80 000 000	79 751 024	100%	2018.06.01	2020.06.28
Jánoshalma	TOP-1.1.3-16- BK1-2017-00007	JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán	797 119 386	-	797 119 386	797 119 164	100%	2018.04.01	2023.03.31
Dusnok	TOP-1.1.3-16- BK1-2017-00008	Dusnok Község Önkormányzata	Helyi piac fejlesztése Dusnokon	44 970 479	-	44 970 479	44 970 479	100%	2018.03.01	2021.05.31
Kiskőrös	TOP-1.1.3-16- BK1-2017-00009	KISKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A kiskőrösi kistermelői piac infrastrukturális fejlesztése	319 702 205	-	319 702 205	319 702 205	100%	2018.01.01	2023.06.03
Lajosmizse	TOP-1.1.3-16- BK1-2017-00010	LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK GAZDASÁGI SZERVEZETE	Konyha komplex fejlesztése Lajosmizsén	70 000 000	-	70 000 000	70 000 000	100%	2018.02.01	2019.11.30
Bugac	TOP-1.2.1-15- BK1-2016-00001	BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Évezredek útján, Aranymonostor és látogatóközpont turisztikai fejlesztése I.ütem	1 137 073 125	-	1 137 073 125	1 137 073 110	100%	2017.08.01	2023.11.30
Kiskunhalas	TOP-1.2.1-15- BK1-2016-00003	KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A Thorma János Múzeum bővítése	369 960 982	-	369 960 982	369 960 982	100%	2017.03.14	2018.03.13
Kiskunhalas	TOP-1.2.1-15- BK1-2016-00004	KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A kiskunhalasi városháza tornyának kilátó céljára történő hasznosítása	99 847 537	-	99 847 537	99 847 537	100%	2017.10.27	2021.12.08
Soltvadkert	TOP-1.2.1-15- BK1-2016-00006	SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A Vadkerti-tó turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése	50 000 000	-	50 000 000	49 990 047	100%	2017.06.30	2021.05.31
Hajós	TOP-1.2.1-15- BK1-2016-00008	HAJÓSSZOLG Köztisztasági Kommunális és Csatorna KFT	Cabernet Borturisztikai Látogatóközpont kialakítása a Hajósi Pincefaluban	179 943 842	-	179 943 842	176 851 510	98%	2017.07.01	2019.12.31
Dunapataj	TOP-1.2.1-15- BK1-2016-00009	DUNAPATAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Dunapataj-Szelid turisztikai kerékpárút fejlesztése	170 000 000	-	170 000 000	170 000 000	100%	2017.11.02	2018.07.31
Dunatetétlen	TOP-1.2.1-15- BK1-2016-00010	Solt Város Önkormányzat	Solt-Dunatetétlen-Akasztó turisztikai célú kerékpárút fejlesztése	1 076 798 877	-	1 076 798 877	1 076 798 870	100%	2016.07.01	2023.09.30
Szank	TOP-1.2.1-15- BK1-2016-00011	SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Kiskun Emlékhely Zank vezér szállásán	350 000 000	-	350 000 000	349 997 818	100%	2016.08.01	2020.12.15
Felsőszentiván	TOP-1.2.1-15- BK1-2016-00012	FELSŐSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Felsőszentiváni szélmalom helyreállítása és turisztikai attrakcióvá fejlesztése	214 000 000	-	214 000 000	213 999 997	100%	2017.09.01	2020.08.31
Nemesnádudvar	TOP-1.2.1-16- BK1-2017-00001	NEMESNÁDUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	"Nemesnádudvari turisztikai központ kialakítása és a helyi népviseletes babagyűjtemény turisztikai attrakcióvá fejlesztése"	95 000 000	-	95 000 000	95 000 000	100%	2017.04.03	2021.02.24

Fő megvalósítási helyszín város	TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZÁMA	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG TÁMOGATÁS + ÁFA (TOP finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG (Egyéb hazai finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZÁS (TÁMOGATÁS + ÁFA + FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG)	ELSZÁMOLÁS Elszámolt bizonylat	Pénzügyi előrehaladás	Projekt megvalósítás kezdet	Projekt befejezés határideje
Tiszaécske	TOP-1.2.1-16- BK1-2017-00003	TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A természeti értékekben rejlő ökoturisztikai potenciál hasznosítása Tiszaécske városában	235 500 000	-	235 500 000	235 500 000	100%	2018.01.01	2021.11.28
Soltvadkert	TOP-1.2.1-16- BK1-2017-00004	SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A Vadkerti-tó turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése - 2. ütem	173 918 529	-	173 918 529	173 918 529	100%	2018.03.01	2021.08.31
Soltvadkert	TOP-1.2.1-16- BK1-2017-00005	SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A Vadkerti-tó turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése - 3. ütem	163 133 974	-	163 133 974	163 083 974	100%	2018.03.01	2021.08.31
Lakitelek	TOP-1.2.1-16- BK1-2017-00008	LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA	Tőserdő turisztikai fejlesztése és Ökoturisztikai Központ megvalósítása	199 865 799	-	199 865 799	199 865 799	100%	2020.11.01	2023.04.30
Kiskunhalas	TOP-1.2.1-16- BK1-2017-00009	Halasi Városmenedzser Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Sáfrik-féle szélmalom felújítása, kiállító- és alkotóház kialakítása	110 500 000	-	110 500 000	110 500 000	100%	2018.02.20	2020.12.31
Tiszaug	TOP-1.2.1-16- BK1-2017-00010	Tiszaug Község Önkormányzata	Tiszaugi horgászturizmus fejlesztése	50 372 300	-	50 372 300	50 021 162	99%	2017.11.01	2021.07.31
Tiszaug	TOP-1.2.1-16- BK1-2017-00011	Tiszaug Község Önkormányzata	Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Tiszaug és Lakitelek között	321 114 906	-	321 114 906	321 068 993	100%	2018.01.01	2023.12.20
Kunszentmiklós	TOP-1.2.1-16- BK1-2017-00012	KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kulturális és örökségi érték turisztikai fejlesztése a kunszentmiklósi Virágh Kúriában	60 000 000	-	60 000 000	59 823 140	100%	2018.05.17	2020.11.29
Nagybaracska	TOP-1.2.1-16- BK1-2017-00013	NAGYBARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Füzes sziget turisztikai fejlesztése	126 489 000	-	126 489 000	126 489 000	100%	2018.01.01	2021.08.31
Sükösd	TOP-1.2.1-16- BK1-2017-00014	SÜKÖSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Sükösd és Dusnok turisztikai célú fejlesztései a Duna menti természeti örökség tükrében	172 000 000	-	172 000 000	171 958 019	100%	2018.03.01	2022.09.30
Kiskunhalas	TOP-1.2.1-16- BK1-2017-00015	Halasi Városmenedzser Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Kiskunhalas - Sóstó turisztikai fejlesztése	81 000 000	-	81 000 000	80 999 999	100%	2018.02.20	2021.01.28
Dunapataj	TOP-1.2.1-16- BK1-2017-00016	DUNAPATAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szelidi-tó turisztikai infrastruktúra fejlesztése	333 000 000	-	333 000 000	333 000 000	100%	2018.08.01	2019.11.29
Kiskunhalas	TOP-1.2.1-16- BK1-2017-00017	KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A Csipkeház látogatóbarát fejlesztése	72 800 000	-	72 800 000	72 800 000	100%	2018.01.17	2020.03.18
Bácsalmás	TOP-1.2.1-16- BK1-2017-00018	BÁCSALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Bácsalmás természeti és kulturális értékeinek komplex turisztikai attrakcióvá fejlesztése.	380 918 021	-	380 918 021	380 918 021	100%	2018.01.01	2021.12.23
Kiskunhalas	TOP-1.2.1-16- BK1-2017-00019	Halasi Városmenedzser Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Halasi Tánchagyományok Házának kialakítása	135 343 230	-	135 343 230	135 143 230	100%	2018.02.20	2022.11.30
Kelebia	TOP-1.2.1-16- BK2-2017-00001	BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Az EuroVelo 13 kerékpáros útvonal és környezetének ökoturisztikai fejlesztése	199 954 822	-	199 954 822	199 954 821	100%	2018.01.01	2020.09.28
Kecskemét	TOP-1.2.1-16- BK2-2019-00004	BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Petőfi kulturális-tematikus útvonal kialakítása Bács-Kiskun megyében.	102 229 957	-	102 229 957	102 150 632	100%	2021.01.01	2023.08.31
Nemesnádudvar	TOP-1.2.1-16- BK2-2019-00005	BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Borturisztikai útvonal kialakítása a Sváb Sarok településein	80 899 681	-	80 899 681	80 892 599	100%	2021.01.01	2023.06.30
Lajosmizse	TOP-1.3.1-15- BK1-2016-00001	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Közlekedésfejlesztés Bács-Kiskun megyében I.	4 046 997 600	-	4 046 997 600	4 046 997 599	100%	2017.04.04	2021.03.15
Lajosmizse	TOP-1.3.1-15- BK1-2021-00004	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Közlekedésfejlesztés Bács-Kiskun megyében II	999 600 000	-	999 600 000	896 370 821	90%	2022.04.01	2023.08.31
Harkakötöny	TOP-1.4.1-15- BK1-2016-00004	Szeged-Csanádi Egyházmegye	Harkakötönyi Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda fejlesztése	34 519 174	-	34 519 174	34 323 099	99%	2017.06.16	2018.03.25

Fő megvalósítási helyszín város	TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZÁMA	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG TÁMOGATÁS + ÁFA (TOP finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG (Egyéb hazai finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZÁS (TÁMOGATÁS + ÁFA + FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG)	ELSZÁMOLÁS Elszámolt bizonylat	Pénzügyi előrehaladás	Projekt megvalósítás kezdet	Projekt befejezés határideje
Kömpöc	TOP-1.4.1-15- BK1-2016-00005	Szeged-Csanádi Egyházmegye	Kömpöci Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda fejlesztése	26 140 026	-	26 140 026	26 124 870	100%	2017.06.16	2018.03.25
Apostag	TOP-1.4.1-15- BK1-2016-00007	APOSTAG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Óvodafejlesztés Apostagon	120 000 000	-	120 000 000	119 994 791	100%	2017.05.01	2018.12.31
Lajosmizse	TOP-1.4.1-15- BK1-2016-00008	LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	„Meserét” Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén	150 000 000	-	150 000 000	149 998 900	100%	2017.05.01	2018.10.31
Nyárlőrinc	TOP-1.4.1-15- BK1-2016-00009	NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Nyárlőrinci Óvoda bővítése, átépítése	256 000 000	-	256 000 000	255 998 205	100%	2017.06.15	2019.09.30
Kiskunfélegyháza	TOP-1.4.1-15- BK1-2016-00010	KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése	399 842 579	-	399 842 579	399 839 389	100%	2017.07.01	2020.06.29
Kiskunfélegyháza	TOP-1.4.1-15- BK1-2016-00011	KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bölcsődéinek eszközfejlesztése	5 000 000	-	5 000 000	4 992 000	100%	2017.05.01	2018.12.03
Dunavecse	TOP-1.4.1-15- BK1-2016-00012	DUNAVECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	3 csoportos óvoda fejlesztése Dunavecsén	30 000 000	-	30 000 000	29 995 000	100%	2017.05.01	2018.12.31
Kerekegyháza	TOP-1.4.1-15- BK1-2016-00013	KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	„Park utcai új óvoda létesítése”	355 035 164	-	355 035 164	355 031 281	100%	2017.05.01	2019.04.30
Kerekegyháza	TOP-1.4.1-15- BK1-2016-00014	KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	„Kerekegyerdő bölcsőde fejlesztése”	15 281 789	-	15 281 789	15 281 789	100%	2017.05.01	2018.01.31
Solt	TOP-1.4.1-15- BK1-2016-00015	SOLT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Új mini bölcsőde kialakítása Solton	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	100%	2017.07.01	2018.07.20
Kiskunmajsa	TOP-1.4.1-15- BK1-2016-00016	KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán	404 072 086	-	404 072 086	404 070 956	100%	2017.06.19	2020.04.15
Kiskunmajsa	TOP-1.4.1-15- BK1-2016-00017	KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Ciróka Bölcsőde eszközbeszerzése Kiskunmajsán	1 819 150	-	1 819 150	1 818 083	100%	2017.06.01	2018.06.29
Baja	TOP-1.4.1-15- BK1-2016-00018	BAJA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A foglalkoztatás és az életminőség javítása az Akácós utcai bölcsőde fejlesztésével	70 000 000	-	70 000 000	69 995 000	100%	2017.06.01	2018.10.31
Kunszentmiklós	TOP-1.4.1-15- BK1-2016-00019	KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Kunszentmiklósi Napsugár bölcsőde fejlesztése	110 539 768	-	110 539 768	110 261 642	100%	2017.06.08	2020.08.25
Kunszentmiklós	TOP-1.4.1-15- BK1-2016-00020	KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Damjanich Utcai Óvoda fejlesztése Kunszentmiklóson	68 991 916	-	68 991 916	68 988 401	100%	2017.05.01	2019.05.31
Felsőlajos	TOP-1.4.1-15- BK1-2016-00021	FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét Óvodában	45 000 000	-	45 000 000	44 999 999	100%	2017.06.01	2019.04.30
Fülöpszállás	TOP-1.4.1-15- BK1-2016-00022	FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Új, három csoportos óvoda építése Fülöpszálláson	198 631 383	-	198 631 383	198 406 679	100%	2017.05.01	2020.06.17
Helvécia	TOP-1.4.1-15- BK1-2016-00023	HELVÉCIA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Helvécián új óvoda és bölcsőde építése	421 683 000	-	421 683 000	421 675 750	100%	2017.05.01	2019.12.07
Tompa	TOP-1.4.1-15- BK1-2016-00024	TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Modern bölcsődei környezet megteremtése a tompai Bokréta Önkormányzati Óvodában	150 000 000	-	150 000 000	149 994 183	100%	2017.05.01	2021.02.28
Petőfiszállás	TOP-1.4.1-15- BK1-2016-00025	PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	3 csoportos új óvoda építése Petőfiszálláson	166 700 000	-	166 700 000	166 699 349	100%	2018.01.01	2019.08.15
Kiskőrös	TOP-1.4.1-15- BK1-2016-00026	KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kiskőrösi bölcsőde fejlesztése	5 877 672	-	5 877 672	5 877 672	100%	2017.07.01	2018.09.30
Kiskőrös	TOP-1.4.1-15- BK1-2016-00027	KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kiskőrösön új, hat csoportszobás óvoda építése	744 412 328	-	744 412 328	744 411 629	100%	2017.05.01	2021.09.15
Tataháza	TOP-1.4.1-15- BK1-2016-00028	TATAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Vegyes csoportos óvoda fejlesztése Tataházán	40 000 000	-	40 000 000	40 000 000	100%	2017.07.01	2019.02.28

Fő megvalósítási helyszín város	TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZÁMA	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG TÁMOGATÁS + ÁFA (TOP finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG (Egyéb hazai finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZÁS (TÁMOGATÁS + ÁFA + FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG)	ELSZÁMOLÁS Elszámolt bizonylat	Pénzügyi előrehaladás	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt befejezés határideje
Baja	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00001	BAJA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Bölcsődefejlesztési Program Baján – Kodály utcai bölcsőde és a Szent Antal utcai bölcsőde fejlesztése	55 000 000	-	55 000 000	54 999 912	100%	2018.02.15	2020.09.30
Kecel	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002	KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun megyében	39 000 000	-	39 000 000	38 954 612	100%	2018.05.02	2019.05.15
Ágasegyháza	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00003	ÁGASEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Az Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése	18 648 114	-	18 648 114	18 646 134	100%	2018.01.01	2018.12.31
Géderlak	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00004	GÉDERLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Óvoda fejlesztése Géderlakon	27 354 284	-	27 354 284	27 354 284	100%	2018.01.01	2019.12.31
Felsőszentiván	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00006	FELSŐSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	BÖLCSŐDEI SZOLGÁLTATÁS KIALAKÍTÁSA FELSŐSZENTIVÁNON	24 000 000	-	24 000 000	23 999 999	100%	2018.02.01	2019.03.31
Dusnok	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00008	DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Dusnoki Óvoda és Bölcsőde fejlesztése	30 000 000	-	30 000 000	29 998 352	100%	2018.02.01	2019.12.31
Kunfehértó	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00009	KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	„Mini bölcsőde kialakítása Kunfehértón”	30 000 000	-	30 000 000	29 995 377	100%	2018.01.01	2019.06.30
Kalocsa	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010	KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Óvodafejlesztés Kalocsán	538 136 425	-	538 136 425	538 136 425	100%	2018.03.01	2021.12.31
Harta	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00011	HARTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Mini bölcsőde kialakítása Hartán	12 000 000	-	12 000 000	11 935 646	99%	2018.01.01	2019.02.28
Szeremle	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00012	SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szeremlei Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Szociális Szolgáltató fejlesztése	142 304 842	-	142 304 842	142 304 842	100%	2018.01.01	2021.03.31
Kiskunhalas	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00014	KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kiskunhalasi Kertvárosi Óvoda építése	336 608 142	-	336 608 142	336 608 142	100%	2018.02.15	2021.01.29
Kiskőrös	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00016	KISKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Batthyány utcai óvoda fejlesztése	30 000 000	-	30 000 000	30 000 000	100%	2018.09.01	2020.07.29
Érsekhalma	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00017	ÉRSEKHALMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	ÉRSEKHALMI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA FEJLESZTÉSE	21 183 573	-	21 183 573	21 182 080	100%	2018.03.21	2019.09.10
Öregcsertő	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00018	ÖREGCSERTŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Öregcsertő Község Óvodájának felújítása	30 000 000	-	30 000 000	29 999 999	100%	2018.01.01	2018.12.31
Ballószög	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00020	BALLÓSZÖG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Óvoda bővítés Ballószögön	114 989 770	-	114 989 770	114 989 770	100%	2018.01.01	2020.07.10
Kunszállás	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00021	KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Mosolyvár óvoda épületének komplex felújítása	126 489 001	-	126 489 001	126 488 999	100%	2018.01.01	2020.10.29
Akasztó	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00022	AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Akasztói Napközi Otthonos Óvoda Fejlesztése	140 967 329	1 987 833	142 955 162	142 955 162	100%	2018.01.01	2022.09.30
Kisszállás	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00023	KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kisszállási óvoda felújítása és bővítése	80 000 000	-	80 000 000	79 997 211	100%	2018.04.06	2020.02.29
Balotaszállás	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00024	BALOTASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Óvoda fejlesztés Balotaszálláson	14 999 999	-	14 999 999	14 936 759	100%	2018.06.01	2019.05.15
Izsák	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00001	Izsák Város Önkormányzata	Három csoportos bölcsőde fejlesztése Izsákon	361 487 409	-	361 487 409	361 487 409	100%	2019.09.02	2021.06.30
Mélykút	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00002	MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Bölcsőde építése Mélykúton	385 638 030	-	385 638 030	385 638 030	100%	2019.03.06	2022.09.30
Csolyospálos	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00003	CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Mini bölcsőde kialakítása Csolyospáloson	58 559 391	-	58 559 391	58 559 391	100%	2019.10.01	2021.09.30
Solt	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00004	Solt Város Önkormányzat	Új bölcsődei intézmény létesítése Solton	152 343 880	-	152 343 880	152 343 880	100%	2020.01.01	2023.02.28
Szentkirály	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00006	SZENTKIRÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szentkirály, kétcsoportos bölcsőde létesítése	293 187 824	-	293 187 824	293 187 824	100%	2019.12.01	2021.12.29

Fő megvalósítási helyszín város	TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZÁMA	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG TÁMOGATÁS + ÁFA (TOP finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG (Egyéb hazai finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZÁS (TÁMOGATÁS + ÁFA + FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG)	ELSZÁMOLÁS Elszámolt bizonylat	Pénzügyi előrehaladás	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt befejezés határideje
Páhi	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00007	PÁHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése Páhi	31 658 610	-	31 658 610	31 658 610	100%	2019.09.01	2022.02.15
Tiszaécske	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00008	Tiszaécske Város Önkormányzata	Bölcsőde bővítés Tiszaécskén	361 030 403	-	361 030 403	361 030 403	100%	2019.11.01	2022.11.30
Baja	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00009	Pici-Talpak Gyermekgondozó Egyesület	Mini Manó Családi Bölcsőde kialakítása Baján	100 717 793	14 767 975	115 485 768	115 485 768	100%	2019.10.01	2022.08.31
Jászsztlászló	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00010	Jászsztlászló Község Önkormányzata	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése Jászsztlászló	151 290 343	-	151 290 343	151 290 340	100%	2020.01.01	2021.11.29
Kiskunfélegyháza	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011	KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Móravárosi kétcsoportos bölcsőde építése Kiskunfélegyházán	369 000 000	-	369 000 000	369 000 000	100%	2019.11.20	2023.06.30
Soltszentimre	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00012	SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Mini bölcsőde kialakítása Soltszentimrén	37 461 689	-	37 461 689	37 461 689	100%	2019.12.31	2022.02.15
Tázlár	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00013	TÁZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Meglévő minibölcsőde bővítése új csoportszobával, tornaszobával és fedett közlekedővel Tázláron	22 222 000	-	22 222 000	22 222 000	100%	2019.11.01	2021.10.29
Érsekcsanád	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00014	ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Mini bölcsőde építés Érsekcsanádon	78 615 574	-	78 615 574	78 615 574	100%	2018.11.06	2022.05.15
Bácsbokod	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00015	BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Mini bölcsőde létesítése Bácsbokodon	38 091 879	-	38 091 879	38 091 879	100%	2019.10.01	2021.09.30
Városföld	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00016	VÁROSFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Bölcsődei férőhelyek bővítése Városföldön	70 640 029	-	70 640 029	70 640 029	100%	2019.11.18	2021.12.29
Orgovány	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00017	ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Bölcsődei férőhelyek bővítése Orgoványon	339 166 087	-	339 166 087	339 166 087	100%	2018.12.20	2021.11.30
Bácsalmás	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00018	BÁCSALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Bölcsőde Kialakítása Bácsalmáson	137 500 000	-	137 500 000	136 525 436	99%	2019.10.01	2021.10.15
Vaskút	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00019	VASKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Bölcsőde építés Vaskúton	237 913 778	-	237 913 778	237 554 286	100%	2019.10.01	2021.10.15
Ballószög	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00020	BALLÓSZÖG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kiscsillag bölcsőde építése Ballószögön	339 022 082	-	339 022 082	339 022 082	100%	2020.05.01	2023.03.31
Baja	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00021	BAJA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Baja, Kodály utcai bölcsőde bővítése	360 282 870	-	360 282 870	360 239 875	100%	2020.01.20	2023.01.19
Kerekegyháza	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022	KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kerekegyerdő bölcsőde bővítése	131 808 581	-	131 808 581	131 723 434	100%	2019.09.01	2022.01.26
Szalkszentmárton	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00023	SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Mini bölcsőde kialakítása Szalkszentmártonon	65 597 515	-	65 597 515	65 597 515	100%	2019.10.01	2021.02.15
Kiskőrös	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00024	KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A kiskőrösi bölcsőde bővítése, felújítása	141 321 551	-	141 321 551	141 263 896	100%	2020.01.01	2022.09.30
Kiskunhalas	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00025	KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde bölcsődei csoportfejlesztése	46 000 000	-	46 000 000	46 000 000	100%	2020.02.01	2021.03.30
Nagybaracska	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00026	NAGYBARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Bölcsődei férőhelyek létrehozása Nagybaracsán	35 556 000	-	35 556 000	35 556 000	100%	2020.01.01	2022.11.30
Dusnok	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00027	DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Mini bölcsődei csoport kialakítása Dusnokon	30 000 000	-	30 000 000	30 000 000	100%	2020.06.01	2021.06.30
Csávoly	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00028	CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Mini Bölcsőde kialakítása Csávolyon	59 419 003	-	59 419 003	59 419 003	100%	2019.10.01	2022.03.15
Felsőszentiván	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00029	FELSŐSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Felsőszentiváni Bölcsőde bővítés	57 327 714	-	57 327 714	57 327 714	100%	2019.10.01	2022.10.01
Felsőlajos	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00030	FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Felsőlajoson	144 444 000	-	144 444 000	144 444 000	100%	2020.07.01	2022.04.30

Fő megvalósítási helyszín város	TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZÁMA	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG TÁMOGATÁS + ÁFA (TOP finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG (Egyéb hazai finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZÁS (TÁMOGATÁS + ÁFA + FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG)	ELSZÁMOLÁS Elszámolt bizonylat	Pénzügyi előrehaladás	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt befejezés határideje
Uszód	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00031	USZÓD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Mini bölcsőde kialakítása Uszódon	111 248 353	-	111 248 353	111 248 353	100%	2019.06.11	2022.05.31
Csengőd	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00032	CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Mini bölcsőde építése Csengődön	209 617 781	-	209 617 781	209 617 281	100%	2020.08.13	2023.12.31
Tabdi	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00033	TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Mini bölcsőde létesítése Tabdiban	35 556 000	-	35 556 000	35 555 999	100%	2019.10.01	2021.10.22
Akasztó	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00034	AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Mini bölcsőde létesítése Akasztón	101 033 622	-	101 033 622	101 033 234	100%	2019.10.01	2022.03.31
Bátya	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00035	Bátya Község Önkormányzata	Új mini bölcsőde építése Bátján	77 606 993	-	77 606 993	77 606 993	100%	2019.10.01	2022.07.01
Baja	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00036	Bababirtok Egyesület	Családi bölcsődei férőhelyek kialakítása új telephely létesítéssel a Bababirtok Egyesületnél	133 960 954	2 771 846	136 732 800	136 732 798	100%	2019.10.01	2023.03.31
Lajosmizse	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039	LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén	281 086 155	-	281 086 155	281 086 102	100%	2020.01.01	2022.08.15
Harta	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00040	HARTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Mini bölcsőde építése Hartán	123 677 956	-	123 677 956	123 658 844	100%	2019.11.01	2023.05.31
Jánoshalma	TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041	Jánoshalma Városi Önkormányzat	Bölcsőde építése Jánoshalmán	176 661 154	-	176 661 154	176 661 154	100%	2020.09.01	2022.11.30
Ágasegyháza	TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00042	ÁGASEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Mini bölcsőde kialakítása Ágasegyházán	40 000 000	-	40 000 000	40 000 000	100%	2020.06.01	2022.02.28
Dávod	TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00043	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Minibölcsőde létrehozása Dávodon	88 734 188	-	88 734 188	88 645 524	100%	2020.02.03	2023.01.31
Fülöpjakab	TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00044	FÜLÖPJAKAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fülöpjakabi Bölcső	98 800 040	-	98 800 040	98 800 040	100%	2021.02.10	2023.03.31
Kunszállás	TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00045	KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Minibölcsőde létrehozása Kunszálláson	90 930 000	-	90 930 000	90 930 000	100%	2020.09.01	2022.12.31
Kisszállás	TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00046	KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Minibölcsőde létrehozása Kisszálláson	30 000 000	-	30 000 000	30 000 000	100%	2020.08.01	2021.12.31
Tiszaug	TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00047	TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Minibölcsőde létrehozása Tiszaugon	129 853 668	-	129 853 668	129 853 368	100%	2021.05.01	2023.12.08
Bócsa	TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00048	BÓCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	2 csoportszobás bölcsőde építése Bócsán	146 666 666	82 264 678	228 931 344	228 931 341	100%	2022.09.01	2023.12.31
Fülöpszállás	TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00049	FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Új, két csoportos bölcsőde építése Fülöpszálláson	228 658 787	-	228 658 787	228 658 787	100%	2020.09.01	2023.09.30
Kecskemét	TOP-1.5.1-20-2020-00018	BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Bács-Kiskun megye 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű dokumentumainak összeállítása	269 998 001	-	269 998 001	269 951 974	100%	2021.01.01	2023.12.15
Baja	TOP-2.1.1-16-BK1-2017-00001	BAJA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Baja - Barnamezős terület rehabilitációs program	499 999 000	-	499 999 000	499 832 683	100%	2018.06.30	2022.03.30
Kiskunmajsa	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00003	KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán	517 455 000	-	517 455 000	517 444 863	100%	2017.11.01	2021.09.20
Kiskunfélegyháza	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004	KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Félegyháza Újjáépül	2 068 659 786	-	2 068 659 786	2 068 654 782	100%	2017.08.01	2020.12.31
Izsák	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00005	IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A Kossuth tér arculati megújítása, piactér kialakítása	377 822 625	-	377 822 625	377 812 171	100%	2017.11.01	2022.10.31
Baja	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00006	Baja Megyei Jogú Város Önkormányzata	Baja -Zöld Város Gazdaságfejlesztési Program	1 383 756 074	-	1 383 756 074	1 383 751 074	100%	2019.04.24	2021.10.30
Mélykút	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00007	MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Mélykút városközpont rekonstrukciója	160 860 000	-	160 860 000	160 853 263	100%	2017.11.01	2021.04.30

Fő megvalósítási helyszín város	TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZÁMA	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG TÁMOGATÁS + ÁFA (TOP finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG (Egyéb hazai finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZÁS (TÁMOGATÁS + ÁFA + FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG)	ELSZÁMOLÁS Elszámolt bizonylat	Pénzügyi előrehaladás	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt befejezés határideje
Lajosmizse	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Lajosmizse város környezettudatos és innovatív fejlesztése	988 140 000	-	988 140 000	988 138 643	100%	2017.09.01	2022.05.15
Solt	TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00001	SOLT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Solt városi arculatának fejlesztése	545 214 757	-	545 214 757	545 135 892	100%	2018.04.01	2022.10.11
Kunszentmiklós	TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00002	KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Zöld város kialakítása a Kunszentmiklósi Városközpontban	114 990 000	-	114 990 000	114 990 000	100%	2018.04.17	2022.10.31
Jánoshalma	TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003	JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Zöld tér felújítása Jánoshalmán	124 118 860	-	124 118 860	124 118 860	100%	2018.06.01	2022.07.31
Dunaegyháza	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00001	DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	„Csapadékvíz-csatorna építés Dunaegyházán 2016.”	79 995 134	-	79 995 134	76 581 867	96%	2017.05.01	2019.12.15
Kiskunhalas	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00002	KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Felsőváros belvízkárok megelőzése, a csapadékvíz záportározóban történő elhelyezésével	200 000 000	-	200 000 000	199 998 888	100%	2017.05.01	2020.12.31
Öregcsertő	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00003	ÖREGCSERTŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ÖREGCSERTŐN	26 000 000	-	26 000 000	25 999 996	100%	2017.06.01	2019.01.31
Érsekcsanád	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00004	ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Érsekcsanád belterületi csapadékvíz elvezetés I. ütem	110 000 000	-	110 000 000	109 980 237	100%	2017.05.01	2019.03.31
Fajsz	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00005	FAJSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	„Csapadékvíz elvezető árkok rekonstrukciója Fajsz községben”	20 000 000	-	20 000 000	19 999 996	100%	2017.06.01	2019.07.31
Apostag	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00006	APOSTAG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Apostag Község csapadékvíz elvezetése – I. ütem	70 000 000	-	70 000 000	69 999 995	100%	2017.07.01	2018.12.15
Újtelek	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00007	ÚJTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Újtelek község csapadékvíz elvezetése	20 000 000	-	20 000 000	20 000 000	100%	2017.06.01	2018.12.31
Csólóspálos	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00008	CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Csapadékvíz elvezető csatorna építés IV. ütem	90 000 000	-	90 000 000	89 206 259	99%	2017.05.01	2019.06.30
Bácsbokod	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00009	BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Belvízelvezetés Bácsbokodon	50 000 000	-	50 000 000	50 000 000	100%	2017.06.01	2018.01.31
Dávod	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Dávod község csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése	287 499 997	-	287 499 997	287 499 995	100%	2017.05.01	2020.09.03
Hajós	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00011	HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Hajós-Dusnok belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítése	102 000 000	-	102 000 000	100 919 533	99%	2017.05.01	2019.12.31
Baja	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00012	BAJA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Baján a vízkár veszélyeztetettség csökkentése érdekében	828 208 834	-	828 208 834	823 366 240	99%	2017.06.01	2022.09.30
Kiskunmajsa	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00013	KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Csapadékvíz-elvezetés és Vízügyi Rendszerfejlesztés Kiskunmajsán	200 000 000	-	200 000 000	199 946 923	100%	2017.05.01	2020.07.14
Soltvadkert	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00014	SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Városi záportó kialakítása, valamint csapadékcatorna rekonstrukció Soltvadkerten	450 000 000	-	450 000 000	449 277 060	100%	2016.08.01	2020.12.31
Vaskút	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00016	VASKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Vaskút belterületi vízrendezés I. ütem	100 000 000	-	100 000 000	100 000 000	100%	2017.05.01	2018.10.31
Tázlár	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00017	TÁZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Tázláron”	41 000 000	-	41 000 000	40 995 094	100%	2017.06.01	2021.06.30
Csátalja	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00018	CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása Csátalján	25 000 000	-	25 000 000	24 995 036	100%	2017.06.01	2019.06.30
Gátér	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00019	GÁTÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Csapadékvíz-elvezetés és vízügyi Rendszerfejlesztés	50 000 000	-	50 000 000	49 994 607	100%	2017.05.01	2020.04.30

Fő megvalósítási helyszín város	TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZÁMA	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG TÁMOGATÁS + ÁFA (TOP finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG (Egyéb hazai finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZÁS (TÁMOGATÁS + ÁFA + FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG)	ELSZÁMOLÁS Elszámolt bizonylat	Pénzügyi előrehaladás	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt befejezés határideje
Jászszentlászló	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00020	JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Jászszentlászló csapadék és vízviszatartó rendszer rekonstrukció V. ütem	35 000 000	-	35 000 000	34 995 046	100%	2017.06.01	2018.09.30
Fülöpszállás	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00021	FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fülöpszállás központi belterület csapadékvíz elvezető rendszer építése	122 341 542	-	122 341 542	122 341 377	100%	2017.05.01	2021.04.30
Szadmár	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00022	SZAKMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szadmár község csapadékvíz elvezetése	30 000 000	-	30 000 000	29 939 397	100%	2017.06.01	2019.02.28
Kecel	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00023	KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kecel város belterületi csapadékvíz elvezetése	300 000 000	-	300 000 000	299 997 764	100%	2017.07.01	2021.05.31
Kunpeszér	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00024	KUNPESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kunpeszér belterületi csapadékvíz elvezetés	17 154 000	-	17 154 000	17 147 635	100%	2017.06.01	2019.12.17
Pálmonostora	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00025	PÁLMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pálmonostora település belterületi csapadékvíz elvezetés I. ütem TOP-2.1.3-15	80 000 000	-	80 000 000	79 246 211	99%	2017.05.01	2018.10.31
Miske	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00026	MISKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Miskén	167 999 970	-	167 999 970	167 995 017	100%	2017.06.01	2019.05.31
Bátya	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00027	BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Bercsényi, Mikes, Rákóczi és Széchenyi utcák csapadékvíz elvezetése Bátya településen	60 000 000	-	60 000 000	59 405 047	99%	2017.05.01	2019.03.15
Kunfehértó	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00030	KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kunfehértó Község központjának csapadékvíz elvezetése	40 000 000	-	40 000 000	37 966 100	95%	2017.06.01	2019.03.31
Madaras	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00031	MADARAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Madaras község belterületi csapadékvíz elvezető rendszer megújítása	139 550 112	-	139 550 112	139 548 480	100%	2017.05.01	2021.09.30
Császártöltés	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00032	CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Csapadékcatorna kiépítése Császártöltés központi részén	22 998 000	-	22 998 000	22 993 046	100%	2017.06.01	2020.02.15
Páhi	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00033	PÁHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Páhi Község déli rész csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése	25 400 000	-	25 400 000	25 396 782	100%	2017.06.01	2019.10.30
Soltszentimre	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00034	SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Soltszentimre Község csapadékvíz rendezése	14 700 000	-	14 700 000	14 699 999	100%	2017.06.01	2019.04.30
Uszód	TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00001	USZÓD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	"Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése Uszódon"	60 944 698	-	60 944 698	60 944 698	100%	2018.03.20	2020.11.29
Bácsbokod	TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00002	BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Belvízelvezetés Bácsbokodon II. ütem	78 000 000	-	78 000 000	77 999 999	100%	2018.08.01	2021.08.31
Kalocsa	TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00003	KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	"Kalocsa Város csapadékvíz - elvezető hálózatának fejlesztése"	200 000 000	-	200 000 000	200 000 000	100%	2018.03.20	2021.03.31
Bátya	TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00004	Bátya Község Önkormányzata	Ady Endre utca és Bajai út csapadékvíz elvezetése Bátya településen	48 000 000	-	48 000 000	45 338 758	94%	2018.03.20	2019.12.15
Kiskőrös	TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00005	KISKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	„Záportároló kialakítása és csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója Kiskőrösön”	420 000 000	-	420 000 000	413 036 906	98%	2018.03.20	2021.03.10
Baja	TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00007	BAJA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Baja - Kiscsávoly városrészben a vízkárveszélyeztetettség csökkentése érdekében	329 025 373	-	329 025 373	328 999 973	100%	2018.04.01	2020.12.29
Jánoshalma	TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010	JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	"Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem"	119 014 254	-	119 014 254	119 014 254	100%	2018.03.20	2021.01.13
Kunadacs	TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00012	KUNADACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Kunadacson	46 000 000	-	46 000 000	46 000 000	100%	2018.03.01	2020.12.31
Sükösd	TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00014	SÜKÖSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Sükösdön	50 000 000	-	50 000 000	50 000 000	100%	2018.03.20	2020.01.31

Fő megvalósítási helyszín város	TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZÁMA	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG TÁMOGATÁS + ÁFA (TOP finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG (Egyéb hazai finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZÁS (TÁMOGATÁS + ÁFA + FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG)	ELSZÁMOLÁS Elszámolt bizonylat	Pénzügyi előrehaladás	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt befejezés határideje
Gara	TOP-2.1.3-16- BK1-2017-00016	GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Gara csapadékvíz elvezetés	50 000 000	-	50 000 000	49 944 033	100%	2018.01.01	2021.03.22
Orgovány	TOP-2.1.3-16- BK1-2017-00017	ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Orgovány Nagyközség Csapadékvíz-elvezető Rendszerének Fejlesztése	105 994 002	-	105 994 002	105 994 001	100%	2018.03.20	2019.12.23
Szalkszentmárton	TOP-2.1.3-16- BK1-2020-00018	SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Belterületi csapadékvíz elvezetése Szalkszentmártonon	80 000 000	-	80 000 000	79 996 385	100%	2020.06.01	2021.11.30
Csátalja	TOP-2.1.3-16- BK1-2020-00019	CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Csapadékvíz-kezelő rendszer felújítása Csátalján	50 000 000	-	50 000 000	49 870 541	100%	2020.07.01	2021.11.30
Bátmonostor	TOP-2.1.3-16- BK1-2020-00020	BÁTMONOSTOR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Vízvezető-hálózat fejlesztése Bátmonostoron	51 639 190	-	51 639 190	51 639 188	100%	2020.09.01	2022.05.18
Dunavecse	TOP-2.1.3-16- BK1-2020-00021	DUNAVECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Csapadékvíz elvezető rendszer felújítás Dunavecsén	40 000 000	-	40 000 000	39 999 998	100%	2020.09.01	2021.12.31
Kömpöc	TOP-2.1.3-16- BK1-2020-00022	KÖMPÖC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Záportározó kialakítása	60 000 000	-	60 000 000	59 999 946	100%	2020.09.01	2021.11.30
Páhi	TOP-2.1.3-16- BK1-2020-00023	PÁHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Páhi Község Petőfi és Kossuth utcák csapadékvíz elvezetés és visszatartás fejlesztése	35 000 000	-	35 000 000	34 999 999	100%	2020.09.01	2022.11.15
Géderlak	TOP-2.1.3-16- BK1-2020-00024	GÉDERLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Géderlak Község csapadékvíz elvezetése II. ütem	35 000 000	-	35 000 000	34 999 231	100%	2020.09.01	2023.11.16
Tiszaug	TOP-2.1.3-16- BK1-2020-00025	Tiszaug Község Önkormányzata	Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója	40 000 000	-	40 000 000	39 783 521	99%	2020.07.01	2022.05.31
Kisszállás	TOP-2.1.3-16- BK1-2020-00026	KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Belvízelvezetés Kisszálláson	97 798 864	-	97 798 864	97 602 949	100%	2020.09.01	2022.05.31
Lakitelek	TOP-2.1.3-16- BK1-2020-00027	Lakitelek Önkormányzata	Lakitelek csapadékvíz elvezetése szikkasztó árkokkal I. ütem	40 000 000	-	40 000 000	39 977 790	100%	2020.09.01	2021.12.17
Gátér	TOP-2.1.3-16- BK1-2020-00028	GÁTÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Gátér község csapadékvíz-elvezetés és visszatartás fejlesztése II. ütem	40 068 249	-	40 068 249	40 068 249	100%	2020.11.01	2021.11.15
Felsőszentiván	TOP-2.1.3-16- BK1-2020-00029	FELSŐSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Belvízproblémák megoldása Felsőszentivánon I. ütem	30 000 000	-	30 000 000	30 000 000	100%	2020.09.01	2022.06.20
Érsekcsanád	TOP-2.1.3-16- BK1-2020-00031	ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Érsekcsanád belterületi csapadékvíz elvezetés II. ütem	50 000 000	-	50 000 000	49 997 540	100%	2020.09.01	2022.09.15
Bátya	TOP-2.1.3-16- BK1-2020-00032	BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A „Dobosi utcák” csapadékvíz elvezetésének első üteme Bátyán	70 000 000	-	70 000 000	69 997 950	100%	2020.09.01	2022.02.28
Fülöpháza	TOP-2.1.3-16- BK1-2020-00033	FÜLÖPHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fülöpháza környezetvédelmi infrastruktúra – fejlesztése	26 000 001	-	26 000 001	26 000 001	100%	2020.11.01	2023.04.30
Tass	TOP-2.1.3-16- BK1-2020-00034	TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tass környezetvédelmi infrastruktúra –fejlesztése	40 000 000	-	40 000 000	39 401 007	99%	2020.11.01	2022.05.02
Ballószög	TOP-2.1.3-16- BK1-2020-00036	BALLÓSZÖG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Belvízvédekezés és csapadékvíz elvezetés Ballószög központjában	78 000 000	-	78 000 000	77 997 456	100%	2020.07.01	2023.03.31
Dunavecse	TOP-2.1.3-16- BK1-2021-00037	DUNAVECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Dunavecsei csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése	247 013 970	-	247 013 970	247 013 970	100%	2021.08.01	2023.04.30
Bácsbokod	TOP-2.1.3-16- BK1-2021-00038	BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Belvízelvezetés Bácsbokodon III. ütem	280 000 000	-	280 000 000	279 715 614	100%	2021.09.01	2023.11.30
Soltvadkert	TOP-2.1.3-16- BK1-2021-00039	SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Települési csapadékvíz-elvezetőrendszer fejlesztése - II. Ütem	134 313 006	-	134 313 006	134 313 006	100%	2021.09.01	2023.10.30
Kaskantyú	TOP-2.1.3-16- BK1-2021-00040	KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún	180 000 000	-	180 000 000	179 980 505	100%	2021.07.01	2023.02.28

Fő megvalósítási helyszín város	TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZÁMA	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG TÁMOGATÁS + ÁFA (TOP finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG (Egyéb hazai finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZÁS (TÁMOGATÁS + ÁFA + FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG)	ELSZÁMOLÁS Elszámolt bizonylat	Pénzügyi előrehaladás	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt befejezés határideje
Tataháza	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00041	TATAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Csapadékvíz elvezetés Tataházán	160 000 000	-	160 000 000	156 344 974	98%	2021.07.01	2023.08.29
Öregcsertő	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00042	ÖREGCSERTŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Csapadékvíz elvezetése Öregcsertőn, Vén J. utcában	60 000 000	-	60 000 000	59 740 358	100%	2021.09.01	2023.02.28
Jászszentlászló	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00043	JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Csapadék és vízviszatartó rendszer rekonstrukció VI. ütem	70 000 000	-	70 000 000	69 983 295	100%	2021.05.31	2023.02.28
Vaskút	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00044	VASKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Vaskút belterületi vízrendezés II. ütem	210 000 000	-	210 000 000	201 903 702	96%	2021.09.01	2023.05.31
Lakitelek	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00045	LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA	Lakitelek csapadékvíz elvezetése szikkasztó árkokkal II. ütem	230 000 000	-	230 000 000	219 535 108	95%	2021.09.01	2023.12.20
Szeremle	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00046	SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szeremle Település belvízproblémáinak megoldása I.ütem	130 000 000	-	130 000 000	128 120 871	99%	2021.03.01	2023.10.31
Zsana	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00047	ZSANA ÖNKORMÁNYZATA	Zsana község csapadékvíz gazdálkodásának fejlesztése	303 491 595	-	303 491 595	303 490 477	100%	2021.09.01	2023.10.31
Kunszentmiklós	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00048	KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Belterületi csapadékvíz-kezelő rendszer fejlesztése Kunszentmiklóson	266 199 745	-	266 199 745	266 193 900	100%	2021.09.01	2023.12.15
Dunapataj	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00049	DUNAPATAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Dunapatajon az Ady, József A. és Zrínyi utca által lehatárolt településrész csapadékvíz rendszerének fejlesztése	190 000 000	-	190 000 000	189 985 407	100%	2021.05.03	2023.02.28
Csátalja	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00050	CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Csapadékvíz-kezelő rendszer felújítása Csátalján II. ütem	100 000 000	-	100 000 000	99 456 548	99%	2021.09.01	2023.02.28
Bátya	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00051	BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Bátya község területén	130 000 000	-	130 000 000	129 895 975	100%	2021.09.01	2023.07.15
Gara	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00052	GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Települési csapadékvíz hálózat fejlesztése - II. Ütem	220 000 000	-	220 000 000	210 237 198	96%	2021.09.01	2023.11.30
Ordas	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00053	ORDAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Csapadékvíz elvezetés Ordason	60 000 000	-	60 000 000	59 998 359	100%	2021.09.01	2023.03.31
Kiskunmajsa	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00054	KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS ÉS VISSZATARTÁS FEJLESZTÉS „B” Ütem	200 000 000	-	200 000 000	199 998 638	100%	2021.09.01	2023.10.31
Kecel	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00055	KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kecel város belterületi csapadékvíz elvezetése II-III. ütem”	280 000 000	-	280 000 000	225 081 896	80%	2021.09.01	2023.12.12
Géderlak	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00056	GÉDERLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Géderlak csapadékvíz elvezetés I. ütem	95 000 000	-	95 000 000	94 997 806	100%	2021.09.01	2023.01.30
Izsák	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00057	IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Izsák város csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése	350 000 000	-	350 000 000	349 996 335	100%	2021.09.01	2023.10.31
Kelebia	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00058	KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kelebia belterületi védelmét szolgáló csapadécsatorna hálózat és Hanáki záportározó fejlesztése I. fejlesztési ütem	170 000 000	-	170 000 000	166 794 315	98%	2021.09.01	2023.10.15
Szalkszentmárton	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00059	SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szalkszentmárton község belterületi vízrendezés	250 000 000	-	250 000 000	226 139 682	90%	2021.09.01	2023.11.30
Kunbaja	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00060	KUNBAJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Belterületi csapadékvíz-kezelő rendszer fejlesztése Kunbaján	161 284 916	-	161 284 916	156 737 971	97%	2021.09.01	2023.07.24
Dunatetétlen	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00061	DUNATETÉTLÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dunatetétlen község területén	112 854 213	-	112 854 213	106 771 565	95%	2021.06.01	2023.05.26

Fő megvalósítási helyszín város	TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZÁMA	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG TÁMOGATÁS + ÁFA (TOP finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG (Egyéb hazai finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZÁS (TÁMOGATÁS + ÁFA + FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG)	ELSZÁMOLÁS Elszámolt bizonylat	Pénzügyi előrehaladás	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt befejezés határideje
Fülöpszállás	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00062	FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Csapadékvíz elvezetése Fülöpszálláson 2021.	149 915 570	-	149 915 570	130 462 443	87%	2021.09.01	2023.08.21
Tiszakécske	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00063	TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Tiszakécskén 2021	260 000 000	-	260 000 000	259 994 586	100%	2021.09.01	2023.07.30
Kunbaracs	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00064	KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kunbaracs község belterület védelmét szolgáló vízelvezetőhálózat fejlesztése, rekonstrukciója	72 847 229	-	72 847 229	70 540 053	97%	2021.06.01	2023.08.15
Akasztó	TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00001	AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fenntartható közlekedésfejlesztés Akasztón	137 988 000	-	137 988 000	137 987 806	100%	2017.05.01	2020.09.14
Kaskantyú	TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fenntartható közlekedésfejlesztés Kaskantyún	70 944 500	-	70 944 500	70 941 673	100%	2017.10.01	2022.10.31
Soltvadkert	TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00003	SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Belterületi kerékpárút fejlesztés Soltvadkerten	158 092 738	-	158 092 738	157 595 450	100%	2017.05.01	2021.07.31
Foktő	TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00004	FOKTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kerékpárút építése Foktő és Kalocsa között	80 000 000	-	80 000 000	80 000 000	100%	2017.07.01	2018.12.31
Petőfiszállás	TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00005	PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fenntartható közlekedésfejlesztés Petőfiszálláson	50 000 000	-	50 000 000	50 000 000	100%	2016.04.01	2018.09.30
Jakabszállás	TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00006	JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kerékpárforgalmi fejlesztések Jakabszálláson a munkahelyek biztonságos megközelítéséért	241 479 000	-	241 479 000	241 479 000	100%	2017.05.01	2021.07.31
Lakitelek	TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00007	LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA	Kerékpárút építés Kerekdomb és Lakitelek között	275 976 000	-	275 976 000	275 973 824	100%	2018.01.01	2022.10.31
Kecel	TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00008	KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kerékpárút építés Kecel és Imrehegy között a biztonságos közlekedés érdekében	344 970 000	-	344 970 000	344 903 444	100%	2017.05.01	2021.11.30
Baja	TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00009	BAJA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Dózsa György úti és a Keleti körúti kerékpárút építése	500 000 000	-	500 000 000	492 821 293	99%	2017.06.01	2022.03.31
Császártöltés	TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00010	CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kerékpárforgalmi fejlesztések Császártöltésen a lakosság védelmében	160 900 000	-	160 900 000	160 899 994	100%	2017.07.01	2020.12.31
Orgovány	TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00011	ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Orgovány Nagyközség közlekedésbiztonsági fejlesztése	123 989 480	-	123 989 480	123 989 479	100%	2017.10.01	2019.10.31
Tiszakécske	TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00001	TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fenntartható települési kerékpáros közlekedésfejlesztés Tiszakécskén	116 500 000	-	116 500 000	116 500 000	100%	2018.03.07	2021.03.05
Szabadszállás	TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00002	SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Szabadszálláson	149 050 000	-	149 050 000	149 049 999	100%	2018.02.01	2020.12.29
Uszód	TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00003	USZÓD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Komplex fenntartható közlekedésfejlesztés Uszódon	56 868 130	-	56 868 130	56 805 630	100%	2019.01.01	2021.03.16
Bácsbokod	TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00004	BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Hivatásforgalmi kerékpárút építés Bácsbokod és Bácsborsód között	172 431 140	-	172 431 140	172 426 578	100%	2018.01.01	2019.09.30
Fajsz	TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00005	FAJSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Közösségi közlekedés fejlesztése Fajszon	50 000 000	-	50 000 000	50 000 000	100%	2018.01.01	2021.04.30
Pálmonostora	TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00006	PÁLMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Közüti közösségi közlekedés fejlesztése Pálmonostorán és Bugacpusztaházán	70 100 000	-	70 100 000	70 100 000	100%	2019.01.01	2021.09.30
Madaras	TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00007	MADARAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Közüti közösségi közlekedés fejlesztése Madarason	74 094 299	-	74 094 299	74 087 807	100%	2018.01.01	2021.10.31
Mélykút	TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00008	MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Buszmegálló áthelyezése Mélykút központjában	68 581 166	-	68 581 166	68 567 165	100%	2018.01.01	2021.09.30
Nyárlőrinc	TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00009	NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyárlőrincen	37 000 000	-	37 000 000	37 000 000	100%	2018.01.01	2019.09.06

Fő megvalósítási helyszín város	TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZÁMA	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG TÁMOGATÁS + ÁFA (TOP finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG (Egyéb hazai finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZÁS (TÁMOGATÁS + ÁFA + FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG)	ELSZÁMOLÁS Elszámolt bizonylat	Pénzügyi előrehaladás	Projekt megvalósítás kezdet	Projekt befejezés határideje
Ballószög	TOP-3.1.1-16- BK1-2017-00010	BALLÓSZÖG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Hivatásforgalmi fejlesztések Ballószögön	141 437 700	-	141 437 700	141 437 700	100%	2018.01.01	2021.06.30
Kunszállás	TOP-3.1.1-16- BK1-2017-00011	KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kossuth utca rehabilitációja Kunszálláson	60 000 000	-	60 000 000	57 958 428	97%	2019.01.01	2021.10.31
Vaskút	TOP-3.1.1-16- BK1-2017-00012	VASKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Hivatásforgalmi kerékpárút építés Vaskút és Gara között	637 929 596	-	637 929 596	637 675 127	100%	2018.04.17	2023.02.28
Kiskunhalas	TOP-3.1.1-16- BK1-2017-00013	KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések Kiskunhalason	644 950 000	-	644 950 000	644 949 998	100%	2018.03.08	2023.07.31
Csolyospálos	TOP-3.1.1-16- BK1-2017-00014	CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Csolyospáloson	134 500 000	-	134 500 000	134 500 000	100%	2019.01.01	2021.06.30
Kunfehértó	TOP-3.1.1-16- BK1-2017-00015	KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Belterületi kerékpárút építés Kunfehértón	143 000 000	-	143 000 000	142 946 175	100%	2018.01.01	2019.10.31
Géderlak	TOP-3.1.1-16- BK1-2017-00016	GÉDERLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Géderlakon	60 102 239	-	60 102 239	60 102 239	100%	2019.01.01	2021.10.31
Csátalja	TOP-3.1.1-16- BK1-2017-00017	CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Komplex fenntartható települési közlekedésfejlesztés Csátalján	68 000 000	-	68 000 000	67 911 461	100%	2019.07.01	2021.02.16
Helvécia	TOP-3.1.1-16- BK1-2017-00018	HELVÉCIA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fenntartható közlekedésfejlesztés Helvécian	40 246 500	-	40 246 500	40 169 386	100%	2018.01.01	2020.11.11
Tiszaalpár	TOP-3.1.1-16- BK1-2017-00019	TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Belterületi kerékpárút hálózat fejlesztés Tiszaalpáron	430 000 000	-	430 000 000	429 999 054	100%	2018.01.01	2023.02.28
Tázlár	TOP-3.1.1-16- BK1-2017-00020	TÁZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Hivatásforgalmi kerékpárút építés Tázlár belterülete és Felsőtelep között	100 000 000	-	100 000 000	100 000 000	100%	2018.01.01	2021.07.31
Soltszentimre	TOP-3.1.1-16- BK1-2017-00021	SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fenntartható közlekedés fejlesztése Soltszentimrén és Páhin	74 743 500	-	74 743 500	74 743 500	100%	2019.01.31	2022.11.30
Kelebia	TOP-3.1.1-16- BK1-2017-00022	KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Belterületeket összekötő kerékpárhálózati fejlesztés Kelebián	137 988 000	-	137 988 000	137 988 000	100%	2018.01.01	2021.11.08
Tompa	TOP-3.1.1-16- BK1-2017-00023	KÉLESHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Tompán és Kéleshalmon	28 500 000	-	28 500 000	28 464 288	100%	2019.01.01	2021.02.28
Kiskőrös	TOP-3.1.1-16- BK1-2017-00024	KISKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kerékpárút hálózat fejlesztés Kiskőrös és Tabdi között	430 000 000	-	430 000 000	429 999 536	100%	2019.01.31	2022.07.31
Dunaszentbenedek	TOP-3.1.1-16- BK1-2017-00025	DUNASZENTBENEDEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Dunaszentbenedeken	46 000 000	-	46 000 000	45 393 573	99%	2019.01.01	2021.09.24
Tabdi	TOP-3.1.1-16- BK1-2017-00026	TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Tabdin	42 000 000	-	42 000 000	37 324 892	89%	2019.01.01	2021.11.30
Fülöpháza	TOP-3.1.1-16- BK1-2017-00027	FÜLÖPHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Fülöpházán	50 475 600	-	50 475 600	50 474 063	100%	2018.03.01	2020.10.08
Bátmonostor	TOP-3.1.1-16- BK1-2017-00028	BÁTMONOSTOR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Bátmonostoron	28 407 819	-	28 407 819	28 407 818	100%	2018.01.01	2020.07.29
Dunavecse	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00001	DUNAVECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Komplex épületenergetikai fejlesztés Dunavecse város oktatási intézményeiben	333 677 805	-	333 677 805	333 672 803	100%	2017.10.01	2020.08.14
Kunadacs	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00002	KUNADACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola energetikai felújítása	101 746 154	-	101 746 154	101 746 154	100%	2017.07.01	2018.12.31
Tass	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00003	TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tass Községi Információs Központ és Könyvtár energetikai korszerűsítése	39 660 000	-	39 660 000	39 660 000	100%	2017.05.01	2020.07.31

Fő megvalósítási helyszín város	TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZÁMA	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG TÁMOGATÁS + ÁFA (TOP finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG (Egyéb hazai finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZÁS (TÁMOGATÁS + ÁFA + FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG)	ELSZÁMOLÁS Elszámolt bizonylat	Pénzügyi előrehaladás	Projekt megvalósítás kezdet	Projekt befejezés határideje
Dunaegyháza	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00004	DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Energiahatékonyság növelése Dunaegyháza közintézményeinél	99 269 975	-	99 269 975	96 277 558	97%	2017.05.01	2018.12.15
Pirtó	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00005	PIRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Komplex épületenergetikai fejlesztés Pirtón	67 778 828	-	67 778 828	67 745 904	100%	2017.08.23	2020.01.31
Ladánybene	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00006	LADÁNYBENE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	45 467 614	-	45 467 614	45 462 661	100%	2017.07.01	2019.04.26
Kunszentmiklós	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00007	KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Kunszentmiklósi épületek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	47 625 000	-	47 625 000	47 296 734	99%	2017.06.01	2020.08.31
Móricgát	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00008	MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Móricgáti kiállító terem energetikai felújítása	59 479 144	-	59 479 144	59 209 584	100%	2017.05.01	2018.12.15
Tiszaújváros	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00009	TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény Gimnázium és Felsőtagozat épületének energetikai korszerűsítése	295 979 773	-	295 979 773	295 979 773	100%	2018.01.15	2020.10.30
Baja	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00010	BAJA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A bajai Szentistváni Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése	141 414 969	-	141 414 969	138 902 655	98%	2017.06.01	2018.12.31
Baja	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00011	BAJA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A bajai Sugovica Sportiskolai Általános Iskola és a Petőfi Óvoda épületeinek energetikai korszerűsítés	298 136 560	-	298 136 560	285 171 378	96%	2017.06.01	2018.12.31
Izsák	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00012	IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Izsáki Városháza energetikai korszerűsítése	67 700 920	-	67 700 920	67 695 967	100%	2017.06.01	2019.02.28
Újsolt	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00014	ÚJSOLT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	23 916 885	-	23 916 885	23 912 504	100%	2017.06.01	2018.12.31
Kunpeszér	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00015	KUNPESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	36 430 978	-	36 430 978	36 425 978	100%	2017.11.01	2019.03.31
Hercegszántó	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00016	HERCEGSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	148 141 259	-	148 141 259	148 136 306	100%	2017.06.01	2019.02.06
Balotaszállás	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00017	BALOTASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Intézmények épületenergetikai korszerűsítése Balotaszálláson	149 434 115	117 475	149 551 590	149 429 076	100%	2017.10.05	2019.01.05
Mátételke	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00018	MÁTÉTELKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Mátételkén.	51 302 440	-	51 302 440	51 297 486	100%	2017.06.01	2018.12.15
Csikéria	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00019	CSIKÉRIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Csikérián.	79 030 799	-	79 030 799	79 025 845	100%	2017.06.01	2018.10.31
Harta	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00020	HARTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Hartai önkormányzati intézmények energiahatékonyságának javítása	90 583 424	-	90 583 424	90 533 057	100%	2017.06.15	2018.12.15
Bácsborsód	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00021	BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Energiahatékonyság növelése Bácsborsód intézményeinél.	58 069 376	-	58 069 376	53 803 331	93%	2017.06.01	2020.09.29
Kéleshalom	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00023	KÉLESHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Kéleshalom község iskola-óvoda épületének energetikai korszerűsítése	38 112 998	-	38 112 998	38 106 681	100%	2017.07.01	2018.10.10
Tiszaalpár (Alpár)	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00024	TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Árpád Fejedeleme Általános Iskola energetikai korszerűsítése	140 133 227	-	140 133 227	138 335 200	99%	2017.07.01	2018.12.31
Kömpöc	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00025	KÖMPÖC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kömpöc község önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése	31 945 604	-	31 945 604	31 945 604	100%	2017.06.01	2018.07.31
Drágszél	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00026	DRÁGSZÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Drágszálláson	33 187 304	-	33 187 304	33 182 350	100%	2017.06.01	2018.10.31

Fő megvalósítási helyszín város	TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZÁMA	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG TÁMOGATÁS + ÁFA (TOP finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG (Egyéb hazai finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZÁS (TÁMOGATÁS + ÁFA + FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG)	ELSZÁMOLÁS Elszámolt bizonylat	Pénzügyi előrehaladás	Projekt megvalósítás kezdet	Projekt befejezés határideje
Szentkirály	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00027	SZENTKIRÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szentkirály önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai korszerűsítése	74 948 392	-	74 948 392	74 891 479	100%	2017.06.01	2019.01.15
Ágasegyháza	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00028	ÁGASEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Ágasegyháza önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai korszerűsítése	33 472 015	-	33 472 015	32 324 530	97%	2017.06.01	2018.10.31
Fülöpháza	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00029	FÜLÖPHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fülöpháza község önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai korszerűsítése	60 498 220	-	60 498 220	60 498 217	100%	2018.01.15	2018.12.31
Jászszentlászló	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00030	JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Gyermekélelmelési konyha és étkező energetikai felújítása	102 744 131	-	102 744 131	102 574 944	100%	2017.06.15	2018.12.15
Rém	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00031	RÉM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda energetikai korszerűsítése	20 200 530	-	20 200 530	20 200 530	100%	2017.06.01	2018.09.30
Nemesnádudvar	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00032	NEMESNÁDUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Energiahatékonyság növelése Nemesnádudvar közintézményeiben	97 485 041	-	97 485 041	97 480 541	100%	2017.06.01	2018.11.30
Bátya	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00033	BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Energiahatékonyság növelése Bátya község közintézményeiben	101 698 878	-	101 698 878	101 289 355	100%	2017.06.01	2018.12.15
Uszód	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00034	USZÓD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Idősek napközi otthonának energetikai korszerűsítése	28 145 692	-	28 145 692	28 145 691	100%	2017.07.01	2018.07.31
Sükösd	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00035	SÜKÖSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Sükösd Általános Iskola sportcsarnokának energetikai korszerűsítése	114 612 760	-	114 612 760	114 612 760	100%	2017.03.13	2019.01.15
Kunbaja	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00036	KUNBAJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kunbajai Aranyfűrt Óvoda Egységes Óvoda és Bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése	58 111 591	-	58 111 591	58 106 638	100%	2017.07.03	2020.11.29
Csengőd	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00037	CSENGÖD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengődön	106 671 086	-	106 671 086	106 671 085	100%	2017.07.01	2018.11.30
Tataháza	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00038	TATAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Tataházán	59 944 836	-	59 944 836	59 812 384	100%	2017.06.01	2018.12.31
Dunapataj	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00039	DUNAPATAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	92 521 746	-	92 521 746	92 398 663	100%	2017.05.01	2018.12.15
Tiszaújváros	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00040	TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény Alsótagozat épületének energetikai korszerűsítése	189 200 000	-	189 200 000	189 198 109	100%	2017.07.01	2020.10.30
Baja	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00041	BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Energiahatékonyság növelése Baja Nemzetiségi Központ épületén	68 107 480	-	68 107 480	68 066 884	100%	2018.12.01	2020.10.31
Orgovány	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00042	ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Orgoványi Általános Iskola Energetikai Korszerűsítése	129 863 710	-	129 863 710	129 698 042	100%	2017.06.30	2017.12.15
Kecskemét	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00044	BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	SECAP kidolgozása Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részére	40 000 000	-	40 000 000	39 998 243	100%	2017.10.01	2020.06.30
Kiskőrös	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00045	KISKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kiskőrös Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztési projektje	139 965 836	-	139 965 836	139 957 831	100%	2017.07.01	2021.10.31
Borota	TOP-3.2.1-15- BK1-2016-00046	BOROTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése	39 293 969	-	39 293 969	39 261 178	100%	2017.07.01	2018.10.31
Helvécia	TOP-3.2.1-16- BK1-2017-00001	HELVÉCIA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Energetikai hatékonyság növelése Helvécian	50 193 111	-	50 193 111	50 193 111	100%	2018.07.01	2021.09.24
Jászszentlászló	TOP-3.2.1-16- BK1-2017-00003	JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Komplex energetikai felújítás a Jászszentlászlói iskola épületén	80 846 755	-	80 846 755	80 841 018	100%	2018.03.01	2020.11.15

Fő megvalósítási helyszín város	TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZÁMA	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG TÁMOGATÁS + ÁFA (TOP finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG (Egyéb hazai finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZÁS (TÁMOGATÁS + ÁFA + FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG)	ELSZÁMOLÁS Elszámolt bizonylat	Pénzügyi előrehaladás	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt befejezés határideje
Tiszakécske	TOP-3.2.1-16- BK1-2017-00005	TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény épületének energetikai korszerűsítése	21 600 000	-	21 600 000	20 905 791	97%	2018.01.01	2021.06.30
Tiszakécske	TOP-3.2.1-16- BK1-2017-00007	TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése	61 105 000	-	61 105 000	61 105 000	100%	2018.01.01	2022.09.30
Tiszakécske	TOP-3.2.1-16- BK1-2017-00008	TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szociális és gyámügyi hivatal épületének energetikai korszerűsítése	20 251 000	-	20 251 000	20 251 000	100%	2018.01.01	2022.09.30
Tiszakécske	TOP-3.2.1-16- BK1-2017-00009	TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Templom Téri Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	37 328 000	-	37 328 000	37 328 000	100%	2020.08.17	2022.09.30
Tiszakécske	TOP-3.2.1-16- BK1-2017-00010	TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kossuth Lajos utcai Bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése	47 506 000	-	47 506 000	47 506 000	100%	2018.01.01	2022.12.03
Tiszakécske	TOP-3.2.1-16- BK1-2017-00011	TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Arany János Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	40 226 000	-	40 226 000	40 226 000	100%	2018.01.01	2022.09.30
Pirtó	TOP-3.2.1-16- BK1-2017-00013	PIRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	54 737 513	-	54 737 513	54 737 513	100%	2018.07.01	2021.10.25
Kunszállás	TOP-3.2.1-16- BK1-2017-00014	KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	44 609 295	-	44 609 295	44 609 295	100%	2018.07.01	2020.11.29
Kunfehértó	TOP-3.2.1-16- BK1-2017-00015	KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Intézmények energetikai korszerűsítése	99 842 541	-	99 842 541	99 827 933	100%	2017.08.31	2020.01.31
Kecel	TOP-3.2.1-16- BK1-2017-00016	KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kecel Város Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése	181 345 034	-	181 345 034	181 345 034	100%	2018.01.17	2020.12.29
Imrehegy	TOP-3.2.1-16- BK1-2017-00018	IMREHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági fejlesztése	87 088 376	-	87 088 376	87 088 376	100%	2018.06.06	2020.01.31
Csátalja	TOP-3.2.1-16- BK1-2017-00019	CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Óvoda energetikai fejlesztése Csátalján	40 682 056	-	40 682 056	40 682 056	100%	2018.04.01	2020.01.31
Tiszaug	TOP-3.2.1-16- BK1-2017-00020	TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szociális intézmény energetikai korszerűsítése Tiszaugon	49 425 527	-	49 425 527	49 425 527	100%	2018.10.09	2021.10.06
Jakabszállás	TOP-3.2.1-16- BK1-2017-00021	JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	97 771 592	-	97 771 592	97 771 592	100%	2018.07.01	2022.04.30
Hajós	TOP-3.2.1-16- BK1-2017-00022	HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése	42 328 276	-	42 328 276	42 326 891	100%	2018.07.01	2020.11.29
Ágasegyháza	TOP-3.2.1-16- BK1-2017-00023	ÁGASEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Gondozási Központ energetikai korszerűsítése	41 990 419	-	41 990 419	41 303 612	98%	2018.07.01	2020.02.29
Gátér	TOP-3.2.1-16- BK1-2017-00024	GÁTÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése	38 548 434	-	38 548 434	38 541 766	100%	2018.07.01	2020.11.29
Borota	TOP-3.2.1-16- BK1-2017-00025	BOROTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Borota Község Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése	19 049 511	-	19 049 511	19 049 511	100%	2018.07.01	2020.11.29
Bugacpusztaháza	TOP-3.2.1-16- BK1-2017-00026	BUGACPUSTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Bugacpusztaháza Község Önkormányzata épületeinek korszerűsítése	17 638 402	-	17 638 402	17 630 035	100%	2018.07.01	2020.12.15
Izsák	TOP-3.2.1-16- BK1-2017-00027	IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Egészségügyi centrum energetikai korszerűsítése	106 859 760	-	106 859 760	106 859 758	100%	2018.05.22	2021.08.18
Balotaszállás	TOP-3.2.1-16- BK1-2017-00028	BALOTASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Balotaszállás Községi Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése	33 488 174	-	33 488 174	33 487 919	100%	2018.07.01	2020.01.31
Kunbaracs	TOP-3.2.1-16- BK1-2017-00029	KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése	34 092 217	-	34 092 217	34 092 217	100%	2018.07.01	2021.05.31
Ordas	TOP-3.2.1-16- BK1-2017-00030	ORDAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Ordas Község önkormányzati épületének energetikai felújítása	32 648 083	-	32 648 083	32 648 082	100%	2018.07.01	2020.06.29

Fő megvalósítási helyszín város	TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZÁMA	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG TÁMOGATÁS + ÁFA (TOP finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG (Egyéb hazai finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZÁS (TÁMOGATÁS + ÁFA + FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG)	ELSZÁMOLÁS Elszámolt bizonylat	Pénzügyi előrehaladás	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt befejezés határideje
Bácsbokod	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00031	BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bácsbokodon	91 780 646	-	91 780 646	91 780 646	100%	2018.07.01	2020.06.30
Apostag	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00032	APOSTAG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Apostag Község Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	113 113 341	-	113 113 341	112 702 559	100%	2018.11.30	2021.01.29
Kunpeszér	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00033	KUNPESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kunpeszér Község Önkormányzat épületének energetikai felújítása	58 411 064	-	58 411 064	58 411 064	100%	2018.07.01	2021.06.30
Pálmonostora	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00034	PÁLMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	109 348 304	-	109 348 304	109 348 302	100%	2018.05.01	2020.10.09
Császártöltés	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00035	CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Császártöltés önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai korszerűsítése	117 085 809	-	117 085 809	117 075 824	100%	2018.07.01	2020.02.15
Bácsszentgyörgy	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00036	BÁCSSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése	50 301 185	-	50 301 185	50 296 497	100%	2019.04.12	2020.10.31
Érsekhalma	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00037	NÉMET ÖNKORMÁNYZAT NEMESNÁDUDVAR	Általános Iskola energetikai fejlesztése Érsekhalmán	50 391 529	7 243 390	57 634 919	57 599 349	100%	2019.07.17	2021.11.04
Fajsz	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00038	FAJSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Fajszon	57 689 379	-	57 689 379	57 689 378	100%	2018.06.01	2021.02.13
Nagybaracska	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00039	NAGYBARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Energiahatékonyság növelése Nagybaracska Község közintézményeiben	229 167 668	-	229 167 668	228 517 665	100%	2018.05.01	2021.06.30
Bátmonostor	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00040	BÁTMONOSTOR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Bátmonostor Községi Önkormányzat épületeinek energetikai felújítása	142 905 407	-	142 905 407	142 905 406	100%	2018.07.01	2021.07.15
Kaskantyú	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00041	KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	76 551 722	-	76 551 722	76 551 721	100%	2018.07.01	2021.06.18
Öregcsertő	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00042	ÖREGCSERTŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Energiahatékonyság növelése Öregcsertő Község közintézményeiben	27 685 220	-	27 685 220	27 685 220	100%	2018.05.01	2020.08.29
Kömpöc	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00043	KÖMPÖC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Általános Iskola alsó tagozat épületének energetikai korszerűsítése	36 996 162	-	36 996 162	36 978 680	100%	2018.07.01	2019.12.31
Tázlár	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00044	TÁZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Energiahatékonyságot növelő felújítások	133 945 962	-	133 945 962	133 945 962	100%	2018.04.01	2021.05.13
Harkakötöny	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00045	HARKAKÖTÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Polgármesteri Hivatal és Művelődési Ház energetikai felújítása	76 631 867	-	76 631 867	76 616 871	100%	2018.07.01	2020.12.15
Újtelek	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00046	ÚJTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Energiahatékonyság növelése Újtelek Község Önkormányzatánál	42 163 996	-	42 163 996	42 148 007	100%	2018.07.01	2020.11.29
Kunadacs	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00047	KUNADACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kunadacs Igazgyöngy Óvoda energetikai korszerűsítése	53 474 998	-	53 474 998	53 474 998	100%	2018.01.01	2020.09.30
Ballószög	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00048	BALLÓSZÖG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ballószögön	84 044 452	-	84 044 452	84 044 452	100%	2018.04.05	2020.09.30
Kiskunmajsa	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00049	KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése	162 202 226	-	162 202 226	162 202 090	100%	2018.07.01	2020.10.30
Kiskunmajsa	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050	KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Konecsni György Kulturális Központ és a Kiskunmajsai Napsugár Óvoda épületeinek energetikai korszerűsítése	230 522 716	-	230 522 716	230 519 858	100%	2018.07.01	2020.10.30
Felsőlajos	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051	FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A Felsőlajosi Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	40 500 000	-	40 500 000	40 500 000	100%	2019.02.14	2019.09.30

Fő megvalósítási helyszín város	TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZÁMA	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG TÁMOGATÁS + ÁFA (TOP finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG (Egyéb hazai finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZÁS (TÁMOGATÁS + ÁFA + FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG)	ELSZÁMOLÁS Elszámolt bizonylat	Pénzügyi előrehaladás	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt befejezés határideje
Lajosmizse	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052	LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén	54 000 000	-	54 000 000	54 000 000	100%	2019.01.02	2019.12.31
Szalmás	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00053	SZALMÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szalmás község önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai korszerűsítése	83 202 678	-	83 202 678	83 195 479	100%	2018.07.01	2019.12.31
Solt	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00054	SOLT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Kissolti iskola és óvoda épület energetikai korszerűsítése	148 785 000	-	148 785 000	148 784 999	100%	2018.05.01	2020.09.28
Felsőlajos	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055	FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A Felsőlajosi Faluház energetikai korszerűsítése	35 610 900	-	35 610 900	35 610 900	100%	2019.02.14	2019.09.30
Fülöpjakab	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00056	FÜLÖPJAKAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Energetikai korszerűsítés Fülöpjakabon	27 127 629	-	27 127 629	27 108 519	100%	2018.07.01	2021.06.30
Kiskunhalas	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00057	KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati intézmények energetikai felújítása	422 503 411	-	422 503 411	422 503 411	100%	2018.04.01	2021.03.31
Soltvadkert	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00058	SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Energiahatékonysági korszerűsítés	82 612 273	-	82 612 273	82 612 273	100%	2018.04.01	2019.09.30
Jánoshalma	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059	JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése	50 000 000	-	50 000 000	50 000 000	100%	2018.08.01	2019.12.30
Dusnok	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00061	DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Dusnok Község önkormányzati épületének energetikai felújítása	37 618 750	-	37 618 750	37 618 744	100%	2018.07.01	2020.11.29
Mélykút	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00062	MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szent Tamás Katolikus Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése	130 198 708	-	130 198 708	130 198 708	100%	2018.01.01	2020.09.30
Tompa	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00063	TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Energetikai Fejlesztés Tompa Város Önkormányzatának Intézményeinél	29 021 934	-	29 021 934	29 021 934	100%	2018.07.01	2019.06.30
Madaras	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00064	MADARAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Madaras község önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	196 010 369	-	196 010 369	195 916 834	100%	2018.07.01	2021.04.15
Érsekcsanád	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00065	ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Az Érsekcsanádi Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	27 269 854	-	27 269 854	27 269 854	100%	2018.07.01	2020.01.31
Páhi	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00066	Páhi Község Önkormányzata	Páhi Tündérvilla Óvoda és Konyha energetikai fejlesztése	39 195 000	-	39 195 000	39 194 999	100%	2018.11.10	2021.04.15
Soltszentimre	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00067	SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Soltszentimre Község Önkormányzata tulajdonában lévő épületek energetikai fejlesztése	88 860 000	-	88 860 000	88 860 000	100%	2018.11.07	2021.04.30
Bugac	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00068	BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Bugacon	287 118 299	-	287 118 299	287 029 791	100%	2018.05.01	2022.03.31
Kiskunfélegyháza	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069	KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	200 949 721	-	200 949 721	200 943 121	100%	2018.07.01	2021.04.30
Kiskunfélegyháza	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070	KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	56 526 257	-	56 526 257	56 396 908	100%	2018.07.01	2021.03.31
Foktő	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00071	FOKTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Könyvtárépület energetikai felújítása	18 094 418	-	18 094 418	18 092 414	100%	2018.04.01	2021.05.11
Kiskunhalas	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00072	KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kiskunhalasi Idősek Otthona energetikai felújítása	80 639 627	-	80 639 627	79 919 733	99%	2018.04.01	2021.01.29
Kiskunfélegyháza	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073	KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	143 047 207	-	143 047 207	142 768 310	100%	2018.07.01	2021.05.31

Fő megvalósítási helyszín város	TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZÁMA	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG TÁMOGATÁS + ÁFA (TOP finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG (Egyéb hazai finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZÁS (TÁMOGATÁS + ÁFA + FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG)	ELSZÁMOLÁS Elszámolt bizonylat	Pénzügyi előrehaladás	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt befejezés határideje
Tabdi	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00075	TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Energetikai korszerűsítés Tabdin	15 098 244	-	15 098 244	15 098 229	100%	2018.07.01	2021.05.28
Dunavecse	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00076	DUNAVECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Dunavecse Városában	109 000 000	-	109 000 000	108 882 017	100%	2018.06.07	2021.04.30
Szalkszentmárton	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00077	SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szalkszentmárton önkormányzati tulajdonú óvodák energetikai korszerűsítése	44 901 183	-	44 901 183	44 901 182	100%	2019.04.03	2021.12.31
Kunszentmiklós	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00078	KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kunszentmiklós Város Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése	229 980 000	-	229 980 000	229 980 000	100%	2018.01.01	2023.03.15
Orgovány	TOP-3.2.1-16-BK1-2018-00080	ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Energetikai korszerűsítés Orgoványon	45 777 914	-	45 777 914	45 777 914	100%	2019.05.01	2021.09.30
Dunavecse	TOP-3.2.1-16-BK1-2018-00081	DUNAVECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése Dunavecsén	24 975 249	-	24 975 249	24 968 643	100%	2019.07.01	2021.03.31
Foktő	TOP-3.2.1-16-BK1-2018-00082	FOKTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Épületenergetikai korszerűsítés Foktőn	84 109 664	-	84 109 664	84 108 662	100%	2019.07.01	2021.07.01
Soltszentimre	TOP-3.2.1-16-BK1-2018-00083	SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Soltszentimre általános iskolájának energetikai korszerűsítése	65 820 502	-	65 820 502	65 820 388	100%	2019.04.01	2022.04.15
Miske	TOP-3.2.1-16-BK1-2018-00084	MISKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Sportöltöző felújítása	80 096 487	-	80 096 487	80 096 487	100%	2019.07.01	2020.07.01
Baja	TOP-3.2.1-16-BK1-2021-00092	BAJA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Területi Védőnői szolgálat és házi gyermekorvosi tanácsadó épületének energetikai korszerűsítése	46 110 000	-	46 110 000	46 110 000	100%	2021.04.01	2023.06.30
Csávoly	TOP-3.2.1-16-BK1-2021-00094	CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Energetikai felújítás Csávoly Községi Önkormányzatának épületein	198 535 661	5 261 821	203 797 482	203 797 482	100%	2021.04.01	2023.09.30
Császártöltés	TOP-3.2.1-16-BK1-2021-00096	Császártöltés Község Önkormányzata	Császártöltési Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	119 900 000	-	119 900 000	119 900 000	100%	2021.12.01	2022.12.31
Baja	TOP-3.2.1-16-BK1-2021-00097	BAJA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Bokodi úti köztemető ravatalozó épületének energetikai korszerűsítése Baján	75 830 000	-	75 830 000	67 643 660	89%	2021.05.01	2023.06.30
Szentkirály	TOP-3.2.1-16-BK1-2021-00099	SZENTKIRÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Energetikai felújítás Szentkirály Község Önkormányzatának épületein	145 595 046	-	145 595 046	145 595 044	100%	2021.04.06	2023.06.30
Szalmár	TOP-3.2.1-16-BK1-2021-00100	SZAKMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szent Asztrik Katolikus Általános Iskola energetikai korszerűsítése	107 534 858	-	107 534 858	107 534 858	100%	2021.09.01	2022.09.30
Helvécia	TOP-3.2.1-16-BK1-2021-00101	HELVÉCIA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Energetikai felújítás Helvécia Nagyközség Önkormányzatának épületein	103 255 871	-	103 255 871	103 255 871	100%	2021.12.01	2023.02.15
Érsekhalma	TOP-3.2.1-16-BK1-2021-00103	ÉRSEKHALMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Energetikai felújítás Érsekhalma önkormányzatának épületein	49 935 000	6 008 875	55 943 875	55 943 875	100%	2021.08.01	2023.05.31
Kecskemét	TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001	BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében	70 000 000	-	70 000 000	69 999 937	100%	2021.01.01	2022.09.30
Bácsbokod	TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00001	BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Bácsbokodi orvosi rendelő komplex felújítása	80 000 000	-	80 000 000	80 000 000	100%	2017.05.01	2018.09.30
Gátér	TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00002	GÁTÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Egészségügyi alapszolgáltatás infrastrukturális javítása	18 000 000	-	18 000 000	18 096 134	101%	2016.03.18	2018.03.17
Csátalja	TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00003	CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Orvosi rendelő felújítása Csátalján.	18 060 000	-	18 060 000	18 049 630	100%	2017.05.01	2018.03.31
Csátalja	TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00004	CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fogorvosi rendelő felújítása Csátalján	21 940 000	-	21 940 000	21 934 511	100%	2017.10.01	2018.10.31
Baja	TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00005	BAJA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Baja, Hadik utcai háziorvosi rendelő felújítása	47 000 000	-	47 000 000	46 995 000	100%	2017.06.01	2018.12.31

Fő megvalósítási helyszín város	TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZÁMA	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG TÁMOGATÁS + ÁFA (TOP finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG (Egyéb hazai finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZÁS (TÁMOGATÁS + ÁFA + FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG)	ELSZÁMOLÁS Elszámolt bizonylat	Pénzügyi előrehaladás	Projekt megvalósítás kezdet	Projekt befejezés határideje
Rém	TOP-4.1.1-15- BK1-2016-00006	RÉM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Egészségügyi alapellátás fejlesztése	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	100%	2016.05.02	2018.05.01
Tázlár	TOP-4.1.1-15- BK1-2016-00007	TÁZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Egészség ház felújítása	22 998 000	-	22 998 000	22 993 047	100%	2017.10.04	2019.03.31
Dusnok	TOP-4.1.1-15- BK1-2016-00008	DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, energiahatékonyságuk növelése	55 500 000	-	55 500 000	55 495 047	100%	2017.05.01	2019.06.21
Császártöltés	TOP-4.1.1-15- BK1-2016-00009	CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Orvosi rendelő felújítása	40 000 000	-	40 000 000	39 962 102	100%	2017.07.01	2018.11.02
Hercegszántó	TOP-4.1.1-15- BK1-2016-00010	HERCEGSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Egészségügyi komplexum kialakítása	90 555 554	-	90 555 554	90 549 572	100%	2017.06.01	2019.05.31
Tiszaalpár (Alpár)	TOP-4.1.1-15- BK1-2016-00011	TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Tiszaalpári I. számú felnőtt háziorvosi szolgálat fejlesztése	50 000 000	-	50 000 000	50 000 000	100%	2017.05.01	2020.07.29
Csikéria	TOP-4.1.1-15- BK1-2016-00012	CSIKÉRIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Egészség ház korszerűsítése	30 000 000	-	30 000 000	29 995 047	100%	2017.10.01	2018.12.31
Kunbaja	TOP-4.1.1-15- BK1-2016-00013	KUNBAJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Egészségügyi alapellátás fejlesztése	65 000 000	-	65 000 000	64 990 069	100%	2017.10.01	2019.11.30
Mélykút	TOP-4.1.1-15- BK1-2016-00014	MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Orvosi rendelő felújítása	20 000 000	-	20 000 000	19 996 104	100%	2017.06.02	2018.09.17
Dunaszentbenedek	TOP-4.1.1-15- BK1-2016-00015	DUNASZENTBENEDEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Egészség ház korszerűsítése Dunaszentbenedeken	31 587 481	-	31 587 481	31 579 441	100%	2017.05.01	2019.03.31
Kunszállás	TOP-4.1.1-15- BK1-2016-00016	KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A jelenlegi egészség ház korszerű egészségcentrummá fejlesztése	25 000 000	-	25 000 000	24 992 775	100%	2017.05.01	2018.03.31
Bugac	TOP-4.1.1-15- BK1-2016-00017	BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Összevont egészségügyi szolgáltató központ építése Bugacon.	91 992 000	-	91 992 000	91 992 000	100%	2017.07.01	2020.06.30
Szalkszentmárton	TOP-4.1.1-15- BK1-2016-00018	SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, Szalkszentmárton, Fő utcai háziorvosi rendelő felújítása	80 000 000	-	80 000 000	79 994 578	100%	2017.07.01	2018.12.31
Ballószög	TOP-4.1.1-15- BK1-2016-00019	BALLÓSZÖG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Egészség ház és orvosi rendelő felújítása	62 000 000	-	62 000 000	61 999 989	100%	2017.05.01	2019.02.15
Bácsszőlős	TOP-4.1.1-15- BK1-2016-00021	BÁCSSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Háziorvosi rendelő és egészség ház felújítása, energiahatékonyságának növelése	46 500 000	-	46 500 000	45 956 424	99%	2017.05.01	2019.06.30
Akasztó	TOP-4.1.1-15- BK1-2016-00022	AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Egészség ház felújítása	91 999 000	-	91 999 000	91 994 047	100%	2017.05.01	2020.07.29
Baja	TOP-4.1.1-16- BK1-2017-00001	BAJA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Vasvári utcai rendelő felújítása	42 000 000	-	42 000 000	41 994 552	100%	2018.09.01	2021.02.26
Bácsborsód	TOP-4.1.1-16- BK1-2017-00002	BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Bácsborsód védőnői szolgálatának infrastrukturális fejlesztése	22 809 499	-	22 809 499	22 809 499	100%	2018.05.01	2020.08.29
Öregcsertő	TOP-4.1.1-16- BK1-2017-00003	ÖREGCSERTŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Egészség ház felújítása Öregcsertőn	15 000 000	-	15 000 000	14 995 642	100%	2018.06.01	2019.02.28
Ágasegyháza	TOP-4.1.1-16- BK1-2017-00004	ÁGASEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Egészségközpont létrehozása Ágasegyházán	62 172 378	-	62 172 378	62 172 378	100%	2018.03.31	2020.02.28
Tabdi	TOP-4.1.1-16- BK1-2017-00006	TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Egészségügy fejlesztése Tabdin	13 000 000	-	13 000 000	13 000 000	100%	2018.08.01	2020.11.13
Kunszentmiklós	TOP-4.1.1-16- BK1-2017-00007	KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Egészségügyi Központ felújítása Kunszentmiklóson	89 599 440	-	89 599 440	89 599 440	100%	2018.01.01	2021.02.28
Tiszaug	TOP-4.1.1-16- BK1-2017-00008	TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Egészség ház kialakítása Tiszaugon	35 000 000	-	35 000 000	34 999 986	100%	2018.06.01	2019.04.30

Fő megvalósítási helyszín város	TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZÁMA	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG TÁMOGATÁS + ÁFA (TOP finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG (Egyéb hazai finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZÁS (TÁMOGATÁS + ÁFA + FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG)	ELSZÁMOLÁS Elszámolt bizonylat	Pénzügyi előrehaladás	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt befejezés határideje
Géderlak	TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00010	GÉDERLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Egészségház felújítása Géderlakon	14 000 000	-	14 000 000	13 999 302	100%	2018.06.01	2020.01.31
Fülöpkab	TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00011	FÜLÖPKAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Háziorvosi rendelő felújítása	11 369 023	-	11 369 023	11 369 023	100%	2018.06.01	2020.06.29
Dunaszentbenedek	TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00012	DUNASZENTBENEDEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fogorvosi rendelő kialakítása Dunaszentbenedeken	80 000 000	-	80 000 000	80 000 000	100%	2018.06.30	2019.12.15
Harta	TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00014	HARTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Hartai orvosi rendelő korszerűsítése	70 000 000	-	70 000 000	69 999 999	100%	2018.06.01	2019.07.31
Nemesnádudvar	TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00015	NEMESNÁDUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Egészségház felújítása Nemesnádudvaron	40 000 000	-	40 000 000	40 000 000	100%	2016.11.10	2018.11.09
Izsák	TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00017	IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Egészségház kialakítása Izsákon	91 920 000	-	91 920 000	91 674 566	100%	2018.08.01	2021.10.31
Helvécia	TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00018	HELVÉCIA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Egészségügyi központ kialakítása Helvécián	34 470 000	-	34 470 000	34 470 000	100%	2018.05.16	2021.01.29
Gara	TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00020	GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Egészségügy fejlesztése Garán	50 000 000	-	50 000 000	49 975 630	100%	2017.09.04	2020.06.18
Sükösd	TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00021	Sükösd Nagyközség Önkormányzata	Egészségügyi központ fejlesztése Sükösdon	40 000 000	-	40 000 000	39 999 999	100%	2018.08.01	2020.01.31
Lakitelek	TOP-4.1.1-16-BK1-2020-00024	LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA	Egészségház fejlesztése Lakiteleken	207 840 000	-	207 840 000	207 840 000	100%	2021.02.02	2022.09.30
Jakabszállás	TOP-4.1.1-16-BK1-2020-00025	JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Egészségügyi központ kialakítása Jakabszálláson	120 000 000	-	120 000 000	120 000 000	100%	2021.01.01	2022.04.30
Csávoly	TOP-4.1.1-16-BK1-2020-00026	CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	A csávolyi egészségház felújítása	68 427 429	-	68 427 429	68 427 428	100%	2021.02.01	2022.02.28
Szeremle	TOP-4.1.1-16-BK1-2020-00027	SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szeremlei egészségház infrastrukturális fejlesztése	58 050 000	-	58 050 000	58 050 000	100%	2021.02.01	2022.04.30
Vaskút	TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00001	KOLPING OKTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ SZERVEZET	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése a vaskúti Kolping Alapellátási Központ és Támogató Szolgálatnál	12 275 785	-	12 275 785	12 275 785	100%	2017.07.01	2018.06.30
Szabadszállás	TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00002	SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Szabadszálláson	50 000 000	-	50 000 000	49 840 647	100%	2017.06.01	2019.09.30
Kelebia	TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00003	KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szent Erzsébet Otthonház rekonstrukciója	125 354 148	-	125 354 148	125 349 687	100%	2017.05.01	2019.10.15
Fülöpszállás	TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00004	FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szociális alapellátási központ kialakítása	50 318 912	-	50 318 912	50 318 374	100%	2017.05.01	2021.10.31
Dunaszentbenedek	TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00005	DUNASZENTBENEDEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Étkeзде épületének felújítása kapacitásbővítés, valamint házi gondozói iroda kialakítása érdekében	28 000 000	-	28 000 000	27 994 974	100%	2017.06.01	2019.08.15
Bócsa	TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00008	BÓCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Minőségi szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának kialakítása Bócsa községben	183 984 000	-	183 984 000	182 392 776	99%	2017.06.01	2022.10.31
Bátmonostor	TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00009	BÁTMONOSTOR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Bátmonostori konyha felújítása	80 150 000	-	80 150 000	80 146 142	100%	2017.05.01	2021.11.15
Kecel	TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00011	KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Csendes Ősz Idősek Otthonának bővítése a nappali ellátás, szociális étkeztetés biztosításának céljából	206 982 000	-	206 982 000	206 973 846	100%	2017.07.01	2022.01.31
Bátya	TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00012	BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A nappali ellátás, a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés fejlesztése Bátyán	57 300 000	-	57 300 000	57 300 000	100%	2017.05.01	2020.12.29

Fő megvalósítási helyszín város	TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZÁMA	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG TÁMOGATÁS + ÁFA (TOP finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG (Egyéb hazai finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZÁS (TÁMOGATÁS + ÁFA + FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG)	ELSZÁMOLÁS Elszámolt bizonylat	Pénzügyi előrehaladás	Projekt megvalósítás kezdet	Projekt befejezés határideje
Harta	TOP-4.2.1-15- BK1-2016-00013	HARTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szociális alapszolgáltatási központ kialakítása Hartán	77 832 365	-	77 832 365	77 127 940	99%	2017.05.01	2020.01.30
Tabdi	TOP-4.2.1-15- BK1-2016-00015	TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szociális alapszolgáltatási központ kialakítása Tabdi községben	40 000 000	-	40 000 000	39 994 952	100%	2017.06.01	2019.10.28
Kiskunfélegyháza	TOP-4.2.1-15- BK1-2016-00018	Egészségdokk Közhasznú Alapítvány	Az EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány fenntartásában működő VÁLASZ Szenvedélybeteg- segítő és Drogprevenciók Központ szociális szolgáltatásainak minőségi fejlesztését célzó eszközzvásárlásainak megvalósítása	3 504 007	-	3 504 007	3 483 106	99%	2016.09.15	2017.07.20
Kunszentmiklós	TOP-4.2.1-16- BK1-2017-00001	Magyar Pütkösi Egyház Országos Cigánymisszió	Magyar Pütkösi Egyház Országos Cigánymisszió Segítő Szolgálat Kalocsa és Kunszentmiklósi Telephelyek Infrastruktúra-fejlesztése	5 409 294	-	5 409 294	5 383 273	100%	2018.06.01	2019.02.28
Baja	TOP-4.2.1-16- BK1-2017-00003	BAJAI KISTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Baján	49 839 630	-	49 839 630	49 839 630	100%	2018.07.02	2019.06.30
Kalocsa	TOP-4.2.1-16- BK1-2017-00004	KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kalocsán	202 000 000	-	202 000 000	202 000 000	100%	2018.04.01	2020.06.29
Kisszállás	TOP-4.2.1-16- BK1-2017-00005	KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Konyhafejlesztés Kisszálláson	68 401 247	-	68 401 247	68 401 245	100%	2018.04.01	2020.06.29
Szabadszállás	TOP-4.2.1-16- BK1-2017-00006	SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szociális alapszolgáltatás (étkeztetés) infrastruktúrájának fejlesztése Szabadszálláson	100 000 000	-	100 000 000	99 963 940	100%	2018.04.01	2021.10.31
Csengőd	TOP-4.2.1-16- BK1-2020-00008	CSENGÖD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A szociális étkeztetés, valamint a család és gyermekjóléti szolgálat infrastrukturális fejlesztése Csengődön	302 544 380	-	302 544 380	302 544 379	100%	2020.12.15	2023.11.15
Apostag	TOP-4.2.1-16- BK1-2020-00009	APOSTAG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Apostagi konyha felújítása	102 774 713	-	102 774 713	102 774 711	100%	2021.01.31	2022.06.15
Kiskunhalas	TOP-4.3.1-15- BK1-2016-00002	KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason	499 999 163	-	499 999 163	499 997 424	100%	2017.11.01	2021.09.28
Lajosmizse	TOP-4.3.1-15- BK1-2016-00003	LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása	113 000 000	-	113 000 000	112 993 848	100%	2018.01.01	2019.09.30
Szabadszállás	TOP-4.3.1-15- BK1-2016-00004	SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Leromlott városi területek rehabilitációja Szabadszálláson	385 000 000	-	385 000 000	383 524 264	100%	2018.03.01	2022.01.31
Kunszentmiklós	TOP-4.3.1-15- BK1-2016-00005	KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kunszentmiklós-Tasskertes újjászületik	70 000 000	-	70 000 000	69 999 634	100%	2018.03.01	2021.04.30
Kiskunhalas	TOP-4.3.1-15- BK1-2020-00006	KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason 2	440 177 920	-	440 177 920	440 177 918	100%	2020.11.01	2023.12.29
Jánoshalma	TOP-4.3.1-15- BK1-2020-00008	JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem	250 000 000	-	250 000 000	249 999 995	100%	2021.02.01	2023.03.31
Kiskőrös	TOP-4.3.1-15- BK1-2020-00009	KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Élhetőbb lakókörnyezet kialakítása Kiskőrösön	271 996 002	-	271 996 002	271 995 999	100%	2021.07.01	2023.06.30
Kiskunmajsa	TOP-4.3.1-15- BK1-2020-00010	KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitációja	251 078 811	-	251 078 811	251 078 803	100%	2021.04.29	2023.08.31

Fő megvalósítási helyszín város	TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZÁMA	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG TÁMOGATÁS + ÁFA (TOP finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG (Egyéb hazai finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZÁS (TÁMOGATÁS + ÁFA + FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG)	ELSZÁMOLÁS Elszámolt bizonylat	Pénzügyi előrehaladás	Projekt megvalósítás kezdet	Projekt befejezés határideje
Kalocsa	TOP-4.3.1-15- BK1-2020-00011	KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szociális városrehabilitáció Kalocsán	250 000 000	-	250 000 000	249 996 837	100%	2021.07.01	2022.11.30
Kecskemét	TOP-5.1.1-15- BK1-2016-00001	BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Együttműködés a helyben foglalkoztatásért - Bács- Kiskun megyei foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési együttműködés	1 637 080 050	-	1 637 080 050	1 634 081 845	100%	2016.07.01	2021.06.30
Kecskemét	TOP-5.1.2-16- BK1-2017-00001	KISKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYBEN FOGLALKOZTATÁSÉRT KISKÖRÖS JÁRÁSBAN	279 130 000	-	279 130 000	279 125 497	100%	2018.09.01	2021.11.29
Kecskemét	TOP-5.1.2-16- BK1-2017-00002	Solt Város Önkormányzat	PARTNERSÉGI ALAPÚ FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM A KALOCSAI JÁRÁSBAN	299 370 000	-	299 370 000	298 013 656	100%	2018.09.01	2022.11.02
Tiszakécske	TOP-5.1.2-16- BK1-2017-00003	TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGVALÓSÍTÁSA A TISZAKÉCSKEI ÉS A KECSKEMÉTI JÁRÁSBAN	331 830 000	-	331 830 000	323 337 121	97%	2018.07.01	2021.12.20
Bácsalmás	TOP-5.1.2-16- BK1-2017-00004	BÁCSALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Bácsalmási - Jánoshalmi - Kiskunhalasi járásek foglalkoztatási együttműködése, partnersége	800 000 000	-	800 000 000	794 253 848	99%	2018.03.01	2022.03.31
Baja	TOP-5.1.2-16- BK1-2017-00005	BAJA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Helyi foglalkoztatási együttműködések a Bajai járákban	280 285 005	-	280 285 005	276 989 284	99%	2018.09.01	2021.11.30
Kiskunfélegyháza	TOP-5.1.2-16- BK1-2017-00007	KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum	421 610 000	-	421 610 000	421 558 836	100%	2018.03.01	2021.02.28
Lajosmizse	TOP-5.2.1-15- BK1-2016-00001	LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	60 000 000	-	60 000 000	59 952 679	100%	2017.12.01	2021.03.31
Kiskunfélegyháza	TOP-5.2.1-15- BK1-2016-00002	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	"Új csillag születik" - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán	93 355 478	-	93 355 478	93 344 510	100%	2017.08.01	2022.06.30
Szabadszállás	TOP-5.2.1-15- BK1-2016-00003	SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Komplex programok Szabadszálláson a társadalmi együttműködés erősítéséért	110 060 800	-	110 060 800	107 557 203	98%	2017.05.01	2022.09.05
Kunszentmiklós	TOP-5.2.1-15- BK1-2016-00004	KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tasskertes társadalmi integrációja Kunszentmiklóson	30 000 316	-	30 000 316	29 994 224	100%	2017.07.01	2020.12.31
Kiskunhalas	TOP-5.2.1-15- BK1-2016-00005	KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Együtt egymásért Kiskunhalason	149 999 749	-	149 999 749	147 780 422	99%	2017.07.01	2023.09.29
Kiskunfélegyháza	TOP-5.2.1-15- BK1-2020-00006	KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	"Új csillag születik II." - Komplex társadalmi együttműködést segítő program Kiskunfélegyházán	69 900 000	-	69 900 000	69 892 266	100%	2020.10.01	2023.08.31
Kiskunhalas	TOP-5.2.1-15- BK1-2020-00007	KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Együtt egymásért Kiskunhalason 2	130 100 000	-	130 100 000	130 059 899	100%	2020.05.05	2023.12.31
Kiskunmajsa	TOP-5.2.1-15- BK1-2020-00008	KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Kiskunmajsán	75 000 000	-	75 000 000	72 399 640	97%	2021.01.01	2023.10.31
Kalocsa	TOP-5.2.1-15- BK1-2020-00009	KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	75 000 000	-	75 000 000	75 000 000	100%	2021.01.01	2023.05.31
Jánoshalma	TOP-5.2.1-15- BK1-2020-00010	JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	„Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség”	75 000 000	-	75 000 000	75 000 000	100%	2021.03.01	2023.08.31
Kiskőrös	TOP-5.2.1-15- BK1-2020-00011	Kiskőrös Város Önkormányzata	Társadalmi együttműködést erősítő programok Kiskőrösön	75 000 000	-	75 000 000	75 000 000	100%	2021.01.31	2023.12.31
Szank	TOP-5.3.1-16- BK1-2017-00001	SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	„Múltunk értéke, közösségünk jövője”	43 380 087	-	43 380 087	43 375 743	100%	2018.09.01	2022.05.01

Fő megvalósítási helyszín város	TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZÁMA	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG TÁMOGATÁS + ÁFA (TOP finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG (Egyéb hazai finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZÁS (TÁMOGATÁS + ÁFA + FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG)	ELSZÁMOLÁS Elszámolt bizonylat	Pénzügyi előrehaladás	Projekt megvalósítás kezdet	Projekt befejezés határideje
Ballószög	TOP-5.3.1-16- BK1-2017-00002	BALLÓSZÖG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	„A helyi identitás és a szomszédos települések közötti kapcsolat erősítése”	42 326 087	-	42 326 087	42 320 275	100%	2018.09.01	2022.10.31
Soltvadkert	TOP-5.3.1-16- BK1-2017-00003	Soltvadkert Város Önkormányzata	„A helyi közösségek fejlesztése Soltvadkert térségében”	44 326 087	-	44 326 087	43 897 697	99%	2018.09.01	2022.06.30
Csengőd	TOP-5.3.1-16- BK1-2017-00004	CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	„Helyi közösségek fejlesztése Csengőd, Akasztó, Kaskantyú, Páhi, Soltszentimre és Tabdi településeken”	42 177 090	-	42 177 090	42 112 523	100%	2019.01.04	2023.06.30
Csolyospálos	TOP-5.3.1-16- BK1-2017-00005	CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Közösségfejlesztés Csolyospáloson és Kömpöcön	26 326 087	-	26 326 087	25 163 834	96%	2018.09.01	2022.03.15
Kerekegyháza	TOP-5.3.1-16- BK1-2017-00006	KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A helyi identitás és kohézió erősítése	42 825 000	-	42 825 000	41 266 648	96%	2018.09.01	2023.04.30
Bácsalmás	TOP-5.3.1-16- BK1-2017-00007	BÁCSALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A helyi identitás és kohézió erősítése a Bácsalmási térségben	44 221 087	-	44 221 087	44 215 500	100%	2018.09.01	2022.12.31
Kunszentmiklós	TOP-5.3.1-16- BK1-2017-00008	Kunszentmiklós Város Önkormányzata	„Közösségfejlesztés és a helyi identitás erősítése Kunszentmiklóson”	43 380 078	-	43 380 078	43 276 791	100%	2018.09.01	2023.03.31
Tiszaalpár (Alpár)	TOP-5.3.1-16- BK1-2017-00009	Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat	„Tiszaalpár- Lakitelek- Nyárlőrinc közösségfejlesztése”	44 614 058	-	44 614 058	40 410 369	91%	2018.09.01	2022.09.28
Érsekcsanád	TOP-5.3.1-16- BK1-2017-00010	Érsekcsanád Község Önkormányzata	A helyi identitás és kohézió erősítése Érsekcsanádon és Sükösdön	37 326 087	-	37 326 087	37 323 931	100%	2018.03.01	2022.09.13
Tompa	TOP-5.3.1-16- BK1-2017-00011	TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	„Lokális identitásépítés és helyi közösségfejlesztés”	44 129 478	-	44 129 478	43 701 280	99%	2018.09.01	2022.06.30
Kiskunmajsa	TOP-5.3.1-16- BK1-2017-00012	KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Jövőnk gyümölcsei, a jelen fáin a múltból gyökereznek	39 326 087	-	39 326 087	39 326 087	100%	2018.09.01	2023.03.15
Dávod	TOP-5.3.1-16- BK1-2017-00013	Dávod Önkormányzat	Helyi identitás és kohézió	44 326 087	-	44 326 087	43 791 045	99%	2018.09.01	2022.08.30
Bócsa	TOP-5.3.1-16- BK1-2017-00014	Bócsa Község Önkormányzat	A helyi identitás és a kohézió erősítése a Kolon mentén	48 326 087	1 671 801	49 997 888	48 228 790	96%	2018.09.01	2023.03.31
Hajós	TOP-5.3.1-16- BK1-2017-00015	HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	„Együtt a közösségeinkért ”- Közösségfejlesztés erősítése Hajós-Jánoshalma-Borota-Kéleshalom konzorciumban”	44 380 087	-	44 380 087	44 374 215	100%	2018.09.01	2022.06.15
Solt	TOP-5.3.1-16- BK1-2017-00016	SOLT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	„A helyi identitás erősítése és közösségfejlesztés Solt és Harta településen”	42 326 078	-	42 326 078	39 816 560	94%	2018.09.01	2023.03.31
Bácsbokod	TOP-5.3.1-16- BK1-2017-00017	Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata	„Helyi identitás és kohézió erősítése a Bácsbokodi konzorciumban”	43 326 087	-	43 326 087	42 846 814	99%	2018.11.15	2022.08.31
Jakabszállás	TOP-5.3.1-16- BK1-2017-00018	Jakabszállás Község Önkormányzata	A helyi identitás és kohézió erősítése Jakabszálláson és Fülöpjakabon	31 296 087	-	31 296 087	30 534 983	98%	2018.09.01	2023.06.15
Dusnok	TOP-5.3.1-16- BK1-2017-00019	Dusnok Község Önkormányzata	„Helyi identitás és kohézió erősítése Dusnok térségében”	42 326 087	-	42 326 087	42 234 781	100%	2018.09.01	2023.02.13
Kalocsa	TOP-5.3.1-16- BK1-2017-00020	Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Történelmi múlt és cselekvő jelen	39 184 828	-	39 184 828	36 296 731	93%	2018.09.01	2023.12.30
Lajosmizse	TOP-5.3.1-16- BK1-2017-00021	LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson	40 826 087	-	40 826 087	39 618 901	97%	2018.10.01	2023.04.30

Fő megvalósítási helyszín város	TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZÁMA	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG TÁMOGATÁS + ÁFA (TOP finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG (Egyéb hazai finanszírozás)	ÖSSZEG FINANSZÍROZÁS (TÁMOGATÁS + ÁFA + FINANSZÍROZOTT EGYÉB KÖLTSÉG)	ELSZÁMOLÁS Elszámolt bizonylat	Pénzügyi előrehaladás	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt befejezés határideje
Kecskemét	TOP-5.3.2-17-BK1-2018-00001	BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Az Érték – Élmény – Egészség megjelenítése közösségi programokban	338 219 161	-	338 219 161	338 219 161	100%	2019.01.01	2023.11.30
Kecskemét	TOP-5.3.2-17-BK1-2019-00002	BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Bács-Kiskun boldoggá tesz	344 000 000	-	344 000 000	344 000 000	100%	2020.04.01	2023.11.30
Kecskemét	TOP-5.3.2-17-BK1-2020-00003	BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	ITTHON MARADUNK	415 990 217	-	415 990 217	415 990 217	100%	2021.01.01	2023.12.15
Kecskemét	TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004	BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Petőfi200	686 429 393	-	686 429 393	665 581 490	97%	2022.02.01	2023.11.30

